

Nova Friburgo, 26 de julho de 2023.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório de Serviços de Recuperação de Vias – 02/07/2023 a 16/07/2023**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilhas e relatórios fotográficos referentes ao período de 02/07/2023 a 16/07/2023.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-314/2023-SUP
DSSM-td

					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 02/07/2023 a 16/07/2023				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3485721	16/07/2023	959 - SED-03GSO-RP01	PAISSANDÚ	RUA TRAJANO DE ALMEIDA, 46, 28625120	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,60 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 0,60 X 0,60 DATA: 16/07/2023 POR SANDRO, MARCELO E GILSON.	00:20:00	1,00	0,05
3484237	13/07/2023	1040 - SED-03GSO-RP05	VARGINHA	MANOEL A MOURA VARGINHA, 1221, 28616255	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 0,80 X 0,80	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS:0,90 X 0,80. EM 13/07/23 POR LEANDRO/MAIQUE.	01:05:00	1,80	0,03
3483936	13/07/2023	1040 - SED-03GSO-RP05	PRADO	DOS FERROVIARIOS PRADO, 2830, 28633010	MANUTENÇÃO ÁGUA/ MEDIDAS:3,00 X 1,00	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS:3.30 X 1,20 REPOR 2 MEIO FIO. EM 13/07/23 POR LEANDRO/MAIQUE.	02:15:00	3,96	0,03
3483888	12/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 113, 28634060	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 5,20 X 0,40	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 5,20 X 0,40. DATA: 12.07.2023. POR: ADÃO/LUIZ/THIAGO.	00:50:00	2,08	0,04
3483667	11/07/2023	952 - SED-02GSO-ES02	LAGOINHA	SOUZA CARDOSO LAGOINHA, 414, 28625520	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 X 0,15. DATA: 11.07.2023. POR: DENILSON/THIAGO.	00:30:00	0,15	0,01
3483295	12/07/2023	1040 - SED-03GSO-RP05	RIOGRANDINA	CAP BENTO JOSÉ VELOSO, 28634340	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER CAMADA DE ASFALTO QUE AFUNDOU.	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS:10,00 X 0,10 EM 12/07/23 POR LEANDRO/MAIQUE.	01:15:00	1,00	0,01
3483207	14/07/2023	1040 - SED-03GSO-RP05	PARQUE SÃO CLEMENTE	VISC DE TAUNAY, 610, 28625210	INVESTIMENTO ÁGUA/ MEDIDAS: 6,00 X 0,40	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,00 X 0,60 E 7,00 X 0,40 DATA: 14/07/2023 EQUIPE: LEANDRO - MAIQUE	01:05:00	3,40	0,05
3483160	14/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	JARDIM DO ÉDEM	JARDIM DO ÉDEM, 15, 28605550	INVESTIMENTO ÁGUA/ MEDIDAS: 1,70 X 0,70 E 2,00 X 0,30 RETIRAR 1 CARRINHO DE ENTULHO	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 4,70 X 1,00 DATA: 14/07/2023 EQUIPE: ADÃO - LUIZ - THIAGO	01:55:00	4,70	0,04
3483095	14/07/2023	1040 - SED-03GSO-RP05	ALTO DE OLARIA	PREF JOAQUIM ANTUNES, 81, 28623770	INVESTIMENTO ÁGUA/ MEDIDAS:6,40 X 0,40	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 6,40 X 0,40 DATA: 14/07/2023 EQUIPE: LEANDRO - MAIQUE	01:30:00	2,56	0,03
3483091	16/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	ARCO ÍRIS, 28610330	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 2,00 X 2,00	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 2,00 X 2,00 DATA: 16/07/2023 POR HENRIQUE, MAIQUE E HUMBERTO.	01:30:00	4,00	0,04
3483088	16/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	ARCO ÍRIS, 28610330	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 2,80 X 2,00	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 4,00 X 2,00 DATA: 16/07/2023 POR HENRIQUE, MAIQUE E HUMBERTO.	00:50:00	8,00	0,16
3483061	14/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	CORDOEIRA	PALMERIN TRANIN, 25, 28613670	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 1,10 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1.10 X 0.50 DATA: 14/07/2023 EQUIPE: ADÃO - LUIZ - THIAGO	00:27:00	0,55	0,02
3482470	10/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	ARCO ÍRIS, 31, 28000000	ASFALTO	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 1,60 X 1,40 DATA: 10/07/2023 POR HENRIQUE, JOÃO E WESLEY.	01:00:00	2,24	0,04
3482469	10/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	ARCO ÍRIS, 47, 28000000	REPOR ASFALTO	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 0,80 X 0,50 / 0,90 X 0,30 DATA: 10/07/2023 POR HENRIQUE, JOÃO E WESLEY.	00:51:00	0,67	0,01
3482468	16/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	ARCO ÍRIS, 37, 28000000	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS: 12M X 1M	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 12,00 X 1,00 DATA: 16/07/2023 POR HENRIQUE, MAIQUE E HUMBERTO.	01:20:00	12,00	0,15
3482459	14/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	CORDOEIRA	JOSE DO PATROCINIO, 39, 28613630	MANUTENÇÃO ESGOTO/ MEDIDAS:1,20 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,20 X 0,80 DATA: 14/07/2023 EQUIPE: ADÃO - LUIZ - THIAGO	00:20:00	0,96	0,05
3482370	11/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	VILA GUARANI	DR ZAMENHOF, 28614000	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE SOLTOU	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,30. DATA: 11.07.2023. POR: HENRIQUE/JOÃO/WESLEY.	00:31:00	1,95	0,06
3482313	10/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	LAGOA SECA	MTO JOAQUIM NAEGLÉ LAGOA SECA, 207, 28633520	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,40 X 1,40	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,40 X 1,40. DATA: 10.07.2023. POR: ADÃO/LUIZ/THIAGO.	00:55:00	1,96	0,04
3481626	10/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	DO ARCO ÍRIS, 4, 28605610	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS: 5M X 0,30	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 5,00 X 0,30 DATA: 10/07/2023 POR HENRIQUE, JOÃO E WESLEY.	00:10:00	1,50	0,15
3481609	16/07/2023	959 - SED-03GSO-RP01	RIVO TORTO	MARCOLINA RAMOS PINHEIRO, 164, 28635360	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: /0,60 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 0,60 X 0,60 DATA: 16/07/2023 POR SANDRO, MARCELO E GILSON.	00:12:00	0,36	0,03

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M² por minuto
3481595	10/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	DO ARCO ÍRIS, 218, 28605610	ASFALTO	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 1,80 X 0,30 / 2,40 X 0,50 DATA: 10/07/2023 POR HENRIQUE, JOÃO E WESLEY.	00:50:00	1,74	0,03
3481594	10/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	DO ARCO ÍRIS, 21, 28605610	ASFALTO	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 2,20 X 0,50 / 2,70 X 0,30 DATA: 10/07/2023 POR HENRIQUE, JOÃO E WESLEY.	00:50:00	1,91	0,04
3481593	09/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	DO ARCO ÍRIS, 13, 28605610	ASFALTO	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 3,50 X 0,40 // 1,00 X 0,60 DATA: 09/07/2023 EQUIPE: HENRIQUE - THIAGO - LUIZ	00:30:00	2,00	0,07
3481592	09/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	DO ARCO ÍRIS, 15, 28605610	ASFALTO	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 3,00 X 0,40 DATA: 09/07/2023 EQUIPE: HENRIQUE - THIAGO - LUIZ	01:04:00	1,20	0,02
3481591	09/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	DO ARCO ÍRIS, 14, 28605610	ASFALTO	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 2,50 X 0,30 DATA: 09/07/2023 EQUIPE: HENRIQUE - THIAGO - LUIZ	01:20:00	0,75	0,01
3480964	09/07/2023	1040 - SED-03GSO-RP05	VILA GUARANI	DR ZAMENHOF, 32, 28614000	MEDIDAS: 1,2 X 0,70. RETIRAR 1 CARRINHO DE ENTULHO.	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO - RETIRADOS 1 CARRINHO DE ENTULHO MEDIDAS: 1,50 X 1,40 DATA: 09/07/2023 EQUIPE: LEANDRO - MAIQUE - HUMBERTO	00:55:00	2,10	0,04
3480923	07/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	CENTRO	RUA PROF LOURDES RANGEL VENTURA, 66, 28625655	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,80 X 0,70 E 3,60 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 2,80 X 0,70 E 3,60 X 0,80 DATA: 07/07/2023 EQUIPE: LUIZ - THIAGO	01:05:00	4,84	0,07
3480493	07/07/2023	961 - SED-03GSO-RP03	SANTA BERNADETE	ZULMIRA BERÇOT DA COSTA, 680, 28630289	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,40 X 1,10	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,50 X 1,50 DATA: 07/07/2023 EQUIPE: MARCO - ALEXANDRE	01:00:00	2,25	0,04
3480419	07/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	RUI SANGLARD	ZELINA ERTHAL SANGLARD, 942, 28635566	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS: 2M X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 2,00 X 0,50 DATA: 07/07/2023 EQUIPE: LUIZ - THIAGO	00:40:00	1,00	0,03
3480394	07/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	RUI SANGLARD	ADELINO ALVES DE AMORIM, 28635600	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS PARA REFAZER ASFALTO AFUNDADO: 0,90 X 0,80 E 2,00 X 0,30	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 0,90 X 0,80 X E 2,00 X 0,30 DATA: 07/07/2023 EQUIPE: LUIZ - THIAGO	01:02:00	1,32	0,02
3480393	11/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	RUI SANGLARD	MARIA ADELAIDE AMORIM, 28635610	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS APROXIMADAS: 3,50 X 3,00 - DUAS EQUIPES COM RETRO	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS: 8,40 X 3,90 EM 11/07/23 POR ADAO/LUIZ/THIAGO/LEANDRO/MAIQUE.	02:50:00	32,76	0,19
3480325	06/07/2023	1040 - SED-03GSO-RP05	CONSELHEIRO PAULINO	MANOEL ELIAS PERROUD, 90, 28634000	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2,10 X 1,40	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 2,30 X 1,40 DATA: 06,07,2023 EQUIPE: LEANDRO - MAIQUE	01:10:00	3,22	0,05
3479592	05/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	SÃO JORGE	JOAQUIM PEREIRA BISPO, 28633615	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,00 X 2,00	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,60 X 2,00 EM 05/07/23 POR ADAO/LUIZ/THIAGO/LEANDRO/MAIQUE.	01:00:00	5,20	0,09
3479575	06/07/2023	961 - SED-03GSO-RP03	RIOGRANDINA	JULIO JOSE DA SILVA, 60, 28634460	REPOR 2 SACOS DE ASFALTO APÓS SECAR CONCRETO EM VOLTA DO PV	SERVIÇO EXECUTADO: REJUNTE ENTORNO DO PV (ASFALTO) MEDIDAS: 4,00 X 0,40 DATA: 06,07,2023 EQUIPE: MARCO - ALEXANDRE	00:20:00	1,60	0,08
3479555	06/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	BELA VISTA	BAHIA, 192, 28623260	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 0,90 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,10 X 0,80 DATA: 06,07,2023 EQUIPE: LUIZ - THIAGO	00:25:00	0,88	0,04
3479554	06/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	BELA VISTA	BAHIA, 132, 28623260	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REPOR ASFALTO JUNTO AOS T9, MEDIDAS: 1,50 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,80 X 1,40 DATA: 06,07,2023 EQUIPE: LUIZ - THIAGO	00:40:00	2,52	0,06
3479535	09/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	ARCO ÍRIS, 7, 28610330	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 0,80 X 0,70 E 1,30 X 0,25. 3 CARRINHOS DE ENTULHO.	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 0,80 X 0,70 E 1,30 X 0,25 DATA: 09/07/2023 EQUIPE: HENRIQUE - THIAGO - LUIZ	00:24:00	0,89	0,04
3478873	06/07/2023	1040 - SED-03GSO-RP05	RUI SANGLARD	RUA JOSE ACINDINO PINTO, 96, 28635565	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 1,00 X ,80 E 2,50 X 0,30	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,00 X 0,80 E 2,50 X 0,30 DATA: 06,07,2023 EQUIPE: LEANDRO - MAIQUE	00:55:00	1,55	0,03
3478723	09/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	DO ARCO ÍRIS, 28605610	INVESTIMENTO ÁGUA/ MEDIDAS: 0,80 X 0,50 / 1,50 X 0,20	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 0,80 X 0,50 / 1,50 X 0,20 DATA: 09/07/2023 EQUIPE: HENRIQUE - THIAGO - LUIZ	01:05:00	0,70	0,01
3478265	03/07/2023	961 - SED-03GSO-RP03	VILA AMÉLIA	EUGENIO MONTECHIARI, 3, 28625610	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,00 X 1,00 DATA: 03/06/2023 EQUIPE: MARCO ALEXANDRE	00:30:00	1,00	0,03
3477901	12/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	VARGINHA	LUCIO ANTUNES NOGUEIRA, 202, 28616320	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 5M X 2M	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 5,00 X 2,40. DATA: 12.07.2023. POR: ADAO/LUIZ/THIAGO.	01:55:00	12,00	0,10

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M² por minuto
3477899	02/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	ARCO ÍRIS, 10, 2800000	MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 5,00 X 0,30 / 1,50 X 0,50 / 1,20 X 1,00 DATA: 02/07/2023 POR HENRIQUE, JOÃO E WESLEY.	01:40:00	3,45	0,03
3477898	02/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	ARCO ÍRIS, 5, 2800000	MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 3,60 X 0,40 / 1,20 X 0,60 DATA: 02/07/2023 POR HENRIQUE, JOÃO E WESLEY.	00:38:00	2,16	0,06
3477892	02/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	ARCO ÍRIS, 7, 2800000	MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 4,60 X 0,40 / 1,50 X 1,00 DATA: 02/07/2023 POR HENRIQUE, JOÃO E WESLEY.	00:55:00	3,34	0,06
3477135	11/07/2023	959 - SED-03GSO-RP01	LAGOA SECA	JOSE CORREA DA SILVA, 36, 28634070	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 2,50 X 1,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,10 X 0,50 E 0,70 X 0,40. DATA: 11.07.2023. POR: SANDRO/MARCELO/GILSON.	01:03:00	0,83	0,01
3475377	06/07/2023	1040 - SED-03GSO-RP05	LAGOA SECA	MT0 JOAQUIM NAEGLÉ LAGOA SECA, 28633520	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS DO ASFALTO QUE SOLTOU: 1,60 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,60 X 0,70 DATA: 06/07/2023 EQUIPE: LEANDRO - MAIQUE	00:30:00	1,12	0,04
3474441	05/07/2023	1040 - SED-03GSO-RP05	SÃO JORGE	JOAQUIM PEREIRA BISPO, 28633615	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 12M X 1,50	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS:12,00 X 1,50. EM 05/07/23 POR ADAO/LUIZ/THIAGO/LEANDRO/MAIQUE.	02:00:00	18,00	0,15
3470669	14/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	PARADA FOLLY	ARMINDA GRIPP FOLLY, 28605606	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,70 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,70 X 0,60 DATA: 14/07/2023 EQUIPE: ADÃO - LUIZ - THIAGO	00:25:00	1,02	0,04
3470536	13/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	CONSELHEIRO PAULINO	ROSA RIBEIRO, 17, 28633450	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 20,00 E 1,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 20,00 X 1,80. DATA: 13.07.2023. POR: ADÃO/LUIZ/THIAGO.	03:10:00	36,00	0,19
3469101	06/07/2023	1040 - SED-03GSO-RP05	GRANJA MIMOSA	JOSE RUIZ GALVEZ, 51, 28635704	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,20 X 1,20 /1,00 X 0,40 RETIRAR 2 CARRINHOS DE ENTULHO	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,70 X 1,30 DATA: 06/07/2023 EQUIPE: LEANDRO - MAIQUE	00:50:00	2,21	0,04
3468996	12/07/2023	1040 - SED-03GSO-RP05	ROSA BRANCA	LAS VEGAS, 4, 28633630	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS:1,00 X 1,00 RETIRADO 2 CARRINHOS DE ENTULHO. EM 12/07/23 POR LEANDRO/MAIQUE.	00:40:00	1,00	0,03
3467530	10/07/2023	959 - SED-03GSO-RP01	SANTA BERNADETE	ZULMIRA BERÇOT DA COSTA, 571, 28630289	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,80 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 0,80 X 0,50 DATA: 10/07/2023 POR SANDRO, MARCELO E GILSON.	00:33:00	0,40	0,01
3463823	14/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	PARADA FOLLY	CEL HEBER ALVES DA COSTA P FOLLY, 28605610	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,70 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 0,90 X 0,90 DATA: 14/07/2023 EQUIPE: ADÃO - LUIZ - THIAGO	00:33:00	0,81	0,02
3463229	11/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	VILA GUARANI	GAL ARGOLO, 28613250	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00. DATA: 11.07.2023. POR: HENRIQUE/JOÃO/WESLEY.	00:45:00	1,00	0,02
3462558	11/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	CORDOEIRA	FERNANDO ENES, 120, 28614020	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS:2,20 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,50 X 1,20. DATA: 11.07.2023. POR: HENRIQUE/JOÃO/WESLEY.	00:51:00	3,00	0,06
3461365	10/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	CONSELHEIRO PAULINO	MANOEL ELIAS PERROUD, 801, 28634000	REALIZAR A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTO 0,60 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,60 X 1,30. DATA: 10.07.2023. POR: ADÃO/THIAGO.	00:55:00	2,08	0,04
3461298	10/07/2023	959 - SED-03GSO-RP01	PARQUE DAS FLORES	RUFINO SIQUEIRA, 61, 28635500	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTOS AFUNDADOS: 1,00 X 0,80 E 1,50 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 1,00 X 0,80 / 1,50 X 1,00 DATA: 10/07/2023 POR SANDRO, MARCELO E GILSON.	00:46:00	2,30	0,05
3459731	02/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	CORDOEIRA	THEOFILO MARRA, 19, 28613680	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 1,80 X 1,10 / 5,00 X 0,30 DATA: 02/07/2023 POR JOSÉ HELENO, LUIZ GUILHERME E THIAGO.	01:30:00	3,48	0,04
3458853	10/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DA CHÁCARA	DO ARCO ÍRIS, 28605610	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 3,10 X 0,60 E 1,60 X 1,40 E 2,00 X 1,70 E 1,90 X 1,80 E 1,50 X 1,50. ENTRAR EM CONTATO COM O FABRICIO, POIS OS LOCAIS SÃO DEFÍCEIS DE LOCALIZAR.	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 3,10 X 0,60 DATA: 10/07/2023 POR HENRIQUE, JOÃO E WESLEY.	00:45:00	1,86	0,04
3457868	03/07/2023	959 - SED-03GSO-RP01	SÃO JORGE	VALDIR GRATIVAL, 105, 28633595	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,90 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 0,90 X 0,70 DATA: 03/06/2023 EQUIPE: SANDRO - MARCELO - GILSO	00:28:00	0,63	0,02
3456952	03/07/2023	1040 - SED-03GSO-RP05	CATARCIONE	ANTONIO BANJAR, 725, 28614280	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 0,60 X 0,50	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS:0,60 X 0,50 EM 03/07/23 POR LEANDRO/MAIQUE.	00:25:00	0,30	0,01
3456950	11/07/2023	960 - SED-03GSO-RP02	VILA GUARANI	DIMAS PEDROSA, 272, 28614010	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 7,00 X 0,50 E 1,00 X 1,00 E 4,00 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 7,00 X 0,70 E 4,10 X 0,70 E 1,10 X 1,10. DATA: 11.07.2023. POR: HENRIQUE/JOÃO/WESLEY.	01:10:00	8,98	0,13

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M² por minuto
3453937	03/07/2023	1040 - SED-03GSO-RP05	VARGINHA	RUA MARIA BAPTISTA MOLIARI, 75, 28616280	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 6,00 X 0,50	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS:1.10 X 1.10 / 2.20 X 1.30 / 3.10 X 0.50 EM 03/07/23 POR LEANDRO/MAIQUE.	01:40:00	5,62	0,06
3452526	04/07/2023	1040 - SED-03GSO-RP05	RIOGRANDINA	CANTO DO SABIA, 28634382	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,00 X 1,00	EXECUTADO COMPACTAÇÃO NO LOCAL. MEDIDAS:0.60 X 0.90 E 1.40 X 1.20 EM 04/07/23 POR LEANDRO/MAIQUE	01:25:00	2,22	0,03
3452461	04/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	PARQUE DAS FLORES	JOSE SILVA, 23, 28635436	NIVELAR TAMPA DO PV COM ASFALTO	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS:2.00 X 2,00 EM 04/07/23 POR ADAO/LUIZ/THIAGO.	01:25:00	4,00	0,05
3452381	04/07/2023	959 - SED-03GSO-RP01	LUMIAR	SETE DE SETEMBRO LUMIAR, 533, 28616115	AGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE AFUNDOU E TRINCOU DEVIDO A VAZAMENTO DE ÁGUA, MEDIDAS: 3,00 X 2,00	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 1.50 X 1,10 / 1,20 X 1,00 DATA: 04/07/2023 POR SANDRO, MARCELO E GILSON.	00:25:00	2,85	0,11
3451687	04/07/2023	959 - SED-03GSO-RP01	LUMIAR	SETE DE SETEMBRO LUMIAR, 11, 28616115	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 3,30 X 1,30	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 3.30 X 1.30 DATA: 04/07/2023 POR SANDRO, GILSON E MARCELO.	02:05:00	4,29	0,03
3451678	03/07/2023	959 - SED-03GSO-RP01	SÃO JORGE	VALDIR GRATIVAL, 5, 28633595	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,00 X 0,90 DATA: 03/06/2023 EQUIPE: SANDRO - MARCELO - GILSO	00:50:00	0,90	0,02
3450958	06/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	TIO DONGO	BRASILIANA DA ROSA TEIXEIRA, 20, 28633327	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,50 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,50 X 0,80 DATA: 06,07,2023 EQUIPE: LUIZ - THIAGO	00:55:00	1,20	0,02
3449309	06/07/2023	962 - SED-03GSO-RP04	ALTO DE OLARIA	PREF JOAQUIM ANTUNES, 12, 28623770	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 4M X 1,60	SERVIÇO EXECUTADO: REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,90 X 0,70 DATA: 06,07,2023 EQUIPE: LUIZ - THIAGO	00:35:00	1,33	0,04
							69:13:00	252,65	3,58


































































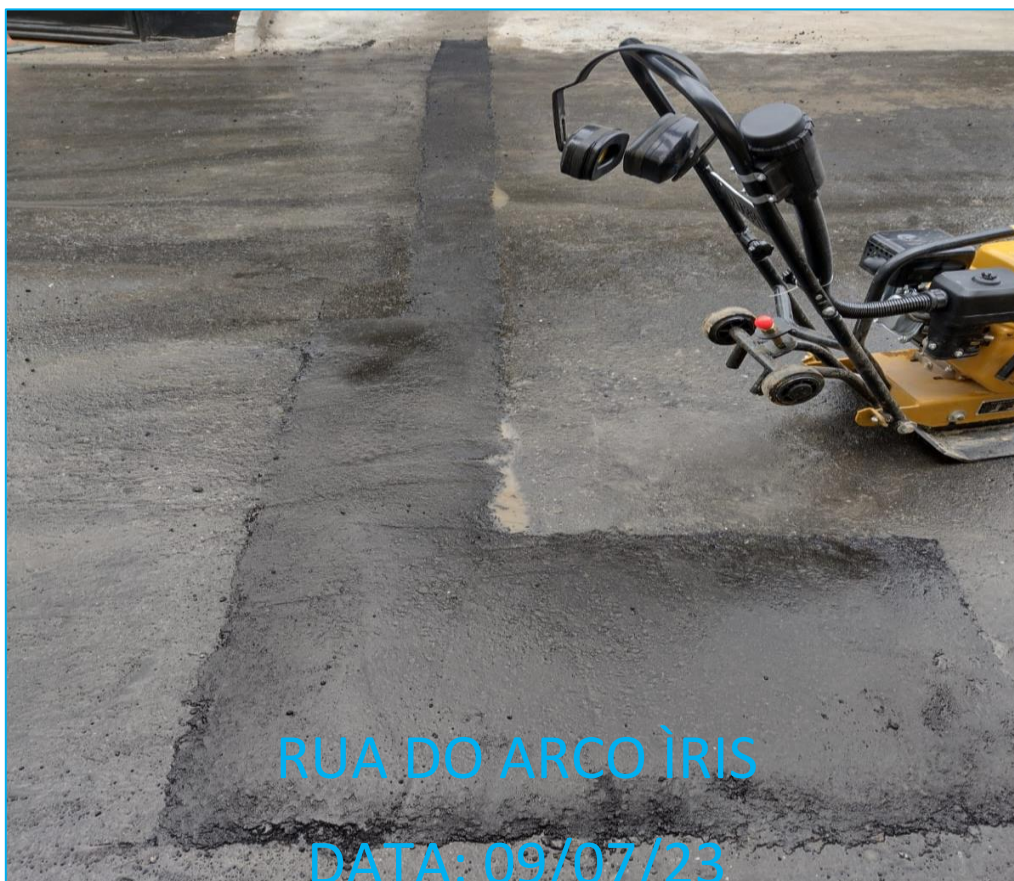







































































Nova Friburgo, 03 de novembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 02/10/2022 a 08/10/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 02/10/2022 a 08/10/2022.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-620/2022-SUP
DSSM-td

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO					
			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 02/10/2022 a 08/10/2022					
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3308364	08/10/2022	15 - 03PV02	RUA BRASILIANA DA ROSA TEIXEIRA, 9, 28633327	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 2,00 X 1,00	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 1,00. EM 08/10/2022. POR MARCO/ALEXANDRO/WESLEY.	00:25:00	2,00	0,08
3308354	08/10/2022	15 - 03PV02	RUA GONÇALO RIBEIRO, 19, 28633110	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,80 X 0,60	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00. EM 08/10/2022. POR MARCO/ALEXANDRO/WESLEY.	00:18:00	1,00	0,06
3307785	07/10/2022	17 - 03PV04	PREF GUSTAVO LIRA, 64, 28623390	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,70 X 1,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,70 X 1,50 EM 07/10/2022 POR JOSÉ HELENO - GILSON - SEBASTIÃO	00:50:00	2,55	0,05
3307218	06/10/2022	15 - 03PV02	FRANCISCO NEVES DE A FILHO, 23, 28630627	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,80 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 X 0,80 EM 06/10/2022 POR EDIVANDRO - GILSON SEBASTIÃO	00:25:00	0,64	0,03
3307202	06/10/2022	16 - 03PV03	FRANCISCO FERNANDES BARRADAS, 87, 28634440	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,00 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 2,00 X 0,80 EM 06/10/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:35:00	1,60	0,05
3305586	04/10/2022	16 - 03PV03	BRASILIANA DA ROSA TEIXEIRA, 9, 28633327	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 3,20 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,20 X 0,90 EM 04/10/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:36:00	2,88	0,08
3305348	03/10/2022	17 - 03PV04	AURELIANO BARBOZA FARIA, 113, 28634060	MANUTENÇÃO PERDAS, MEDIDAS A CONFERIR.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,70 / 2,40 X 0,60 DATA: 03/10/2022 POR ARECILDO, GILSON E SEBASTIÃO.	00:39:00	3,99	0,10
3305345	03/10/2022	17 - 03PV04	AURELIANO BARBOZA FARIA, 112, 28634060	MANUTENÇÃO PERDAS, MEDIDAS A CONFERIR.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,30 X 1,40 / 3,50 X 0,90 DATA: 03/10/2022 POR ARECILDO, GILSON E SEBASTIÃO.	01:31:00	4,97	0,05
3305343	03/10/2022	17 - 03PV04	AURELIANO BARBOZA FARIA, 10, 28634060	MANUTENÇÃO PERDAS, MEDIDAS A CONFERIR.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 0,70 DATA: 03/10/2022 POR ARECILDO, GILSON E SEBASTIÃO.	03:45:00	1,05	0,00
3305337	05/10/2022	17 - 03PV04	AURELIANO BARBOZA FARIA, 67, 28634060	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 1,20 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 DATA: 05/10/2022 POR ARECILDO, SEBASTIÃO E GILSON.	00:40:00	1,20	0,03
3305259	07/10/2022	16 - 03PV03	DORALICE MERECE, 15, 28630585	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 6,50 X 0,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 6,50 X 0,30 EM 07/10/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:04:00	1,95	0,49
3303284	07/10/2022	17 - 03PV04	LUCIO ANTUNES NOGUEIRA, 230, 28616320	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 3,00 X 1,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 6,50 X 0,30 EM 07/10/2022 POR JOSÉ HELENO - JOILSON - SEBASTIÃO	00:10:00	1,95	0,20
3303196	04/10/2022	17 - 03PV04	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 32, 28634060	FOI REALIZADO REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTO 1,70 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 1,80 X 0,70 X 0,20 E 2,00 X 0,80 X 0,20 EM 04/10/2022 POR SEBASTIÃO - ARECILDO - GILSON	00:35:00	0,57	0,02

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3303192	05/10/2022	17 - 03PV04	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 115, 28634060	REALIZAR REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTO 1,10 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 0,90 DATA: 05/10/2022 POR ARECILDO, SEBASTIÃO E GILSON.	00:26:00	1,08	0,04
3303189	04/10/2022	17 - 03PV04	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 67, 28634060	REALIZAR REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTO 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,80 X 0,90 X 1,20 X 1,00 EM 04/10/2022 POR SEBASTIÃO - ARECILDO - GILSON	01:15:00	4,62	0,06
3303185	05/10/2022	17 - 03PV04	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 139, 28634060	REALIZAR A REPOSIÇÃO DE ASFALTO 2,50 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,50 X 0,80 DATA: 05/10/2022 POR ARECILDO, SEBASTIÃO E GILSON.	00:47:00	2,00	0,04
3302422	04/10/2022	17 - 03PV04	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 47, 28634060	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,10 X 0,80 ... 1,30 X 0,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,30 X 1,00 X 1,30 X 0,20 + 1,30 X 0,50 X 0,20 + 1,20 X 0,80 X 0,20 E 1,10 X 1,20 X 0,20 EM 04/10/2022 POR SEBASTIÃO - ARECILDO - GILSON	01:26:00	2,15	0,02
3302230	05/10/2022	17 - 03PV04	AURELIANO BARBOZA FARIA, 173, 28634060	IVESTIMENTO ÁGUA, MEDIDAS: 4,30 X 0,40	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,30 X 0,40 DATA: 05/10/2022 POR ARECILDO, SEBASTIÃO E GILSON.	00:27:00	1,72	0,06
3302165	06/10/2022	16 - 03PV03	NSA DO AMPARO JD OURO PRETO, 28635010	MEDIDAS: 0,80 X 0,80 / 0,80 X 0,80 / 0,80 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO AO REDOR DO PV EM 06/10/2022 POR MARCO - RONEY - ALEXANDRO	00:45:00	1,92	0,04
3300966	04/10/2022	17 - 03PV04	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 12, 28634060	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,50 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 0,80 EM 04/10/2022 POR SEBASTIÃO - ARECILDO - GILSON	00:38:00	1,20	0,03
3300833	03/10/2022	17 - 03PV04	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 8, 28634060	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 0,80 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 1,00 DATA: 03/10/2022 POR ARECILDO, GILSON E SEBASTIÃO.	00:15:00	0,80	0,05
3299986	04/10/2022	16 - 03PV03	RUA JOAO PEREIRA MARINS, 92, 28634063	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 3,00 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 3,00 X 0,50 EM 04/10/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:30:00	1,50	0,05
3299984	04/10/2022	16 - 03PV03	RUA JOAO PEREIRA MARINS, 92, 28634063	REPOR PAVIMENTO PARALELO 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 EM 04/10/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:20:00	1,00	0,05
3299309	07/10/2022	16 - 03PV03	TEREZA BAUER, 24, 28630306	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,20 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 1,20 X 0,80 EM 07/10/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:55:00	0,96	0,02
3297976	04/10/2022	16 - 03PV03	LUIS FERNANDO, 14, 28634090	ÁGUA, PERDAS, MEDIDAS: 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 1,40 X 1,00 EM 04/10/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	01:10:00	1,40	0,02
3296323	05/10/2022	16 - 03PV03	FRANCISCO NEVES DE A FILHO, 28630627	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 1,70 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,50 X 1,00 DATA: 05/10/2022 POR EDIVANDRO, WESLEI E JOÃO.	00:40:00	3,50	0,09
3296249	05/10/2022	16 - 03PV03	ROGERIO STUTZ PEREIRA, 28630596	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 2,50 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,50 X 1,70 DATA: 05/10/2022 POR EDIVANDRO, WESLEI E JOÃO.	00:35:00	4,25	0,12
						20:42:00	54,45	1,94

































Nova Friburgo, 14 de julho de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 03/07/2022 a 09/07/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 03/07 a 09/07/2022.

Respeitosamente,



Engª Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-393/2022-SUP
DSSM-td

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 03/07/2022 a 09/07/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3250922	07/07/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 0,50 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO E RETIRADO 1 CARRINHO DE ENTULHO + 10 PARALELOS. MEDIDAS: 1,50 X 0,60 EM 07/07/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:53:00	0,90	0,01
3247747	04/07/2022	13 - 03PV01	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 6,00 X 0,30 E 1,00 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 6,00 X 0,30 E 1,00 X 0,80 REGISTRADO EM FOTO EM 04/07/2022	01:20:00	2,60	0,03
3251624	07/07/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2M X 0,50	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS: 2,00 X 1,00 E 1,00 X 0,40. EM 07/07/22 POR MARCO/PABLO/ALEXANDRO.	00:35:00	2,40	0,07
3249600	08/07/2022	17 - 03PV04	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 0,80 X 1,00	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,70 X 1,20. EM 08/07/2022. POR ADÃO/GILSON/RUAN.	00:50:00	2,04	0,04
3247769	03/07/2022	17 - 03PV04	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,00 X 1,00 ... 1,00 X 0,30	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS: 2,10 X 1,20 EM 03/07/22 POR ADAO/RUAN/GILSON.	01:10:00	2,52	0,04
3250070	07/07/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 0,80 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 0,80 EM 07/07/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	00:40:00	0,96	0,02
3251717	08/07/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,80 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 X 0,80 EM 08/07/2022 POR EDVANDRO - RONIMAR - JOÃO	00:10:00	0,64	0,06
3246845	04/07/2022	15 - 03PV02	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,00 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 0,80 REGISTRADO EM FOTO EM 04/07/2022 POR EDVANDRO - RONIMAR - MAXWELL	01:01:00	0,80	0,01
3249782	07/07/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 0,90 REGISTRADO EM FOTO EM 07/07/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	01:48:00	0,90	0,01
3250590	06/07/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2M X 1,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,10 X 3,30 REGISTRADO EM FOTO EM 06/07/2022 POR MARCO - PABLO - ALEXANDRO	03:15:00	13,53	0,07
3245811	04/07/2022	15 - 03PV02	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 0,80 X 0,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 X 0,40 REGISTRADO EM FOTO EM 04/07/2022 POR EDVANDRO - RONIMAR - MAXWELL	01:04:00	0,32	0,01
3250618	06/07/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,90 X 0,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 5,00 X 0,70 REGISTRADO EM FOTO EM 06/07/2022 POR EDVANDRO - JOÃO	00:55:00	3,50	0,06
3249599	08/07/2022	17 - 03PV04	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 0,20 X 3,00 E 0,80 X 0,80	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,60 X 1,20 - 3,20 X 0,50. EM 08/07/2022. POR ADÃO/GILSON/RUAN.	01:30:00	1,56	0,02
3243200	07/07/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,00 X 0,60 E 7,10 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO E RETIRADO 5 CARRINHOS DE ENTULHO. MEDIDAS: 2,00 X 0,60 E 7,10 X 0,50 REGISTRADO EM FOTO EM 07/07/2022	01:38:00	4,75	0,05

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3250656	07/07/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 0,50 X 0,50	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS:1,00 X 0,60 EM 07/07/22 POR MARCO/PABLO/ALEXANDRO.	00:27:00	0,60	0,02
3252219	08/07/2022	16 - 03PV03	INVESTIMENTO ESGOTO MEDIDAS 2,30 X 2,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,30 X 2,00 EM 08/07/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - PABLO	00:45:00	4,60	0,10
3242442	04/07/2022	13 - 03PV01	FAVOR REPOR PAVIMENTO EQUIPE RAFAEL / FELIPE ... 0,50 X 0,40 ... - VAZOU NOVAMENTE	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,40 X 1,20 REGISTRADO EM FOTO EM 04/07/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	02:00:00	1,68	0,01
3243945	05/07/2022	13 - 03PV01	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS: 2,50 X 1,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,50 X 1,50 REGISTRADO EM FOTO EM 05/07/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	02:45:00	3,75	0,02
3246836	08/07/2022	15 - 03PV02	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 5,20 X 1,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 5,00 X 2,00 EM 08/07/2022 POR EDVANDRO - RONIMAR - JOÃO	00:33:00	10,00	0,30
3249878	06/07/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,30 X 1,10	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,80 X 1,50 E 1,60 X 1,00 EM 06/07/2022 POR MARCO - PABLO - ALEXANDRO	02:05:00	2,70	0,02
3251765	07/07/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,10 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 2,00 X 1,50 EM 07/07/2022 POR EDVANDRO - RONIMAR - JOÃO	00:47:00	3,00	0,06
				TOTAL:	27:11:00	63,75	1,05



























RUA D PEDRO II
DATA: 07/07/2022







Nova Friburgo, 03 de julho de 2023.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório de Serviços de Recuperação de Vias – 04/06/2023 a 17/06/2023**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilhas e relatórios fotográficos referentes ao período de 04/06/2023 a 17/06/2023.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-268/2023-SUP
DSSM-td

					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/06/2023 a 10/06/2023				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3463811	10/06/2023	959 - SED-03GSO-RP01	CONSELHEIRO PAULINO	RUA ROSA RIBEIRO, 174, 28633450	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 0,70. DATA: 10.06.2023. POR: LEANDRO/ WESLEY/PABLO.	00:15:00	0,84	0,06
3463384	10/06/2023	959 - SED-03GSO-RP01	ALTO DE OLARIA	TRAVESSA JARDIM PRIMAVERA, 20, 28623583	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,60 X 0,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,60 X 0,60. DATA: 10.06.2023. POR: LEANDRO/ WESLEY/PABLO.	00:15:00	0,36	0,02
3463153	09/06/2023	959 - SED-03GSO-RP01	OLARIA	JULIO ANTONIO THURLER, 28620000	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 1,00 RETIRAR 1 CARRINHO DE ENTULHO	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 0,80 X 0,80 DATA: 09/06/2023 POR SANDRO, MARCELO.	00:28:00	0,64	0,02
3461937	07/06/2023	960 - SED-03GSO-RP02	GRANJA SPINELLI	SABINA ABREU AGUILERA, 307, 28625805	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,40 X 1,25. DATA: 07.06.2023. POR: HENRIQUE/JOÃO/WESLEY.	00:31:00	1,75	0,06
3461418	06/06/2023	961 - SED-03GSO-RP03	CORDOEIRA	PALMERIN TRANIN, 49, 28613670	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 3,60 X 2,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,60 X 2,20. DATA: 06.06.2023. POR: MARCO/ALEXANDRO/RONEY.	00:45:00	7,92	0,18
3460593	06/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	VALE DO SOL	NSA DO AMPARO VALE DO SOL, 28635010	ESGOTO, MANUTENÇÃO, REVISAR E REFAZER TODOS OS ASFALTOS ENTRE O COMEMORY E A OFICINA CALDAS E CARDOZO.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,70 X 0,80 E 1,60 X 1,40 E 3,00 X 0,80 E 11,10 X 0,80 E 0,60 X 0,30 DATA: 06.06.2023. POR: JOSÉ HELENO/THIAGO/GUILHERME.	02:35:00	14,26	0,09
3460468	05/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	OLARIA	JULIO ANTONIO THURLER, 69, 28620000	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS À CONFERIR	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS:1,50 X 1,00 EM 05/06/23 POR JOSE HELENO//THIAGO/GUILHERME.	00:57:00	1,50	0,03
3460377	05/06/2023	960 - SED-03GSO-RP02	VILA GUARANI	GAL ARGOLO, 82, 28613250	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS A CONFERIR	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,80 X 1,30 - 0,70 X 0,50 - 1,30 X 0,60. EM 05/06/2023. POR HENRIQUE/JOÃO/WESLEY.	01:33:00	3,47	0,04
3460302	06/06/2023	960 - SED-03GSO-RP02	VILA GUARANI	GAL ARGOLO, 81, 28613250	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 1,60 X 1,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 5,00 X 1,60. DATA: 06.06.2023. POR: HENRIQUE/JOÃO/WESLEY.	02:10:00	8,00	0,06
3459784	05/06/2023	961 - SED-03GSO-RP03	SÃO JORGE	MIGUEL CORREA DA SILVA, 7, 28633590	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO; DATA: 06/06/2023 MEDIDAS: 1,00 X 1,00 EQUIPE: MARCO/ RONEY/ ALEXANDRO	00:25:00	1,00	0,04
3459351	07/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	FLORESTA	JOAO PEREIRA MARINS, 13, 28634063	REPOR ASFALTO: 2,50 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,50 X 1,50. DATA: 07.06.2023. POR: JOSÉ HELENO/THIAGO/GUILHERME.	01:15:00	3,75	0,05
3459309	07/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 25, 28634060	REPOR ASFALTO 1,00 X 1,00/0,70 X 0,70/0,50 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,45 X 1,30. DATA: 07.06.2023. POR: JOSÉ HELENO/THIAGO/GUILHERME.	01:08:00	4,49	0,07
3458834	06/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	VALE DOS PINHEIROS	EQUADOR, 60, 28625365	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,20 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00. DATA: 06.06.2023. POR: JOSÉ HELENO/THIAGO/GUILHERME.	00:35:00	1,20	0,03
3457932	04/06/2023	961 - SED-03GSO-RP03	OLARIA	MANOEL LOURENÇO SOBRINHO, 95, 28623440	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 1,50 X 0,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 0,80. DATA: 04.06.2023. POR: MARCO/WESLEY.	00:15:00	1,20	0,08
3457872	04/06/2023	961 - SED-03GSO-RP03	OLARIA	JULIO ANTONIO THURLER, 116, 28620000	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 1,80 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,80 X 0,80 DATA: 04.06.2023. POR: MARCO/WESLEY.	00:18:00	1,44	0,08
3452568	05/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	BELA VISTA	RUA STA CATARINA, 28, 28623350	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 2,50 X 0,60	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS:2,50 X 0,60 EM 05/06/23 POR JOSE HELENO//THIAGO/GUILHERME.	00:30:00	1,50	0,05
3452448	05/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	BELA VISTA	STA CATARINA, 28, 28623350	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 1,40 X 0,60	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS:1,40 X 0,60 EM 05/06/23 POR JOSE HELENO//THIAGO/GUILHERME.	00:20:00	0,84	0,04
3450199	09/06/2023	960 - SED-03GSO-RP02	SANTA BERNADETE	RIACHUELO, 129, 28630440	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2,30 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 2,30 X 0,90 DATA: 09/06/2023 POR HENRIQUE, JOÃO E WESLEY.	01:01:00	2,07	0,03
3449454	06/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	VALE DOS PINHEIROS	GARIBALDI, 126, 28625360	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 2,30 X 1,30 E 3 MEIO FIO DE 0,70 X 0,10	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,3 X 1,30. DATA: 06.06.2023. POR: JOSÉ HELENO/THIAGO/GUILHERME.	01:04:00	4,29	0,07
3449427	05/06/2023	961 - SED-03GSO-RP03	PRADO	NSA DO AMPARO PRADO, 28635010	INVESTIMENTO ÁGUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO; RECOLHIDOS 3 CARRINHOS DE ENTULHO; DATA: 06/06/2023 MEDIDAS:1,00 X 1,00 EQUIPE: MARCO/ RONEY/ ALEXANDRO	00:14:00	1,00	0,07

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3449266	04/06/2023	961 - SED-03GSO-RP03	CONSELHEIRO PAULINO	ROSA RIBEIRO, 1, 28633450	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,40 X0,90 /1,00 X 0,80/1,00 X 0,70/0,80 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,40 X 0,90 E 1,00 X 0,80 E 1,00 X 0,70 E 0,80 X 0,70. DATA: 04.06.2023. POR: MARCO/WESLEI.	01:05:00	3,32	0,05
3449227	04/06/2023	961 - SED-03GSO-RP03	CONSELHEIRO PAULINO	JOAO ALBERTO KNUST, 12, 28635460	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2,80 X 1,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 1,30. DATA: 02.06.2023. POR: MARCO/WESLEI,	01:00:00	3,90	0,07
3448646	07/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	FLORESTA	TEODORO FELIPE DAUT, 28634060	ASFALTO: 2,50 X 1,80/1,80 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,50 X 1,80 E 1,80 X 0,60. DATA: 07.06.2023. POR: JOSÉ HELENO/THIAGO/GUILHERME.	01:30:00	5,58	0,06
							20:09:00	74,32	1,35














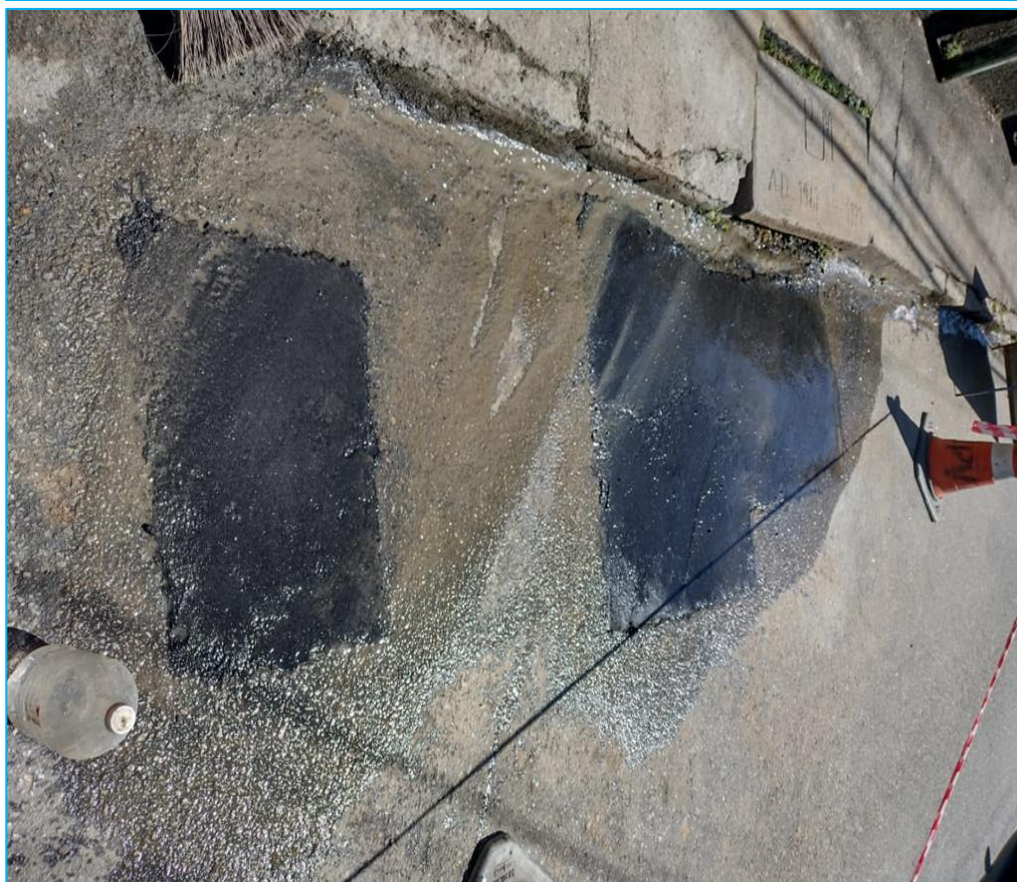



































						BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO			
MANUTENÇÃO & SERVIÇOS						PERÍODO DE MEDIÇÃO: 11/06/2023 a 17/06/2023			
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3465841	14/06/2023	954 - SED-02GSO-ES04	JARDIM MARAJOI	PLINIO SALGADO, 28635410	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,00 X 2,00	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 2,00. EM 14/06/2023. POR MAXWEL/JOSUÉ.	01:05:00	4,00	0,06
3464868	16/06/2023	959 - SED-03GSO-RP01	RIVO TORTO	RUA DELCINA MONTEIRO, 46, 28635390	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,60 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO ASFALTO MEDIDAS: 0,60 X 0,80 DATA: 16.06.2023 EQUIPE: LEANDRO/PABLO	00:35:00	0,48	0,01
3464528	14/06/2023	959 - SED-03GSO-RP01	ALTO DE OLARIA	XINGU, 38, 28620310	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,00 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 1,20 X 0,80 DATA: 14/06/2023 POR LEANDRO E PABLO.	00:45:00	0,96	0,02
3464303	12/06/2023	961 - SED-03GSO-RP03	CANTO DO RIACHO	ARARIPINA, 16, 28633380	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,30 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO PAVIMENTO RUA MEDIDAS: 1,30 X 0,60 DATA: 12.06.2023 EQUIPE: MARCO/RONEY/ALEXANDRE	00:20:00	0,78	0,04
3462103	11/06/2023	959 - SED-03GSO-RP01	SÃO CRISTÓVÃO	ALTAMIRO MARTINS OURIQUES, 239, 28633070	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,60 X 1,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,60 X 1,30. DATA: 11.06.2023. POR: LEANDRO/RONEY/PABLO.	00:35:00	3,38	0,10
3459790	12/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	CENTRO	EUTERPE FRIBURGUENSE, 88, 28605130	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 3M X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO ASFALTO MEDIDAS: 3,00 X 1,50 DATA:12.06.2023 EQUIPE: JOSE HELENO/ GUILHERME/ THIAGO	02:05:00	4,50	0,04
3458840	16/06/2023	959 - SED-03GSO-RP01	RIVO TORTO	RUA MARCOLINA RAMOS PINHEIRO, 18, 28635360	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,30 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO: COMPACTAÇÃO ASFALTO MEDIDAS: 1,10 X 1,20 DATA: 16.06.2023 EQUIPE: LEANDRO/PABLO	00:35:00	1,32	0,04
3458829	15/06/2023	959 - SED-03GSO-RP01	CAMPO DO COELHO	RUA NORIVAL DOS SANTOS CALIXTO, 21, 28630635	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 1,00 X 1,00 E 5,30 X 0,30 RETIRAR 4 CARRINHOS DE ENTULHO	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,10 X 1,00 - 4,40 X 0,50. EM 15/06/2023. POR LEANDRO/PABLO.	01:30:00	3,30	0,04
3457967	14/06/2023	959 - SED-03GSO-RP01	ROSA BRANCA	VININO FERNANDES RIBEIRO, 24, 28633633	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,90 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 0,90 X 0,80 DATA: 14/06/2023 POR LEANDRO E PABLO.	00:24:00	0,72	0,03
3457953	13/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	JARDINLÂNDIA	FRANCISCA PRIMO QUEIROZ, 57, 28633240	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2M X 1,10	SERVIÇO EXECUTADO: COMPACTAÇÃO PAVIMENTO RUA MEDIDAS: 2,00X 1,50 DATA: 13/06/2023 EQUIPE: JOSE HELENO/ GUILHERME/THIAGO	01:00:00	3,00	0,05
3457928	13/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	ALTO DE OLARIA	URUGUAIANA, 14, 28620180	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 0,80 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO: COMPACTAÇÃO PAVIMENTO RUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 DATA: 13/06/2023 EQUIPE: JOSE HELENO GUILHERME THIAGO	00:47:00	1,00	0,02
3457865	16/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	JACINA	CAMELIA DAS FLORES, 17, 28605420	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS: 5M X 0,60	SERVOÇO EXECUTADO: COMPACTAÇÃO ASFALTO MEDIDAS: 5,00 X 1,00 DATA: 16/06/2023 EQUIPE:	01:25:00	5,00	0,06
3457831	16/06/2023	959 - SED-03GSO-RP01	RIVO TORTO	DELCINA MONTEIRO, 43, 28635390	FAZER RAMPA PARA CARRO DE ASFALTO	SERVIÇO EXECUTADO: RECUPERAÇÃO ASFALTO MEDIDAS: 6,60 X 0,60 DATA: 16.06.2023 EQUIPE: LEANDRO/PABLO	00:40:00	3,96	0,10
3457165	13/06/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DE OLARIA	XINGU, 211, 28620310	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 0,90 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO: COMPACTAÇÃO ASFALTO MEDIDAS: 1,00 X 1,00 DATA: 13/06/2023 EQUIPE: HENRIQUE/JOÃO/WESLEY	00:50:00	1,00	0,02
3456998	13/06/2023	960 - SED-03GSO-RP02	ALTO DE OLARIA	JOAO JANUARIO DA SILVA, 175, 28620300	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS: 2M X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO: COMPACTAÇÃO ASFALTO MEDIDAS: 2,00 X 0,60 DATA: 13/06/2023 EQUIPE: HENRIQUE/JOÃO/WESLEY	00:39:00	1,20	0,03
3455833	15/06/2023	959 - SED-03GSO-RP01	CAMPO DO COELHO	ROGERIO STUTZ PEREIRA, 28630596	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,50 X 0,50	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,70 X 1,50. EM 15/06/2023. POR LEANDRO/PABLO.	00:50:00	2,55	0,05
3454810	13/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	JARDINLÂNDIA	FRANCISCA PRIMO QUEIROZ, 29, 28633240	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,50 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO: COMPACTAÇÃO ASFALTO MEDIDAS: 2,00 X 1,00 DATA: 13/06/2023 EQUIPE: JOSE HELENO/ THIAGO/ GUILHERME	01:05:00	2,00	0,03
3453224	16/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	JACINA	RUA CAMELIA DAS FLORES, 12, 28605420	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 3,00 X 1,50	SERVOÇO EXECUTADO: COMPATAÇÃO ASFALTO MEDIDAS: 3,30 X 1,70 DATA: 16/06/2023 EQUIPE: JOSE HELENO / GUILHERME/ THIAGO	01:32:00	5,61	0,06
3449437	14/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	SANTA LUZIA	DR CASTRO REBELO, 196, 28616366	REPOR ASFALTO: 1,20 X1,00/5,00 X 0,30	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 1,20 X 1,00 / 5,00 X 0,30 DATA: 14/06/2023 POR JOSÉ HELENO, GUILHERME E THIAGO.	00:40:00	2,70	0,07


Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3449435	14/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	SANTA LUZIA	DR CASTRO REBELO, 46, 28616366	REPOR ASFALTO: 1,20 X1,00/5,00 X 0,30	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 1,20 X 1,00 / 5,00 X 0,30 DATA: 14/06/2023 POR JOSÉ HELENO, GUILHERME E THIAGO.	00:40:00	2,70	0,07
3449423	12/06/2023	960 - SED-03GSO-RP02	BRAUNES	SARA BRAUNE, 91, 28611020	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 5,00 X 1,20 1,40 X 1,90 4,30 X 1,20	SERVIÇO EXECUTADO; RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO MEDIDAS: 5,00X 1,20 2,00 X 1,90 4,70 X 1,40 DATA: 12/06/2023 EQUIPE; MARCO/ ALEXANDRE/ RONEY	02:00:00	16,38	0,14
							20:02:00	66,54	1,07









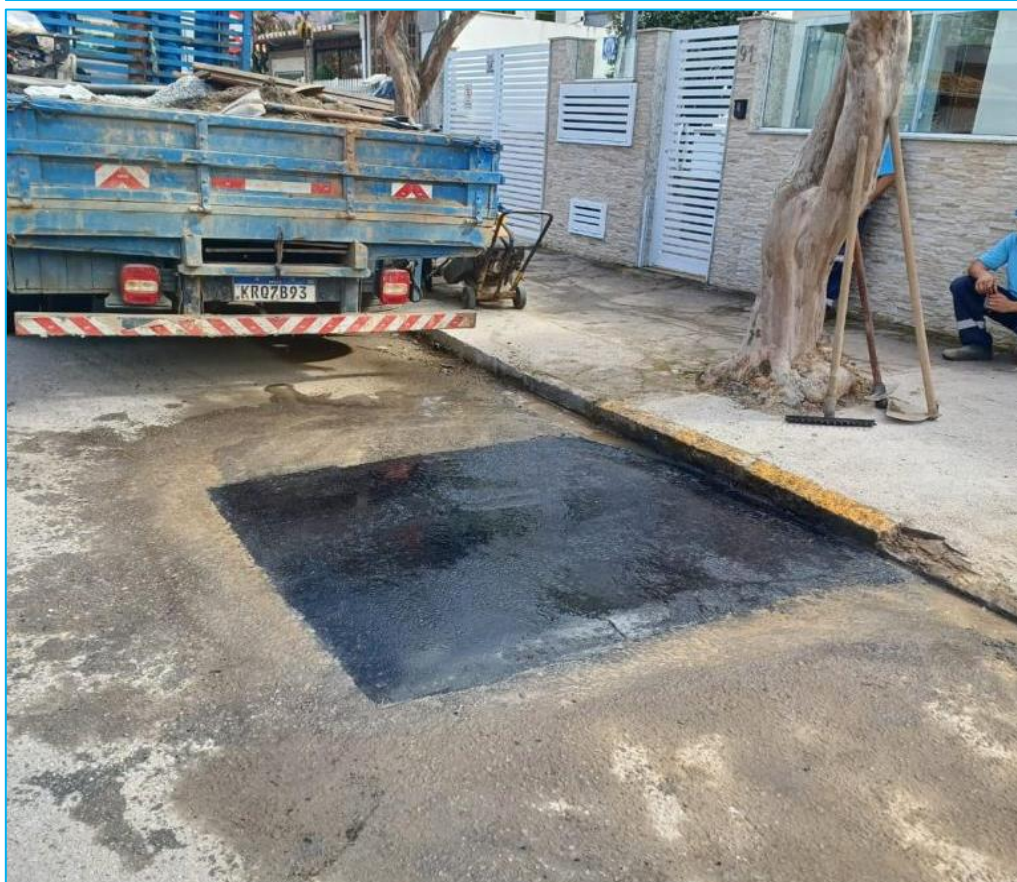









































Nova Friburgo, 29 de novembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Secretaria Geral de Governo
Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho
Av. Alberto Braune, 225 - Centro
Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 06/11/2022 a 12/11/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 06/11/2022 a 12/11/2022.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-672/2022-SUP
DSSM-td

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 06/11/2022 a 12/11/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3324603	06/11/2022	15 - 03PV02	PAISSANDÚ	TRAJANO DE ALMEIDA, 82, 28625120	2,40 X 0,80 - CARRO NO LOCAL/NECESSÁRIO SINALIZAR/ A N	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,20 X 2,80 / 2,00 X 1,80 DATA: 06/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	02:15:00	12,56	0,09
3323919	07/11/2022	16 - 03PV03	SÍTIO SÃO LUIS	MARIO ANTONIO THURLER, 128, 28621137	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 DATA: 07/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	00:30:00	1,00	0,03
3316089	07/11/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 47, 28634060	INVESTIMENTO ESGOTO MEDIDAS 1,80 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,80 X 0,70 DATA: 07/11/2022 POR ADÃO, GILSON E MAXWELL.	01:00:00	1,26	0,02
3323802	07/11/2022	16 - 03PV03	OLARIA	PRES VARGAS, 133, 28623410	TÉCNICO FERNANDO REALIZOU VISITA PERIÓDICA E ATESTOU QUE O ASFALTO AFUNDOU, NECESSÁRIO RECUPERAR O ASFALTO, MEDIDAS: 1,80 X 1,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,20 X 2,00 DATA: 07/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	00:40:00	4,40	0,11
3325594	07/11/2022	13 - 03PV01	PAISSANDÚ	TRAJANO DE ALMEIDA, 82, 28625120	REPOR ASFALTO: 3,60 X 2,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,60 X 2,70 DATA: 07/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	01:15:00	9,72	0,13
3324724	07/11/2022	16 - 03PV03	SÃO JORGE	EVANGELISTA M SILVA S JORGE, 293, 28633620	DAS: 1,20 X 0,90 RECOLHER PLACA DO FELIX NO LOCAL - RET	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,20 E 5 CARRINHOS DE ENTULHO RECOLHIDOS. DATA: 07/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	00:30:00	1,44	0,05
3323845	07/11/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 39, 28634060	ÁGUA, PERDAS, MEDIDAS: 1,00 X 1,00 ... 2,40 X 0,10	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 / 2,40 X 0,10 DATA: 07/11/2022 POR ADÃO, GILSON E MAXWELL.	00:52:00	1,24	0,02
3324755	07/11/2022	13 - 03PV01	BAIRRO SUIÇO	JACOB JOYE, 28610345	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,60 X 0,60/0,80 X 0,80/1,70 X 0,40/1,00 X 0,50 RETIRAR 4 CARRINHOS DE ENTULHO	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,70 X 0,60 / 0,90 X 0,40 / 1,70 X 0,40 / 1,60 X 0,80 E 4 CARRINHOS DE ENTULHO RECOLHIDOS. DATA: 07/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	02:10:00	2,74	0,02
3325993	08/11/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 174, 28634060	ÁGUA, PERDAS, MEDIDAS: 1,00 X 1,00 ... 6,00 X 0,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,20 / 5,00 X 0,60 DATA: 08/11/2022 POR ADÃO, GILSON E MAXWELL.	00:35:00	4,44	0,13
3325996	08/11/2022	16 - 03PV03	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 112, 28634060	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 5,00 X 0,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 5,00 X 0,80 / 1,40 X 1,00 DATA: 08/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	00:55:00	5,40	0,10
3323847	08/11/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 173, 28634060	ÁGUA, PERDAS, MEDIDAS: 4,00 X 0,25 ... 0,80 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,00 X 0,25 / 0,80 X 1,00 DATA: 08/11/2022 POR ADÃO, GILSON E MAXWELL.	01:05:00	1,80	0,03
3323846	08/11/2022	16 - 03PV03	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 112, 28634060	ÁGUA, PERDAS, MEDIDAS: 1,00 X 1,00 ... 4,00 X 0,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,20 X 1,10 / 4,00 X 0,70 DATA: 08/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	01:00:00	5,22	0,09
3324609	08/11/2022	16 - 03PV03	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 117, 28634060	A, PERDAS, REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,00 X 1,00 ... 1,50 X	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 0,70 / 1,00 X 1,00 DATA: 08/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	00:47:00	3,10	0,07

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3325599	09/11/2022	16 - 03PV03	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 28634060	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,50 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,00 DATA: 09/11/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:35:00	1,50	0,04
3324779	09/11/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 13, 28634060	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 3,50 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,50 X 1,50 DATA: 09/11/2022 POR ADÃO, GILSON E SEBASTIÃO.	01:10:00	5,25	0,08
3323849	09/11/2022	16 - 03PV03	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 115, 28634060	ÁGUA, PERDAS, MEDIDAS: 0,80 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 1,00 DATA: 09/11/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:30:00	0,80	0,03
3325994	09/11/2022	16 - 03PV03	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 116, 28634060	ÁGUA, PERDAS, MEDIDAS: 1,20 X 1,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,70 X 1,70 DATA: 09/11/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:15:00	2,89	0,19
3324608	09/11/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	MARIA KNUST, 10, 28634060	ESSÁRIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTO 2 M, A PEDIDO DO COMER	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,80 DATA: 09/11/2022 POR ADÃO, GILSON E SEBASTIÃO.	00:20:00	0,64	0,03
3327488	09/11/2022	13 - 03PV01	VALE DOS PINHEIROS	CANADA, 252, 28625385	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,00 X 1,00 E 0,60 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 / 0,60 X 0,60 DATA: 09/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	01:05:00	1,36	0,02
3327675	09/11/2022	15 - 03PV02	PARADA FOLLY	CEL HEBER ALVES DA COSTA P FOLLY, 28605610	INVESTIMENTO ÁGUA, MEDIDAS: 1,00 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 0,50 FOTOS NA OS 3327705-0 (ENTULHO). DATA: 09/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E JOÃO.	01:23:00	0,75	0,01
3327631	10/11/2022	16 - 03PV03	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 28634060	MEDIDAS: 3,50 X 1,00 2,00 X 1,00 1,20 X 1,00 1,20 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,50 X 1,00 / 2,00 X 1,00 / 1,20 X 1,00 / 1,20 X 1,00 / 1,40 X 1,00 DATA: 10/11/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	01:45:00	9,30	0,09
3327664	10/11/2022	16 - 03PV03	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 172, 28634060	PERDAS ÁGUA, MEDIDAS: 1,50 X 1,50 / 1,50 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,50 / 1,50 X 1,50 DATA: 10/11/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:30:00	4,50	0,15
3326202	10/11/2022	13 - 03PV01	NOVA ESPERANÇA	ARTHUR LIMA, 10, 28630498	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,50 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,50 X 1,50 DATA: 10/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	04:50:00	3,75	0,01
3327671	10/11/2022	15 - 03PV02	BELA VISTA	ACRE, 13, 28623340	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 4,00 X 2,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 5,00 X 3,00 DATA: 10/11/2022 POR ADÃO , GILSON E MAXWELL.	01:28:00	15,00	0,17
3328440	10/11/2022	16 - 03PV03	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 139, 28634060	ÁGUA, PERDAS, MEDIDAS: 1,70 X 0,90 E 1,60 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,70 X 0,90 / 1,60 X 1,00 DATA: 10/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	00:35:00	3,13	0,09
3327642	11/11/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 630, 28634060	MEDIDAS: 4,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,00 X 1,00 DATA: 11/10/2022 POR ADÃO, GILSON E MAXWELL.	00:45:00	4,00	0,09
3323314	11/11/2022	13 - 03PV01	RUI SANGLARD	JOSE POLETTI, 41, 28635567	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO AFUNDADO, MEDIDAS: 1,00 X 0,30 E 0,80 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,90 X 0,50 / 1,40 X 0,90 DATA: 11/10/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	01:20:00	3,21	0,04

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3328868	11/11/2022	15 - 03PV02	PAISSANDÚ	CONS JULIUS ARP PAISSANDÚ, 28623000	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 2M X 1,50	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 1,50. EM 11/11/2022. POR JOILSON/PATRICK.	00:10:00	3,00	0,30
3327635	11/11/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 136, 28634060	PERDAS ÁGUA, MEDIDAS: 2,50 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,50 X 1,00 DATA: 11/10/2022 POR ADÃO, GILSON E MAXWELL.	00:10:00	2,50	0,25
3329532	12/11/2022	16 - 03PV03	OLARIA	RUA PRES VARGAS, 24, 28623410	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 1,30 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,40 X 1,00 DATA: 12/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	00:25:00	1,40	0,06
							30:50:00	117,30	2,53






































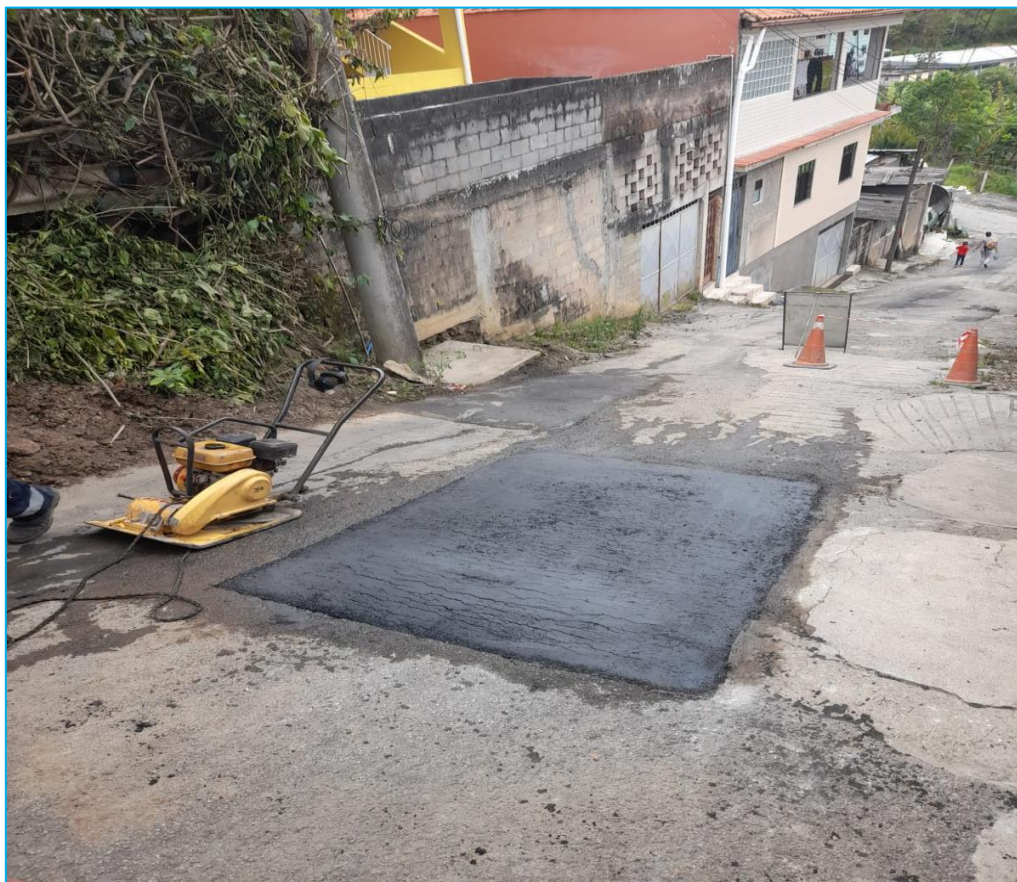











Nova Friburgo, 18 de fevereiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro


Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 07/02 a 11/02/2022.

Respeitosamente,



Engº João Henrique Tebyriça de Sá
Diretor

C-092/2022-SUP
JHTS-td

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 07/02/2022 a 11/02/2022		
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Medidas
3159262	09/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 DATA: 09/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	1
3156901	07/02/2022	26 - 02AG08	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE SOLTOU, MEDIDAS APROXIMADAS: 3M X 1,2M E 0,80 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 1,00 / 0,80 X 0,80 / 2,00 X 0,60 / 1,30 X 0,80 / 0,90 X 0,40 DATA: 07/02/2022 POR DANIEL, MARCO E THIAGO.	6,24
3159179	09/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,30 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,30 X 1,00 DATA: 09/02/2022 POR DANIEL, MARCO E THIAGO.	1,3
3155243	07/02/2022	26 - 02AG08	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,00 DATA: 07/02/2022 POR DANIEL, MARCO E THIAGO.	2
3155302	10/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO ESGOTO REJUNTAR TAMPÃO MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,70 DATA: 10/02/2022 POR DANIEL, MARCO E THIAGO.	0,56
3160953	10/02/2022	26 - 02AG08	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 0,80 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,50 DATA: 10/02/2022 POR DANIEL, MARCO E THIAGO.	0,4
3155348	10/02/2022	26 - 02AG08	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,20 X 1,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,20 DATA: 10/02/2022 POR DANIEL, MARCO E THIAGO.	1,44
3160227	10/02/2022	26 - 02AG08	FAVOR REPOR PAVIMENTO EQUIPE REGINALDO / PAULO ... 0,50 X 0,50 ...	SERVIÇO EXECUTADO. NECESSÁRIO TROCA DE SOLO (OS 3156218). FOI FEITO A REPOSIÇÃO (OS 3160228) DATA: 10/02/2022 POR DANIEL, MARCO E THIAGO.	
3158025	09/02/2022	26 - 02AG08	FAVOR REPOR PAVIMENTO EQUIPE JOSÉ REGINALDO / RENILDO ... 0,70 X 0,60 ...	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,70 X 0,60 DATA: 09/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	0,42
3159052	08/02/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,30 X 1,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARELELO. MEDIDAS: 1,30 X 1,30 EM 08/02/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	1,69
3158158	09/02/2022	26 - 02AG08	MEDIDAS 1,00 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,70 DATA: 09/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	0,7
3157946	09/02/2022	26 - 02AG08	FAVOR REPOR PAVIMENTO EQUIPE DORACI / JOHNATAN ... 0,60 X 0,60 ...	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,60 X 0,60 DATA: 09/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	0,36
3159016	09/02/2022	26 - 02AG08	FAVOR REPOR PAVIMENTO EQUIPE JOSÉ REGINALDO / RENILDO ... 1,50 X 0,50 ...	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 0,50 DATA: 09/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	0,75
3160764	10/02/2022	29 - 02PV01	ESGOTO, MANUTENÇÃO, LEVAR 6 SACOS DE ASFALTO PARA REJUNTAR A TAMPA DO P.V.	LEVADO 6 SACOS DE ASFALTO PARA REJUNTAR A TAMPA DO PV EM 10/02/2022 POR PABLO - ARECILDO	
3151762	08/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,60 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,60 X 1,50 DATA: 07/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	2,4
3158242	09/02/2022	26 - 02AG08	FAVOR REPOR PAVIMENTO EQUIPE DORACI / JOHNATAN ... 0,60 X 0,60 ...	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,60 X 0,60 DATA: 09/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	0,36

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Medidas
3158245	09/02/2022	26 - 02AG08	FAVOR REPOR PAVIMENTO EQUIPE DORACI / JOHNATAN ... 0,60 X 0,60 ...	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,60 X 0,60 DATA: 09/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	0,36
3158247	08/02/2022	26 - 02AG08	MEDIDAS: 1,00 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,50 / 0,50 X 0,40 DATA: 07/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	0,7
3152997	09/02/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 18M X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 20,00 X 1,20 EM 09/02/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	24
3160761	10/02/2022	29 - 02PV01	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,50 X 1,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 1,50 EM 10/02/2022 POR PABLO - ARECILDO	2,25
3159233	09/02/2022	26 - 02AG08	REFAZER ASFALTOS QUE SOLTARAM EM DOIS PONTOS, NA ESQUINA, NO MEIO DA RUA AONDE FOI FEITA UMA LIGAÇÃO. ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS À CONFERIR.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 0,50 DATA: 09/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	1,5
3158231	08/02/2022	26 - 02AG08	MEDIDAS 5,00 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 5,00 X 1,50 DATA: 07/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	7,5
3160165	10/02/2022	26 - 02AG08	ÁGUA, PERDAS, MEDIDAS: 4,00 X 0,50 E 1,30 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,00 X 0,50 / 1,30 X 0,90 DATA: 10/02/2022 POR DANIEL, MARCO E THIAGO.	3,17
3157939	09/02/2022	26 - 02AG08	FAVOR REPOR PAVIMENTO EQUIPE DORACI / JOHNATAN ... 0,60 X 0,60 ...	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,60 X 0,60 DATA: 09/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	0,36
				TOTAL:	59,46































Nova Friburgo, 03 de novembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 09/10/2022 a 15/10/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 09/10/2022 a 15/10/2022.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora


C-621/2022-SUP
DSSM-td

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS				BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
				PERÍODO DE MEDIÇÃO: 09/10/2022 a 15/10/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3311364	14/10/2022	15 - 03PV02	RAUL RIVAIL GRIPP, 28605575	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 4,00 X 1,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,00 X 1,00 EM 14/10/2022 POR EDIVANDRO - WESLEY - JOÃO	00:52:00	4,00	0,08
3310150	14/10/2022	15 - 03PV02	MARIO ANTONIO THURLER, 28621137	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 EM 14/10/2022 POR EDIVANDRO - WESLEY - JOÃO	00:45:00	1,00	0,02
3309903	11/10/2022	29 - 02PV01	CONSTANCIA HERINGER, 28616117	MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,60 X 0,70 / 6,00 X 0,20 DATA: 11/10/2022 POR ARECILDO, PABLO E GILSON.	02:15:00	2,32	0,02
3309818	11/10/2022	16 - 03PV03	STA RITA DE CASSIA, 26, 28613790	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,80 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,80 DATA: 11/10/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:20:00	0,64	0,03
3309806	11/10/2022	16 - 03PV03	RUTH ABREU DE FREITAS, 158, 28605430	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 DATA: 11/10/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:16:00	1,00	0,06
3309127	12/10/2022	29 - 02PV01	XINGU, 203, 28620310	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 2,70 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,70 X 1,50 DATA: 12/10/2022 POR ARECILDO, ALEXANDRO E THIAGO.	00:50:00	4,05	0,08
3309000	13/10/2022	15 - 03PV02	THEOPILO ZARIFE, 28605708	ASFALTO AFUNDOU, MEDIDAS A CONFERIR.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,10 X 1,60 EM 13/10/2022 POR EDIVANDRO - WESLEY - JOÃO	01:54:00	3,36	0,03
3307934	14/10/2022	17 - 03PV04	BRASILIANA DA ROSA TEIXEIRA, 31, 28633327	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,10 X 0,80 /3M X 0,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 1,00 X 1,20 EM 14/10/2022 POR JOSÉ HELENO - GILSON - PABLO	01:20:00	1,20	0,02
3306328	12/10/2022	29 - 02PV01	RUA MANOEL LOURENÇO SOBRINHO, 54, 28623440	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 1,50 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 0,60 DATA: 12/10/2022 POR ARECILDO, ALEXANDRO E THIAGO.	00:20:00	0,90	0,05
3306318	11/10/2022	16 - 03PV03	STA MARTHA, 56, 28633080	MANUTENÇÃO ESGOTOMEDIDAS:2,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,00 DATA: 11/10/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:15:00	2,00	0,13
3305720	12/10/2022	29 - 02PV01	SAO PAULO, 68, 28623200	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,30 X 1,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,30 X 1,20 DATA: 12/10/2022 POR ARECILDO, ALEXANDRO E THIAGO.	00:43:00	1,56	0,04
3305664	13/10/2022	16 - 03PV03	REGINA AZEVEDO, 28621112	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,00 X 1,50 E 1,60 X 1,10	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,50 X 2,50 EM 13/10/2022 POR MARCO - RONEY - ALEXANDRO	01:05:00	11,25	0,17
3304083	14/10/2022	15 - 03PV02	AURORA SILVEIRA, 1001, 28621220	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,20 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,40 X 1,20 EM 14/10/2022 POR EDIVANDRO - WESLEY - JOÃO	00:10:00	1,68	0,17

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3303993	12/10/2022	29 - 02PV01	SAO ROQUE, 158, 28623370	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 4,50 X 2,00 COM CORTE - NECESSÁRIO SINALIZAR LOCAL DEIXANDO ESPAÇO PARA ESTACIONAR O CAMINHÃO.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,00 X 2,00 DATA: 12/10/2022 POR ARECILDO, ALEXANDRO E THIAGO.	03:30:00	8,00	0,04
3303977	14/10/2022	17 - 03PV04	BRASILIANA DA ROSA TEIXEIRA, 33, 28633327	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 3,00 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,00 X 0,90 EM 14/10/2022 POR JOSÉ HELENO - GILSON - PABLO	02:20:00	2,70	0,02
						16:55:00	45,66	0,95





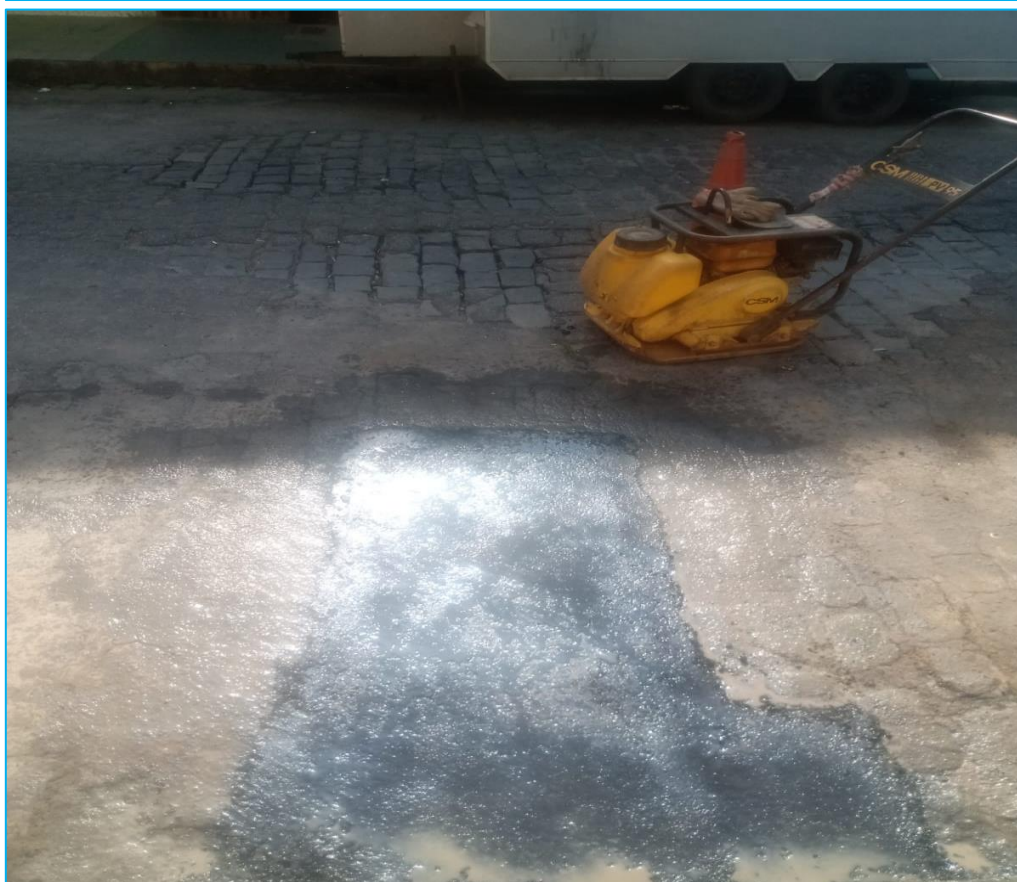















Nova Friburgo, 19 de julho de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 10/07/2022 a 16/07/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 10/07 a 16/07/2022.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-411/2022-SUP
DSSM-td

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/07/2022 a 16/07/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3253395	15/07/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS APROXIMADAS: 2,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 1,00 REGISTRADO EM FOTO EM 15/07/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:52:00	2,00	0,04
3251713	11/07/2022	16 - 03PV03	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,20 X 0,80 X 0,30 ... 2,80 X 0,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 0,80 X 0,30 E 2,80 X 0,40 REGISTRADO EM FOTO EM 11/07/2022	01:05:00	1,41	0,02
3255618	14/07/2022	16 - 03PV03	FAVOR REPOR PAVIMENTO EQUIPE RAFAEL / PAULO ... 2,10 X 1,00 ...	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,10 X 1,00 REGISTRADO EM FOTO EM 14/07/2022 POR MARCO - PABLO - ALEXANDRO	00:32:00	2,10	0,07
3252772	13/07/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO AGUA MEDIAS 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 DATA: 13/07/2022 POR MARCO, PABLO E ALEXANDRO.	00:21:00	1,00	0,05
3252808	10/07/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,50 X 1,80 E 2,50 X 1,80 E 4,50 X 0,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,50 X 1,80 / 2,50 X 1,80 / 4,50 X 0,30 DATA: 10/07/2022 POR LEANDRO, MARCELO E MAIQUE.	00:35:00	10,35	0,30
3254267	14/07/2022	13 - 03PV01	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,00 X 1,20 E 1,50 X 1,00 E 1,20 X 0,40 E 1,30 X 0,80 E 4,10 X 0,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,30 X 0,80 + 1,60 X 0,60 + 2,60 X 0,50 + 1,70 X 1,20 E 1,20 X 1,10 REGISTRADO EM FOTO EM 14/07/2022	00:20:00	6,66	0,33
3254768	14/07/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,80 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,50 X 1,50 REGISTRADO EM FOTO EM 14/07/2022 POR EDVANDRO - JAQUES - JOÃO	01:18:00	5,25	0,07
3252307	11/07/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,20 REGISTRADO EM FOTO EM 11/07/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	02:40:00	1,00	0,01
3251787	14/07/2022	13 - 03PV01	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,60 X 0,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,60 X 0,60 REGISTRADO EM FOTO EM 14/07/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	00:50:00	0,96	0,02
3248450	14/07/2022	16 - 03PV03	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 7,00 X 0,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO E RETIRADO 4 CARRINHOS DE ENTULHO. MEDIDAS: 7,00 X 0,70 EM 14/07/2022 POR MARCO - PABLO - ALEXANDRO	03:10:00	4,90	0,03
3253348	11/07/2022	29 - 02PV01	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS: 3,20 X 0,40	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,20 X 0,40. EM 11/07/2022. POR ARECIDLO/RONIMAR/JOÃO.	00:25:00	1,28	0,05
3254272	13/07/2022	15 - 03PV02	ESGOTO, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE SOLTOU, MEDIDAS: 8M X 3M - NECESSÁRIO RETROESCAVADEIRA	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS: 8,00 X 3,00. EM 13/07/22 POR EDIVANDRO/RONIMAR/JOAO.	01:35:00	24,00	0,25
3249884	11/07/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 3,00 X 1,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,20 X 1,70 E 2,10 X 1,60 REGISTRADO EM FOTO EM 11/07/2022	02:40:00	8,80	0,06
3255030	14/07/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO MEDIDAS 1,80 X 0,40 E 3,00 X 1,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,80 X 0,40 E 3,00 X 1,50 REGISTRADO EM FOTO EM 14/07/2022	01:20:00	5,22	0,07

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3252791	14/07/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,00 X 0,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 0,70 REGISTRADO EM FOTO EM 14/07/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	01:15:00	1,40	0,02
3253555	13/07/2022	17 - 03PV04	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 0,90 X 0,90 ... 2,00 X 0,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,90 X 0,90 E 2,00 X 0,30 REGISTRADO EM FOTO EM 13/07/2022	01:45:00	1,41	0,01
3253352	14/07/2022	15 - 03PV02	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS: 0,50 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 0,50 E 1,00 X 0,70 REGISTRADO EM FOTO EM 14/07/2022	01:11:00	1,20	0,02
3251748	12/07/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 0,80 X 0,50 RETIRAR 1 BALDE DE EN	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,85 X 0,60 DATA: 12/07/2022 POR LEANDRO, MARCELO E MAIQUE.	00:35:00	0,51	0,01
3254037	12/07/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,90 X 0,80 DATA: 12/07/2022 POR LEANDRO, MARCELO E MAIQUE.	00:35:00	0,72	0,02
3251581	13/07/2022	16 - 03PV03	ÁGUA, PERDAS, MEDIDAS: 1,60 X 1,00 ... 1,20 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,60 X 1,00 / 1,20 X 1,00 DATA: 13/07/2022 POR MARCO, PABLO E ALEXANDRO.	00:41:00	2,80	0,07
3255029	14/07/2022	17 - 03PV04	ÁGUA, MANUTENÇÃO, PRANCHAR ASFALTO	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 6,20 X 2,60 REGISTRADO EM FOTO EM 14/07/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:45:00	16,12	0,36
3253592	13/07/2022	17 - 03PV04	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,00 X 1,00 ... 1,30 X 0,10	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 E 1,30 X 0,10 EM 13/07/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:02:00	1,13	0,02
3249810	12/07/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 5,00 X 1,10	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 5,00 X 1,10 DATA: 12/07/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E PABLO.	01:40:00	5,50	0,06
3249652	15/07/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 9,40 X 1,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 10,50 X 2,30 REGISTRADO EM FOTO EM 15/07/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	04:38:00	24,15	0,09
3255621	14/07/2022	16 - 03PV03	FAVOR REPOR PAVIMENTO EQUIPE RAFAEL / PAULO ... 1,00 X 1,00 ... 3,00 X 0,30 ...	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO E RETIRADO 3 CARRINHOS DE ENTULHO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 E 3,00 X 0,30 REGISTRADO EM FOTO EM 14/07/2022	01:05:00	1,90	0,03
3252799	11/07/2022	205 - 02PV02	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,80 X 1,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,80 X 1,80 REGISTRADO EM FOTO EM 11/07/2022 POR EFABIANO - JAQUES	02:16:00	3,24	0,02
TOTAL:					35:11:00	135,01	2,07


























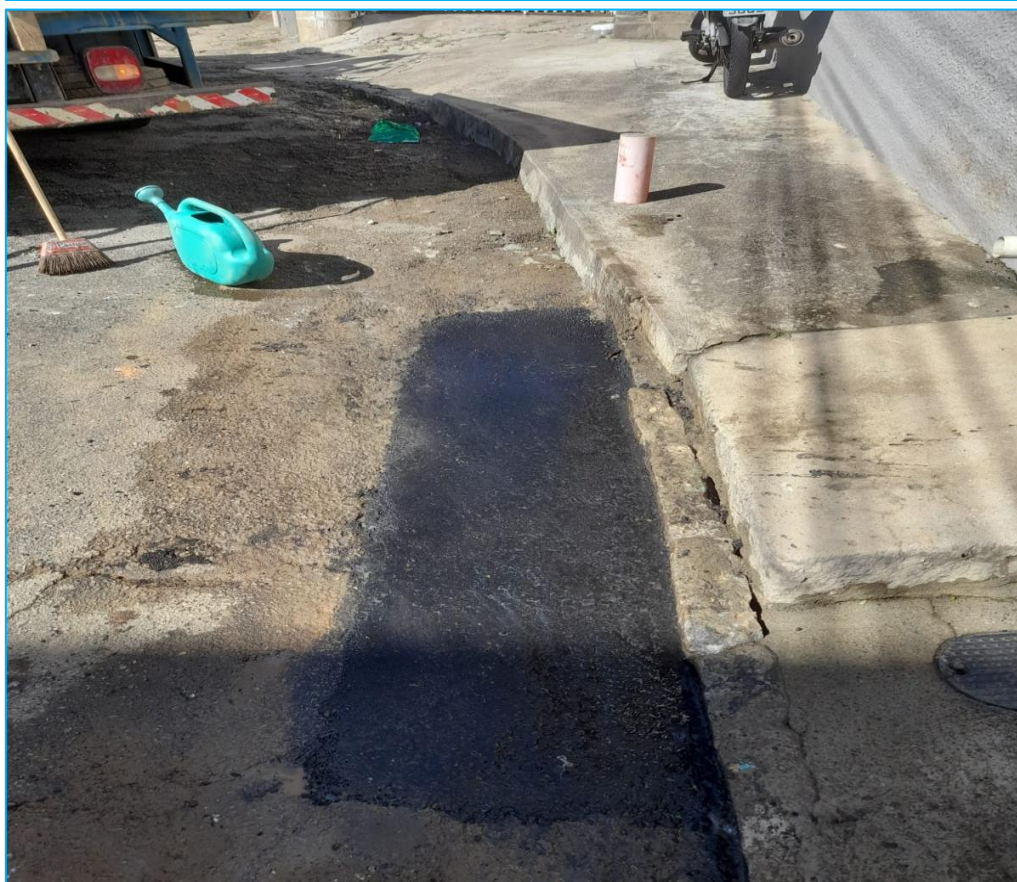



















RUA THIERES PERISSÉ
DATA: 15/07/2022

Nova Friburgo, 26 de setembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 11/09/2022 a 17/09/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 11/09/2022 a 17/09/2022.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-562/2022-SUP
DSSM-td

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS				BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
MANUTENÇÃO & SERVIÇOS				PERÍODO DE MEDIÇÃO: 11/09/2022 a 17/09/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3293034	15/09/2022	16 - 03PV03	BRASILIANA DA ROSA TEIXEIRA, 14, 28633327	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,10 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,10 X 1,00 EM 15/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:45:00	1,10	0,02
3293008	15/09/2022	15 - 03PV02	ANTONIO BANJAR, 23, 28614280	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS À CONFERIR.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO: 0,50 X 0,50 EM 15/09/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	01:27:00	0,25	0,00
3292748	15/09/2022	17 - 03PV04	AVELINO FROTTE, 80, 28621390	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 EM 15/09/2022 POR ADÃO - GILSON - SEBASTIÃO	01:20:00	1,00	0,01
3291970	14/09/2022	17 - 03PV04	ACRE, 05, 28623340	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,60 X 1,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,60 X 1,20 DATA: 14/09/2022 POR ADÃO, GILSON E SEBASTIÃO.	00:20:00	1,92	0,10
3291727	14/09/2022	17 - 03PV04	ACRE, 05, 28623340	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,40 X 1,30 X 0,40	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,70 X 1,50 DATA: 14/09/2022 POR ADÃO, GILSON E SEBASTIÃO.	00:25:00	2,55	0,10
3291640	13/09/2022	16 - 03PV03	SALVADOR DA ROSA CANTO, 22, 28605730	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 1,00 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 0,80 EM 13/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:30:00	0,80	0,03
3291130	14/09/2022	16 - 03PV03	ESTRADA LEOPOLDINA PINEL GARCIA, 0, 28633550	REPOSIÇÃO ASFALTO, MEDIDAS: 2,00 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 0,90 DATA: 14/09/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:42:00	1,80	0,04
3291058	13/09/2022	17 - 03PV04	BAHIA, 20, 28623260	MANUTENÇÃO ESGOTO, MEDIDAS: 1,00 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 1,00 X 0,50 EM 13/09/2022 POR ADÃO - GILSON - PABLO	00:05:00	0,50	0,10
3291036	12/09/2022	16 - 03PV03	SETE DE SETEMBRO LUMIAR, 484, 28616115	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 0,90 X 0,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,90 X 0,70 EM 12/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:40:00	0,63	0,02
3290399	14/09/2022	16 - 03PV03	RUA MIGUEL CORREA DA SILVA, 16, 28633590	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 3,80 X 1,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,50 X 2,00 DATA: 14/09/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:55:00	9,00	0,16
3289799	15/09/2022	17 - 03PV04	SABINA ABREU AGUILERA, 2230, 28625805	INVESTIMENTO ÁGUA, MEDIDAS: 2,00 X 0,40 E 3 CARRINHOS DE ENTULHO.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 0,40 EM 15/09/2022 POR ADÃO - GILSON - SEBASTIÃO	01:25:00	0,80	0,01
3289795	16/09/2022	17 - 03PV04	PALMERIN TRANIN, 26, 28613670	INVESTIMENTO ÁGUA, MEDIDAS: 1,70 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,70 X 0,50 EM 16/09/2022 POR ADÃO - GILSON - SEBASTIÃO	01:20:00	0,85	0,01

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3289642	12/09/2022	17 - 03PV04	STA MARTHA, 78, 28633080	INVESTIMENTO ÁGUA, MEDIDAS: 5,00 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 5,00 X 0,50 EM 12/09/2022 POR ADÃO - JACSON - GILSON	02:14:00	2,50	0,02
3288996	16/09/2022	15 - 03PV02	ALTAMIRO MARTINS OURIQUES, 17, 28633070	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 0,90 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 2,00 X 1,50 EM 16/09/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	01:22:00	3,00	0,04
3288993	16/09/2022	17 - 03PV04	FELIPE CAMARÃO, 1311, 28615080	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 1,40 X 1,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,40 X 1,40 EM 16/09/2022 POR ADÃO - GILSON - SEBASTIÃO	00:45:00	1,96	0,04
3288941	15/09/2022	16 - 03PV03	RUA SANGLARD, 90, 28635563	REPOR ASFALTO QUE AFUNDOU MEDIDAS: 1,20 X 1,00. - CORRIGIR OS OUTROS ASFALTOS EM VOLTA DA TAMPA, AONDE SOLTARAM.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 EM 15/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO	01:15:00	1,20	0,02
3288417	15/09/2022	16 - 03PV03	SANGLARD, 90, 28635563	MEDIDAS A CONFERIR	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 5,00 X 1,50 EM 15/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	01:25:00	7,50	0,09
3287821	15/09/2022	17 - 03PV04	FOLLY, 24, 28623780	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 0,90 X 0,40	NÃO ERA ASFALTO, TRATAVA-SE DE UMA TAMPA DE CONCRETO QUE TIVERAM QUE QUEBRAR E ALGUNS PARALELOS OBS: FOTOS DA ORDEM DE SERVIÇO ANTERIOR	00:50:00	0,36	0,01
3286912	13/09/2022	17 - 03PV04	PR MEYER, 2, 28625116	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,50 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 1,00 EM 13/09/2022 POR ADÃO - GILSON - PABLO	01:20:00	1,50	0,02
					TOTAL:	19:05:00	39,22	0,84



















Nova Friburgo, 29 de novembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 13/11/2022 a 19/11/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 13/11/2022 a 19/11/2022.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-673/2022-SUP
DSSM-td

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 13/11/2022 a 19/11/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3329505	14/11/2022	205 - 02PV02	BELA VISTA	CONS JULIUS ARP. BELA VISTA, 145, 28623000	SENHOR LUIZ FERNANDO AZEVEDO DE CPF 729.423.477-91 INFORMA A ABERTURA DE UM BURACO NA REDE PLUVIAL NECESSITANDO DE REPAROS URGENTES, POIS SE LOCALIZAR EM VIA E PRESSA DE MUITO MOVIMENTO DE VEÍCULOS. AV. CONS. JULIUS ARP. EM FRENTE AO N 145 (EM FRENTE AO	SERVIÇO EXECUTADO. DATA: 14/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:26:00		0,00
3323313	14/11/2022	13 - 03PV01	VARGINHA	DR ALBERTO PORTO DA SILVEIRA, 29, 28616368	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO AFUNDADO, MEDIDAS: 4,00 X 0,20 E 0,80 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 7,40 X 0,20 / 2,10 X 0,70 / 1,00 X 0,80 DATA: 14/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	01:25:00	3,75	0,04
3330265	14/11/2022	15 - 03PV02	CAMPO DO COELHO	ROGERIO STUTZ PEREIRA, 28630596	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,10 X 1,10	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,10 X 1,10 DATA: 14/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:50:00	1,21	0,02
3328932	15/11/2022	16 - 03PV03	PRADO	RAUL MELHADO, 58, 28635120	INVESTIMENTO ÁGUA, MEDIDAS: 2,70 X 0,90 E 4 CARRINHOS DE ENTULHO.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,70 X 0,90 E 4 CARRINHOS DE ENTULHO. DATA: 14/11/2022 POR EDIVANDRO, RONEY E ALEXANDRO.	00:39:00	2,43	0,06
3323353	16/11/2022	15 - 03PV02	JARDIM DO ÉDEM	FELISBERTO DE CARVALHO, 79, 28605550	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,60 X 1,00 DATA: 16/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:39:00	1,60	0,04
3331101	16/11/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 138, 28634060	MEDIDAS A CONFERIR.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,60 X 1,60 DATA: 16/11/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	00:25:00	4,16	0,17
3324809	16/11/2022	15 - 03PV02	JARDIM DO ÉDEM	WEBERT SCHUABB, 28605550	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,20 X 1,00 RETIRAR 1 CARRINHO DE ENTULHO	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 DATA: 16/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:46:00	1,20	0,03
3330187	16/11/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 137, 28634060	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,50 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,50 / 1,30 X 0,70 DATA: 16/11/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	00:40:00	3,16	0,08
3327627	16/11/2022	16 - 03PV03	CONSELHEIRO PAULINO	MANOEL ELIAS PERROUD, 102, 28634000	PERDAS ÁGUA, MEDIDAS: 2,50 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,50 X 1,00 DATA: 16/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	01:52:00	2,50	0,02
3330353	16/11/2022	16 - 03PV03	NILO MARTINS	ALBERTO MARTIRES ASTH, 246, 28630485	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,10 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,20 X 1,20 DATA: 16/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	01:07:00	2,64	0,04
3330250	17/11/2022	15 - 03PV02	GRANJA DO CÉU	REGINA AZEVEDO, 28621112	REFAZER ASFALTO QUE NÃO FOI CORTADO, ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,40 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,60 DATA: 17/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:55:00	3,20	0,06
3328232	17/11/2022	17 - 03PV04	SÃO GERALDO	RUA MANOEL BORGES DE BORBA, 3, 28630333	INVESTIMENTO ESGOTO MEDIDAS 4,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,00 X 1,00 DATA: 17/11/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	01:25:00	4,00	0,05
3328809	17/11/2022	15 - 03PV02	OLARIA	JULIO ANTONIO THURLER, 211, 28620000	ESGOTO, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE AFUNDOU, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,60 DATA: 17/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:34:00	3,20	0,09

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3332212	17/11/2022	17 - 03PV04	TIO DONGO	RUA JANDYRA B PERLINGEIROTIODONGO, 11, 28630320	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 0,70 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,70 X 0,90 DATA: 17/11/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	00:35:00	0,63	0,02
3332291	17/11/2022	17 - 03PV04	NOVA ESPERANÇA	RICARDO SANTOS, 132, 28630394	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,30 X 1,10	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,30 X 1,10 DATA: 17/11/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	00:15:00	1,43	0,10
3330334	18/11/2022	15 - 03PV02	YPU	CEL ZAMITH, 174, 28613560	MANUTENÇÃO ESGOTO, MEDIDAS: 1,50 X 1,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,70 DATA: 19/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:32:00	2,55	0,08
3328426	18/11/2022	17 - 03PV04	CAMPO DO COELHO	LUIS GONZAGA DE SOUZA, 13, 28630523	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,10 X 1,00 E 1,30 X 1,00 E 1,30 X 0,60 E 1,00 X 0,80 E 1,00 X 0,40	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,10 X 1,00 / 1,30 X 1,00 / 1,30 X 0,60 / 1,00 X 0,80 / 1,00 X 0,40 DATA: 18/11/2022 POR ADÃO, MARCELO E LUIZ GUILHERME.	02:54:00	5,38	0,03
3332824	18/11/2022	16 - 03PV03	CONSELHEIRO PAULINO	RUA NATIVIDADE CÂNDIDA DA SILVA, 3, 28633470	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 DATA: 18/11/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:25:00	1,00	0,04
3324598	18/11/2022	17 - 03PV04	CÓRREGO DANTAS	ESTRADA LUIZ CARLOS VERONESI FERREIRA, 0, 28630308	ÁGUA, INVESTIMENTO, REPOR ASFALTO, MEDIDAS À CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. DATA: 18/11/2022 POR ADÃO, MARCELO E LUIZ GUILHERME.	01:15:00		0,00
3333644	19/11/2022	29 - 02PV01	CALIFÓRNIA	ANTONIO SUAID, 28633750	MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,40 X 2,00 DATA: 19/11/2022 POR JOSÉ HELENO, JOSUÉ E RONEY.	00:50:00	2,80	0,06
3326141	19/11/2022	29 - 02PV01	CALIFÓRNIA	ANTONIO SUAID, 42, 28633750	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2,80 X 0,80/1,90 X 1,40	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,80 X 0,80 / 1,90 X 1,40 DATA: 19/11/2022 POR JOSÉ HELENO, JOSUÉ E RONEY.	01:30:00	4,90	0,05
3326740	19/11/2022	29 - 02PV01	CONSELHEIRO PAULINO	NATIVIDADE CÂNDIDA DA SILVA, 97, 28633470	ENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE SOLTOU E AFUNDOU, MEDID	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,30 X 2,00 DATA: 19/11/2022 POR JOSÉ HELENO, JOSUÉ E RONEY.	01:03:00	4,60	0,07
3326746	19/11/2022	29 - 02PV01	FAZENDA DA LAGE	LEOPOLDINA PINEL GARCIA, 437, 28633550	ÁGUA, MANUTENÇÃO, NIVELAR ASFALTO AFUNDADO, MEDIDAS: 1,40 X 1,20 E 3,80 X 0,15	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,40 X 1,20 / 3,80 X 0,15 DATA: 19/11/2022 POR JOSÉ HELENO, JOSUÉ E RONEY.	00:40:00	2,25	0,06
3328355	19/11/2022	29 - 02PV01	FLORESTA	RUA EVANGELISTA M SILVA FLORESTA, 155, 28633620	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 3,00 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 0,50 DATA: 19/11/2022 POR JOSÉ HELENO, JOSUÉ E RONEY.	00:33:00	1,50	0,05
							22:15:00	60,09	1,25































Nova Friburgo, 26 de agosto de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório de Asfalto – 14/08/2022 a 20/08/2022.**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 14/08 a 20/08/2022.

Respeitosamente,



Engª Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-513/2022-SUP
DSSM-Inpc

Nova Friburgo, 24 de fevereiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro


Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 14/02/2022 a 18/02/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 14/02 a 18/02/2022.

Respeitosamente,



Engº João Henrique Tebyriça de Sá
Diretor

C-122/2022-SUP
JHTS-td

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/02/2022 a 18/02/2022		
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Medidas
3161750	14/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 2,00 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,50 DATA: 14/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	3
3159006	14/02/2022	26 - 02AG08	REPOR ASFALTO 1,60 X 1,10	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,70 X 1,10' DATA: 14/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	1,87
3163296	14/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 0,60 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,60 X 0,60 DATA: 14/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	0,36
3161091	14/02/2022	26 - 02AG08	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 2,00 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 0,80 DATA: 14/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	1,6
3163454	14/02/2022	26 - 02AG08	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 2,80 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,80 X 0,50 DATA: 14/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	1,4
3159332	15/02/2022	26 - 02AG08	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,80 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,80 X 1,50 DATA: 14/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	2,7
3157638	15/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,30 X 0,70 E 2,50 X 1,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,30 X 0,70 / 2,50 X 1,60 DATA: 15/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	5,61
3163530	15/02/2022	26 - 02AG08	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 2,00 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 0,50 DATA: 15/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	1
3163501	15/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,80 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,80 DATA: 15/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	0,64
3164719	15/02/2022	26 - 02AG08	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,30 X 1,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,30 X 1,30 DATA: 15/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E MARCO.	2,99
3164806	16/02/2022	26 - 02AG08	ÁGUA, MANUTENÇÃO, FAZER UMA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NA LINHA AONDE PASSOU A REDE DE DISTRIBUIÇÃO E NOS BURACOS DE RESPONSABILIDADE DA CANF.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,00 X 0,70 X 0,50 X 0,50 REGISTRADO EM FOTOS EM 16/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - PABLO	2,35
3164805	16/02/2022	26 - 02AG08	ÁGUA, MANUTENÇÃO, FAZER UMA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NA LINHA AONDE PASSOU A REDE DE DISTRIBUIÇÃO E NOS BURACOS DE RESPONSABILIDADE DA CANF.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 5,00 X 1,10 X 0,70 REGISTRADO EM FOTO EM 16/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - PABLO	3,85
3165390	16/02/2022	25 - 02AG07	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 0,60 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,60 X 0,60 DATA: 16/02/2022 POR FABRÍCIO E ELISMAR.	0,36
3164807	16/02/2022	26 - 02AG08	ÁGUA, MANUTENÇÃO, FAZER UMA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NA LINHA AONDE PASSOU A REDE DE DISTRIBUIÇÃO E NOS BURACOS DE RESPONSABILIDADE DA CANF.	TAPADO O BURACO NA LINHA ONDE PASSOU A LINHA DE DISTRIBUIÇÃO. REGISTRADO EM FOTO EM 16/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - PABLO	
3164246	17/02/2022	26 - 02AG08	MEDIDAS 1,00 X 0,70 E 1,00 X 0,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO NO LOCAL. MEDIDAS: 1,00 X 0,70 E 1,00 X 0,70 REGISTRADO EM FOTO EM 17/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - PABLO	1,4

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Medidas
3163305	17/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,60 X 1,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,60 X 1,30 EM 17/02/2022 REGISTRADO EM FOTO POR DANIEL - THIAGO - MARCO	3,38
3163560	17/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,90 X 0,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS: 0,90 X 0,70 REGISTRADO EM FOTO POR DANIEL - THIAGO - PABLO	0,63
3164605	17/02/2022	26 - 02AG08	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE SOLTOU, EM DOIS PONTOS, MEDIDAS: 0,60 X 0,60 E 2,50 X 1,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS: 0,60 X 0,60 E 2,50 X 1,50 REGISTRADO EM FOTO EM 17/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - PABLO	4,11
3164796	18/02/2022	26 - 02AG08	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REPOR ASFALTO QUE SOLTOU, MEDIDAS: 1,00 X 1,00 E 1,10 X 1,10 E 2,00 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,30 / 1,80 X 0,90 / 1,70 X 1,30 / 0,90 X 0,60 DATA: 18/02/2022 POR DANIEL, PABLO E WIVERSON.	6,97
3164716	18/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,90 X 0,70 E 0,60 X 0,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,90 X 0,70 / 0,60 X 0,20 DATA: 18/02/2022 POR DANIEL, PABLO E WIVERSON.	0,75
3166207	18/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS; 1,20 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 0,90 DATA: 18/02/2022 POR DANIEL, PABLO E WIVERSON.	1,08
				TOTAL:	46,05

































Nova Friburgo, 22 de maio de 2025.

Ilmo. Sr. Rodrigo de Lima Carvalho
Subsecretário de Serviços Concedidos
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo - Secretaria de Governo
Av. Alberto Braune, 225 - Centro - Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório de Serviços de Recuperação de Vias - Abril**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes ao período de 15/04/2025 a 30/04/2025.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-331/2025
DSSM-td

 Águas de Nova Friburgo Grupo Águas do Brasil					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 15/04/2025 a 30/04/2025				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M² por minuto
CANF/GS072527	15/04/2025	SED-03GSO-RP01	CAMPO DO COELHO	RUA FRANCISCO NEVES DE A FILHO	pavimento asfalto frio medida 1.00x1.00 número 51	recomposição de ruas asfalto medidas 1.00x1.00x0.07 asfalto base saco 2 pavimil saco 1	7	1,00	0,01
CANF/GS072157	15/04/2025	SED-03GSO-RP02	SÃO GERALDO	RUA DOUTOR FELÍCIANO BENEDITO DA COSTA	refazer asfalto em três pontos, fotos em anexo. NECESSÁRIO PARE E SIGA.	EXECUTADO MEDIDAS:5,00 X 1,50 BASE:6 PAVIMIL:6	16	7,50	0,02
CANF/GS071236	15/04/2025	SED-03GSO-RP01	CAMPO DO COELHO	RUA ROGERIO STUTZ PEREIRA	favor repor asfalto. medida: 1,0 x 0,70	recomposição de ruas asfalto medidas conferidas no local 1.50x1.00x0.07 asfalto base saco 2 pavimil saco 2 retirada de 4 baldes de entulho	43	1,50	0,01
CANF/GS070229	15/04/2025	SED-03GSO-RP01	CAMPO DO COELHO	RUA ROGÉRIO STUTZ PEREIRA	asfalto 3.00x0.40	recomposição de ruas asfalto medidas 3.00x0.20x0.07 asfalto pavimil saco 2	34	0,60	0,01
CANF/GS070057	15/04/2025	SED-03GSO-RP05	SÃO GERALDO	TRAVESSA JOSE COPERTINO NOGUEIRA	repor asfalto de 1.00x1.00	asfalto base saco 5 asfalto acabamento saco 3	45	1,00	0,00
CANF/GS071882	15/04/2025	SED-03GSO-RP01	CAMPO DO COELHO	RUA JOSÉ WANDIR CONDACK	FAVOR REPOR PARALELO. MEDIDA: 3,0 X 0,30.	recomposição de ruas asfalto medidas conferidas no local 1.60x1.30x0.20x0.40x0.07 asfalto base saco 10 pavimil 5	84	3,36	0,01
CANF/GS072601	15/04/2025	SED-03GSO-RP02	BOA VENTURA	ESTRADA EUGENIO GRIPP	asfalto 1.00x0.50	asfalto base 3 asfalto arremate 2	33	0,50	0,01
CANF/GS071731	15/04/2025	SED-03GSO-RP03	CÔNEGO	RUA WENCESLAU BRAZ	REPOR ASFALTO - MEDIDAS:3,50 X 0,90/ 2,50 X 1,00/2,00 X 0,90 EQUIPE LUCAS	executado. medidas:3,50 x 0,90 / 2,50 x 1,00 / 4,00 x 0,90 base:22 pavimil:15	80	9,25	0,02
CANF/GS0609115	16/04/2025	SED-03GSO-RP02	CORDOEIRA	RUA HUMBERTO GUARIGLIA	pavimento asfalto frio medida 1.00x0.80 número 05		13	0,80	0,00
CANF/GS071387	16/04/2025	SED-03GSO-RP02	CORDOEIRA	RUA PREF AMANCIO AZEVEDO CORDOEIRA	repor asfalto de 0.60x0.60		23	0,36	0,00
CANF/GS067708	16/04/2025	SED-03GSO-RP05	CONSELHEIRO PAULINO	RUA JOAO ALBERTO KNUST	reposição de asfalto 1.50 1.00 EM FRENTE AO NUMERO 571	recomposição de rua asfalto medidas conferidas no local 2.50x1.20x0.05 retirada de 3 carrinhos de entulho	50	3,00	0,01
CANF/GS072806	16/04/2025	SED-03GSO-RP02	CAMPO DO COELHO	RUA AGUA VIVA	REPOR ASFALTO - MEDIDAS:3,50 X 2,00		15	7,00	0,02
CANF/GS071981	16/04/2025	SED-03GSO-RP02	CAMPO DO COELHO	RUA JOSÉ CESAR TEIXEIRA	FAVOR REPOR ASFALTO. MEDIDA: 3,0 X 0,8		46	0,80	0,00
CANF/GS072402	16/04/2025	SED-03GSO-RP05	PERISSÊ	RUA SAO JOSE PERISSÊ	asfalto 1.50 040	recomposição de rua asfalto medidas conferidas no local 2.0x0.40x0.05 local exato do serviço, número 80 retirada de 2 carrinhos de entulho	25	0,80	0,00
CANF/GS071721	16/04/2025	SED-03GSO-RP02	CAMPO DO COELHO	RUA ADEMAR BREDER	FAVOR REPOR ASFALTO. MEDIDA: 5,0 X 0,4		12	2,00	0,01
CANF/GS072844	16/04/2025	SED-03GSO-RP03	BRAUNES	RUA VISCONDE DE ITABORAI	REPOR ASFALTO - MEDIDAS:1,50 X 1,30 EQUIPE Jolison	medidas: 1.50x1.0x0.5	18	1,50	0,00
CANF/GS071826	17/04/2025	SED-03GSO-RP03	BRAUNES	RUA FROSSARD	reposição de asfalto 2,00x2,00	15 sacos de Cbpav 8 sacos de pavimil repor asfalto 3.00x2.00	91	6,00	0,01
CANF/GS072840	17/04/2025	SED-03GSO-RP01	SÃO CRISTÓVÃO	RUA DIOGO FRANCISCO COMBAT	REPOR ASFALTO - MEDIDAS:1,20 X 1,00 EQUIPE LUCAS - NECESSÁRIO SER A PRIMEIRA O.5. DO DIA - OBS.: LOCAL FICOU SINALIZADO COM AS PLACAS DA EQUIPE DO MANCON, FAVOR RECOLHER E COLOCAR NO CAMINHÃO DO MANCON.	recomposição de ruas asfalto medidas conferidas no local 2.80x2.50x0.07 asfalto base 17 pavimil saco 8	154	7,00	0,15
CANF/GS071752	17/04/2025	SED-03GSO-RP03	BRAUNES	RUA MANOEL ANTUNES NOGUEIRA	Asfalto. 1.50x1.00.	6 sacos de Cbpav 4 sacos de pavimil repor asfalto 1.50x1.00	57	1,50	0,00
CANF/GS072970	19/04/2025	SED-03GSO-RP05	LAZARETO	RUA BENJAMIN CONSTANT LAZARETO	FAVOR REPOR ASFALTO. MEDIDA: 0,30 X 0,40		25	0,12	0,00
CANF/GS071101	19/04/2025	SED-03GSO-RP05	LAZARETO	RUA AUGUSTO DE SOUZA FREITAS	REFAZER ASFALTO QUE AFUNDOU, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,50 X 1,50. FOTO EM ANEXO.	EXECUTADO. MEDIDAS:1,50 X 1,50 PAVIMIL:3	3	2,25	0,03
CANF/GS071972	19/04/2025	SED-03GSO-RP05	JARDINLÂNDIA	RUA GRACILIANO RAMOS	FAVOR REPOR ASFALTO. MEDIDA: 1,0 X 1,0	asfalto base saco 3 asfalto acabamento saco 2	37	1,00	0,01
CANF/GS073002	19/04/2025	SED-03GSO-RP05	JARDINLÂNDIA	RUA FRANCISCA PRIMO QUEIROZ	1,50 X 1,20/JORGE	asfalto base saco 8 asfalto acabamento saco 4	21	1,80	0,00
CANF/GS072678	20/04/2025	SED-03GSO-RP05	BELA VISTA	RUA PARA	1x1 asfalto	retirada de 2 carrinhos de entulho	49	1,00	0,00
CANF/GS073247	22/04/2025	SED-03GSO-RP05	NOVA ESPERANÇA	RUA RICARDO DOS SANTOS	asfalto 2.00x1.00	asfalto base saco 4 asfalto acabamento 2	20	2,00	0,00

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M² por minuto
CANF/GSOT3255	23/04/2025	SED-03GSO-RP01	LAGOA SECA	ESTRADA MTO JOAQUIM NAEGL LAGOA SECA	pavimento asfalto frio medida 2.00x0.50 repor 2 meio fio de 0.50x0.30 número 356	recomposição de ruas asfalto medidas conferidas no local 2.00x0.50x0.07 asfalto base saco 2 pavimil saco 1 recomposição de meio fio medidas 2.00x0.50x0.10	35	2,00	0,02
CANF/GSOT3342	23/04/2025	SED-03GSO-RP01	RIOGRANDINA	RUA CAP BENTO JOSÉ VELOSO	REPOR ASFALTO - MEDIDAS:1,90 X 1,50 EQUIPE LORIONE	recomposição de ruas asfalto medidas conferidas no local 2.20x2.00x0.07 asfalto base saco 11 pavimil saco 5	75	4,40	0,01
CANF/GSOT2788	24/04/2025	SED-03GSO-RP02	SANTA BERNADETE	RUA ZULMIRA BERÇOT DA COSTA	REPOR ASFALTO - MEDIDAS (número 22): 0,90x0,50 ; 2,0x0,20 - solicitado por fernando	medida exata 2.00x2.00x0.20 asfalto base 6 asfalto arremate 3	20	4,00	0,01
CANF/GSOT2792	24/04/2025	SED-03GSO-RP02	SANTA BERNADETE	RUA ZULMIRA BERÇOT DA COSTA	REPOR ASFALTO - MEDIDAS (número 24): 2.5x1,20 ; 1,80x1,0 ; 1,50x1,30 ; 2,0x1,30 - solicitado por fernando	medida exata 1.00x0.90x2.00x0.20	26	0,90	0,00
CANF/GSOT2986	24/04/2025	SED-03GSO-RP02	SANTA BERNADETE	RUA ZULMIRA BERÇOT DA COSTA	MEDIDAS: 1,30 X 1,0		43	1,30	0,00
CANF/GSO69267	25/04/2025	SED-03GSO-RP02	RUI SANGIARD	RUA SOL	Asfalto. 8.00 x0.60.		69	4,80	0,02
CANF/GSOT3705	26/04/2025	SED-03GSO-RP03	CÔNEGO	RUA MANOEL JOSE DA CUNHA	repor asfalto - medidas:1,00 x 1,00	repor asfalto 1.00x1.00 4 sacos de Ctpav 3 sacos de pavimil	2	1,00	0,02
CANF/GSOT3808	28/04/2025	SED-03GSO-RP05	BRAUNES	RUA CARLOS ALBERTO BRAUNE	repor asfalto - medidas:1,00 x 1,00 equipe Jose Reinaldo	asfalto base saco 6 asfalto acabamento saco 4	8	1,00	0,01
CANF/GSOT3874	28/04/2025	SED-03GSO-RP02	CATARCIONE	RUA ANDRES NOBELL SOLER	repor asfalto - medidas:1,50 x 1,50	medida exata 1.50x1.50x0.10 asfalto base 3 asfalto arremate 2	13	2,25	0,01
CANF/GSOT3539	28/04/2025	SED-03GSO-RP02	ALTO DE OLARIA	RUA FRANCISCO NICOLAU	repor asfalto - medidas:1,20 x 1,20 - equipe Valdinei	asfalto base 3 asfalto arremate 2	22	1,44	0,00
CANF/GSOT3869	28/04/2025	SED-03GSO-RP03	SANTA BERNADETE	RUA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO	1x1 asfalto	repor asfalto 1.00x1.00 6 sacos de pavimil	30	1,00	0,00
CANF/GSOT3853	28/04/2025	SED-03GSO-RP05	CHÁCARA DO PARAÍSO	RUA IZELINO MADURO	Nº 615 - 1,00 X 1,00 FÉLIX	executado. medidas:2,00 x 2,00 base:12 pavimil:7	64	4,00	0,04
CANF/GSOT2684	29/04/2025	SED-02GSO-PL01	PONTE DA SAUDE	RUA NOEMIA MOREIRA HERDY	Reposicao de asfalto medida:5,00x0,80	Medidas do serviço: 5,00x1,20x0,05 2 carrinhos de entulho.	93	6,00	0,13
CANF/GSOT2694	29/04/2025	SED-03GSO-RP05	SÃO GERALDO	RUA RIO GRANDE DE CIMA S GERALDO	asfalto 2.00x0.60	retirada de 1 carrinho de entulho	37	1,20	0,01
CANF/GSOT4034	29/04/2025	SED-03GSO-RP02	CATARCIONE	RUA ANTÔNIO BANJAR	REPOR ASFALTO 1M X 1M		33	1,00	0,02
CANF/GSOT4100	29/04/2025	SED-02GSO-ES02	CASCATINHA	RUA DOM JOAO VI - CASCATINHA	repor asfalto: 1,50 x 1,50 x 0,90/ Denilson	Asfalto executado pela equipe.	2	2,25	0,05
CANF/GSOT2277	29/04/2025	SED-03GSO-RP05	JARDIM DO ÉDEM	RUA FELISBERTO DE CARVALHO	REFAZER ASFALTO QUE SOLTOU, MEDIDAS APROXIMADAS: 6,00 X 2,00		186	12,00	0,13
CANF/GSOT2668	30/04/2025	SED-03GSO-RP03	CORDOEIRA	RUA JOSÉ DE ALENCAR	asfalto frio 3.00 x 2.00	repor asfalto 3.00x2.00 18 sacos de Ctpav 10 sacos de pavimil	103	6,00	0,02
CANF/GSOT4217	30/04/2025	SED-02GSO-ES05	BELA VISTA	RUA CEARÁ	repor asfalto 3.00x3.00	asfalto 2.00x2.00 executado	147	4,00	0,01
CANF/GSOT3627	30/04/2025	SED-03GSO-RP02	OLARIA	RUA PREFEITO GUSTAVO LIRA	REPOR ASFALTO, MEDIDAS: 1,00 X 0,60		41	0,60	0,00
CANF/GSOT2011	30/04/2025	SED-03GSO-RP02	SANTA INES	RUA OGMAR AGUILERA CAMPOS	repor afalto em três ponto que soltaram após obras, medidas aproximadas: 1,50 x 1,00 e 1,00 x 1,00 e 1,80 x 1,20	medida exata 1.50x1.50 1.80x1.20 asfalto base 6 asfalto arremate 4	2	4,66	0,10
							1759,00	114,18	0,80



(CANF/GSO72527) RUA FRANCISCO NEVES DE A FILHO - Data: 15/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO CONSERTO DE VAZAMENTO EM RAMAL ÁGUA



(CANF/GSO72157) RUA DOUTOR FELÍCIANO BENEDITO DA COSTA - Data: 15/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO71236) RUA ROGERIO STUTZ PEREIRA - Data: 15/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA C/ CAIXA PROTETORA TOTEM



(CANF/GSO70229) RUA ROGÉRIO STUTZ PEREIRA - Data: 15/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO SONDAGEM DE REDE / RAMAL ÁGUA COM ESCAVAÇÃO

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO70057) TRAVESSA JOSE COPERTINO NOGUEIRA - Data: 15/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO CONserto DE VAZAMENTO EM REDE ÁGUA



(CANF/GSO71882) RUA JOSÉ WANDIR CONDACK - Data: 15/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA C/ CAIXA PROTETORA TOTEM

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO72601) ESTRADA EUGENIO GRIPP - Data: 15/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO REPARO EM REDE ESGOTO



(CANF/GSO71731) RUA WENCESLAU BRAZ - Data: 15/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO LIGAÇÃO NOVA DE ESGOTO

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO69115) RUA HUMBERTO GUARIGLIA - Data: 16/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO REPARO EM REDE ESGOTO



(CANF/GSO71387) RUA PREF AMANCIO AZEVEDO - Data: 16/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO DESLIGAMENTO DO RAMAL DE ÁGUA A PEDIDO

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO67708) RUA JOAO ALBERTO KNUST - Data: 16/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO CONserto DE VAZAMENTO EM REDE ÁGUA



(CANF/GSO72806) RUA AGUA VIVA - Data: 16/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA C/ CAIXA PROTETORA TOTEM

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO71981) RUA JOSÉ CESAR TEIXEIRA - Data: 16/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA C/ CAIXA PROTETORA TOTEM



(CANF/GSO72402) RUA SAO JOSE - Data: 16/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO CONSERTO DE VAZAMENTO EM REDE ÁGUA

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO71721) RUA ADEMAR BREDER - Data: 16/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA C/ CAIXA PROTETORA TOTEM



(CANF/GSO72844) RUA VISCONDE DE ITABORAÍ - Data: 16/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO CONSERTO DE VAZAMENTO EM RAMAL ÁGUA

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO71826) RUA FROSSARD - Data: 17/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO REPARO EM REDE ESGOTO



(CANF/GSO72840) RUA DIOGO FRANCISCO COMBAT - Data: 17/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO CONSERTO DE VAZAMENTO EM REDE ÁGUA

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO71752) RUA MANOEL ANTUNES NOGUEIRA - Data: 17/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO REPARO EM REDE ESGOTO



(CANF/GSO72970) RUA BENJAMIN CONSTANT LAZARETO - Data: 19/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO71101) RUA AUGUSTO DE SOUZA FREITAS - Data: 19/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO DANIFICADO



(CANF/GSO71972) RUA GRACILIANO RAMOS - Data: 19/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA C/ CAIXA PROTETORA TOTEM

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO73002) RUA FRANCISCA PRIMO QUEIROZ - Data: 19/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO CONSERTO DE VAZAMENTO EM REDE ÁGUA



(CANF/GSO72678) RUA PARA - Data: 20/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO CONSERTO DE VAZAMENTO EM RAMAL ÁGUA

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO73247) RUA RICARDO DOS SANTOS - Data: 22/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA C/ CAIXA PROTETORA TOTEM



(CANF/GSO73255) ESTRADA MTO JOAQUIM NAEGLE - Data: 23/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO CONSERTO DE VAZAMENTO EM REDE ÁGUA

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO73342) RUA CAP BENTO JOSÉ VELOSO - Data: 23/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO CONSERTO DE VAZAMENTO EM REDE ÁGUA



(CANF/GSO72788) RUA ZULMIRA BERÇOT DA COSTA - Data: 24/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO72792) RUA ZULMIRA BERÇOT DA COSTA - Data: 24/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO



(CANF/GSO72986) RUA ZULMIRA BERÇOT DA COSTA - Data: 24/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO CONserto DE VAZAMENTO EM REDE ÁGUA

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO69267) RUA SOL - Data: 25/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO LIGAÇÃO NOVA DE ESGOTO



(CANF/GSO73705) RUA MANOEL JOSE DA CUNHA - Data: 26/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO NIVELAMENTO DE TAMPÃO ESGOTO

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO73808) RUA CARLOS ALBERTO BRAUNE - Data: 28/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO REPARO EM REDE ESGOTO



(CANF/GSO73874) RUA ANDRES NOBELL SOLER - Data: 28/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA C/ CAIXA PROTETORA TOTEM

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO73539) RUA FRANCISCO NICOLAU - Data: 28/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO CONSERTO DE VAZAMENTO EM REDE ÁGUA



(CANF/GSO73869) RUA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO - Data: 28/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO CONSERTO DE VAZAMENTO EM REDE ÁGUA

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO73853) RUA IZELINO MADURO - Data: 28/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO



(CANF/GSO72684) RUA NOEMIA MOREIRA HERDY - Data: 29/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL ESGOTO

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO72694) RUA RIO GRANDE DE CIMA - Data: 29/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA C/ CAIXA PROTETORA TOTEM



(CANF/GSO74034) RUA ANTÔNIO BANJAR - Data: 29/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO CONSERTO DE VAZAMENTO EM REDE ÁGUA

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO74100) RUA DOM JOAO VI - Data: 29/04/2025


OBS.: FOI REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE TAMPÃO ESGOTO



(CANF/GSO72277) RUA FELISBERTO DE CARVALHO - Data: 29/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO CONSERTO DE VAZAMENTO EM REDE ÁGUA

15.04.2025 até 30.04.2025

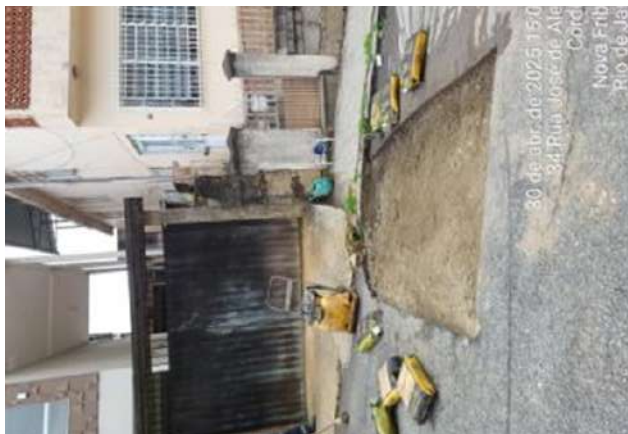

(CANF/GSO72668) RUA JOSÉ DE ALENCAR - Data: 30/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL ESGOTO



(CANF/GSO74217) RUA CEARÁ - Data: 30/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO REPARO DE PV

15.04.2025 até 30.04.2025



(CANF/GSO73627) RUA PREFEITO GUSTAVO LÍRA - Data: 30/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA C/ CAIXA PROTETORA TOTEM



(CANF/GSO72011) RUA OGMAR AGUILERA CAMPOS - Data: 30/04/2025

OBS.: FOI REALIZADO RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO

Nova Friburgo, 20 de junho de 2024.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório de Serviços de Recuperação de Vias**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilhas e relatórios fotográficos referentes aos períodos abaixo:

- De 16/03/2024 a 31/03/2024;
- De 01/04/2024 a 15/04/2024.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-469/2024-SUP
DSSM-td

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO							
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/03/2024 a 31/03/2024										
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M² por minu	
CANF/GSO24474	28/03/2024	SED-03GSO-RP01	ALTO DE OLARIA	RUA PRES BACKER, 118	8.50x1.30 asfalto	MEDIDAS: 8,50 x 1,50	01:45:00	12,75	0,12	
CANF/GSO27501	28/03/2024	SED-03GSO-RP02	PARADA FOLLY	ESTRADA CEL HEBER ALVES DA COSTA	REPOR ASFALTO NA BEIRA DO ACOSTAMENTO, PRÓXIMO A LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MEDIDAS APROXIMADAS> 9,00 X 0,90	MEDIDAS: 10,00 x 1,00	02:50:00	10,00	0,06	
CANF/GSO26728	28/03/2024	SED-03GSO-RP04	SOLARES	RUA DR RENATO ARNALDO SILVEIRA LOPES	REPOR ASFALTO EM FRENTE A QUADRA, MEDIDAS: 1,00 X 0,70	MEDIDAS: 1,00 x 0,70	00:50:00	0,70	0,01	
CANF/GSO18693	19/03/2024	SED-03GSO-RP04	PARQUE SÃO CLEMENTE	RUA VISC DE TAUNAY, 212	REPOR ASFALTO - MEDIDAS: 1,00 X 1,00 - ELCIMAR	MEDIDAS: 1,10 x 1,10	01:00:00	1,21	0,02	
CANF/GSO26828	25/03/2024	SED-03GSO-RP04	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOSA FARIAS, 3	REPOR ASFALTO: 4M X 1,20/KLEBER	MEDIDAS: 4,00 x 1,30	02:40:00	5,20	0,03	
CANF/GSO27052	23/03/2024	SED-03GSO-RP02	VILA GUARANI	RUA PEDRO RANUCCI, 38	medidas do asfalto para repor no local 1.00x0.90	MEDIDAS: 1,00 x 0,90	00:20:00	0,90	0,05	
CANF/GSO24464	29/03/2024	SED-03GSO-RP03	CALIFORNIA	RUA ANTONIO SJAID	reposição de asfalto 1.20X1.20X0	MEDIDAS: 2,00 x 2,00	01:15:00	4,00	0,05	
CANF/GSO20238	18/03/2024	SED-03GSO-RP02	SÃO JORGE	RUA CODAIÁS, 115	CHARLES E LUCAS PECU, MEDIDAS: 1,30 X 1,20 - ASFALTO	MEDIDAS: 2,00 x 2,00	00:30:00	4,00	0,13	
CANF/GSO25893	27/03/2024	SED-03GSO-RP04	PERISSÊ	TRAVESSA SAUERBRONN	REPOR ASFALTO, MEDIDAS: 4,00 X 1,60. FOTO EM ANEXO	MEDIDAS: 3,60 x 1,60	03:00:00	5,76	0,03	
CANF/GSO27668	28/03/2024	SED-03GSO-RP05	ROSA BRANCA	RUA LAS VEGAS, 3	asfalto 0.80x0.80	MEDIDAS: 1,00 x 1,00	00:20:00	1,00	0,05	
CANF/GSO24305	26/03/2024	SED-03GSO-RP04	SÃO GERALDO	RUA JOAQUIM AUGUSTO DOS REIS, 26	asfalto 5.00 060	MEDIDAS: 5,10 x 0,70	02:40:00	3,57	0,02	
CANF/GSO24903	18/03/2024	SED-03GSO-RP03	TIO DONGO	RUA JOAQUIM DA ROSA PINHEIRO, 23	REPOR ASFALTO - MEDIDAS:0,70 X 0,80 EQUIPE VALDINEI - NUMERO 23	MEDIDAS: 0,80 x 0,70	00:30:00	0,56	0,02	
CANF/GSO22312	21/03/2024	SED-03GSO-RP05	RIOGRANDINA	RUA VICENTE LIBONATO	REPOR ASFALTO, MEDIDAS: 6,00 X 1,50 - URGENTE	MEDIDAS: 5,70 x 1,40	02:00:00	7,98	0,07	
CANF/GP03282	17/03/2024	SED-03GSO-RP01	CASCATINHA	RUA CARLOS DA SILVEIRA CARNEIRO, 176	reposição de asfalto 1.60x1.20.	MEDIDAS: 1,80 x 1,50	01:15:00	2,70	0,04	
CANF/GSO27593	28/03/2024	SED-03GSO-RP01	PARADA FOLLY	ESTRADA CEL HEBER ALVES DA COSTA	REPOR ASFALTO NA BEIRA DO ACOSTAMENTO, PRÓXIMO A LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MEDIDAS APROXIMADAS> 9,00 X 0,90	MEDIDAS: 10,00 x 1,00	02:50:00	10,00	0,06	
CANF/GSO27139	25/03/2024	SED-03GSO-RP04	PRADO	AVENIDA MAESTRO JOAQUIM NAEGELE	rua de asfalto frio medida 1.50x1.00	MEDIDAS: 1,50 x 1,00	00:35:00	1,50	0,04	
CANF/GSO26165	27/03/2024	SED-03GSO-RP02	BOM JESUS	RUA LEAO, 1	asfalto 1.20x1.00	MEDIDAS: 2,50 x 2,00	01:20:00	5,00	0,06	
CANF/GSO26708	20/03/2024	SED-03GSO-RP05	FAZENDA DA LAGE	ESTRADA LEOPOLDINA PINEL GARCIA, 1230	repor asfalto em volta da tampa do PV	MEDIDAS: 1,50 x 1,50	01:20:00	2,25	0,03	
CANF/GSO18996	16/03/2024	SED-03GSO-RP01	RUI SANGIARD	RUA JOSÉ ACEDINO PINTO, 581	necessário repor asfalto de 1.20 X 1.10 em frente mercado família 586	MEDIDAS: 1,40 x 1,10	00:50:00	1,54	0,03	
CANF/GSO27073	24/03/2024	SED-03GSO-RP02	PARADA FOLLY	ESTRADA CEL HEBER ALVES DA COSTA	REFAZER CANALETA A PEDIDO DA GERÊNCIA - PARADA FOLLY PRÓXIMO A CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MEDIDAS: 18,00 x 0,30	01:20:00	5,40	0,07	
CANF/GSO25437	22/03/2024	SED-03GSO-RP04	SÍTIO SÃO LUIS	ESTRADA MARIO ANTONIO THURLER	Necessário repor o asfalto após conserto de vazamento nas instalações da VRP (3,30m x 1,60m).	MEDIDAS: 3,35 x 1,60	02:40:00	5,36	0,03	
CANF/GSO23447	17/03/2024	SED-03GSO-RP02	VILA GUARANI	RUA BEAUCLAIR, 276	Asfalto. 1.50x1.50	MEDIDAS: 3,50 x 2,00	02:10:00	7,00	0,05	
CANF/GSO27612	28/03/2024	SED-03GSO-RP04	CÔNEGO	RUA MANOEL JOSÉ DA CUNHA, 64	repor asfalto de 1.50x1.50	MEDIDAS: 1,60 x 1,60	01:00:00	2,56	0,04	
CANF/GSO26729	21/03/2024	SED-03GSO-RP02	SÃO GERALDO	RUA DR FELICIANO BENEDICTO DA COSTA	REPOR ASFALTO PRÓXIMO A PONTE, AONDE FOI REPARADA A ADUTORA, MEDIDAS: 1,50 X 1,00	MEDIDAS: 3,50 x 2,50	02:25:00	8,75	0,06	
CANF/GSO27279	27/03/2024	SED-03GSO-RP01	OLARIA	AVENIDA JULIO ANTONIO THURLER	MEDIDAS A CONFERIR, EM FRENTE A SECRETARIA DE OBRAS	MEDIDAS: 1,30 x 1,20	02:00:00	1,56	0,01	

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M² por minu
CANF/GSO26548	20/03/2024	SED-03GSO-RP04	JARDIM OURO PRETO	AVENIDA NOSSA SENHORA DO AMPARO, 1272	REPOR ASFALTO - MEDIDAS: 1,50 X 1,50 - EQUIPE ELISMAR NUMERO 1272	MEDIDAS: 1,50 x 1,50	01:00:00	2,25	0,04
CANF/GSO22225	25/03/2024	SED-03GSO-RP04	JARDINLÂNDIA	RUA RIO DOCE, 10	pavimento asfalto frio medida 2.00x1.20 número 10	MEDIDAS: 2,00 x 1,30	01:40:00	2,60	0,03
CANF/GSO27273	26/03/2024	SED-03GSO-RP03	CORDOEIRA	RUA MANOEL CHRISTIANO BUSSINGER	REPOR ASFALTO: 3M X 1M/ ESQUINA COM DARCLIA DOS SANTOS	MEDIDAS: 3,00 x 2,00	01:00:00	6,00	0,10
CANF/GSO26796	27/03/2024	SED-03GSO-RP01	OLARIA	AVENIDA JULIO ANTONIO THURLER, 123	repor asfalto de 1.00x1.00 numero 123	MEDIDAS: 1,30 x 1,00	01:20:00	1,30	0,02
CANF/GSO27518	27/03/2024	SED-03GSO-RP02	CALIFORNIA	RUA ANTONIO SJAID, 157	repor asfalto de 1.00x1.00. 1.00x1.00	MEDIDAS: 2,50 x 1,00	00:20:00	2,50	0,13
							44:45:00	125,90	1,50



























































BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO										
MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2024 a 15/04/2024					
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M² por minu	
CANF/GSO29587	12/04/2024	SED-03GSO-RP04	GRANIA SPINELLI	RUA SABINA ABREU AGUILERA, 219	asfalto 0.80x2.00 - CLAYTON	MEDIDAS: 2,00 x 0,80	00:20:00	1,60	0,08	
CANF/GSO29864	15/04/2024	SED-03GSO-RP03	PERISSÊ	RUA JOÃO PEREIRA MARINS, 154	pavimento asfalto frio medida 2.00x1.30 número 154	MEDIDAS: 2,00 x 1,30	00:10:00	2,60	0,26	
CANF/GSO19312	02/04/2024	SED-03GSO-RP04	MORRO DOS MAIAS	RUA CAP MAIA, 3001	repor asfalto no local - medidas:1,40 x 0,80 Equipe Daniel numero 301 lote 1	MEDIDAS: 1,30 x 0,70	00:40:00	0,91	0,02	
CANF/GSO28887	08/04/2024	SED-03GSO-RP01	NOVA SUÍÇA	RUA SALVADOR DA ROSA CANTO, 59	asfalto 1.00 X 0.80 enfrente ao número 59 do outro lado da rua .	MEDIDAS: 1,00 x 0,80	00:30:00	0,80	0,03	
CANF/GSO29116	09/04/2024	SED-03GSO-RP05	CASCATINHA	RUA CARLOS DA SILVEIRA CARNEIRO, 117	asfalto 1.50 X 1.50. enfrente ao número 117 no meio da rua.	MEDIDAS: 1,50 x 1,10	00:50:00	1,65	0,03	
CANF/GSO22750	01/04/2024	SED-03GSO-RP05	VARGINHA	TRAVESSA JOAO ALEXANDRE DE MOURA	2.50x100 asfalto frio para repor na subida de esquina (asfalto)	MEDIDAS: 3,00 x 1,00	00:35:00	3,00	0,09	
CANF/GSO26523	05/04/2024	SED-03GSO-RP03	SÃO GERALDO	RUA ARACRUZ, 7	necessário repor asfalto de 2.30 X 1 20 / 4.00 X 0.20 ao lado do número 7	MEDIDAS: 4,00 x 0,20	03:10:00	0,80	0,00	
CANF/GSO29436	15/04/2024	SED-03GSO-RP01	OLARIA	RUA PRES VARGAS	asfalto: 3,50 x 1,50/ kieber	MEDIDAS: 4,00 x 1,70	02:00:00	2,80	0,02	
CANF/GSO25249	04/04/2024	SED-03GSO-RP01	ALTO DE OLARIA	RUA URUGUAIANA, 86	REPOR ASFALTO: 2,60 X 0,80/ DANIEL	MEDIDAS: 2,60 x 0,60	01:10:00	1,56	0,02	
CANF/GSO28290	06/04/2024	SED-03GSO-RP04	CONSELHEIRO PAULINO	RUA INACIO SOBRINHO	REPOR ASFALTO: 1M X 1M	MEDIDAS: 1,00 x 1,00	01:10:00	1,00	0,01	
CANF/GSO28502	08/04/2024	SED-03GSO-RP05	SANTA BERNADETE	RUA ZULMIRA BERÇOT DA COSTA, 409	REFAZER ASFALTO QUE AFUNDOU, MEDIDAS: 2,00 X 0,40. PRÓXIMO AO 409, AONDE TEM UMA PADARIA.	MEDIDAS: 2,00 x 0,40	00:20:00	0,80	0,04	
CANF/GSO23282	05/04/2024	SED-03GSO-RP03	SÃO GERALDO	RUA ARACRUZ, 7	necessário repor asfalto de 2.30 X 1 20 / 4.00 X 0.20 ao lado do número 7	MEDIDAS: 2,30 x 1,20	03:10:00	2,76	0,01	
CANF/GSO27129	12/04/2024	SED-03GSO-RP04	ALTO DE OLARIA	RUA SAO JOAO DE MERITI, 2	pavimento asfalto frio medida 1.00x1.00 número 2. REPOR ASFALTO EM VOLTA DA TAMPA DO P.V.	MEDIDAS: 1,00 x 1,00	00:40:00	1,00	0,03	
CANF/GSO21965	14/04/2024	SED-03GSO-RP05	PRADO	RUA BENJAMIN CONSTANT, 1211	repor asfalto 0.90x0.80x0.60. 2. carinho de lama	MEDIDAS: 0,90 x 0,90	00:20:00	0,81	0,04	
CANF/GSO29103	12/04/2024	SED-03GSO-RP01	MORRO DOS MAIAS	RUA CAP MAIA, 10	Asfalto. 1.50x1.20	MEDIDAS: 1,50 x 1,30	01:10:00	1,95	0,03	
CANF/GSO29302	11/04/2024	SED-03GSO-RP04	MURY	RUA MARACANA, 3	repor asfalto: 1,20 x 1m/ jreinaldo	MEDIDAS: 1,50 x 1,30	01:00:00	1,95	0,03	
CANF/GSO29196	10/04/2024	SED-03GSO-RP04	BARROSO	RUA ANTÔNIO LUGON	repor asfalto aonde afundou após vazamento de água, medidas à conferir.	MEDIDAS: 1,00 x 0,75	01:00:00	0,75	0,01	
CANF/GSO29183	10/04/2024	SED-03GSO-RP05	DUAS PEDRAS	AVENIDA DOS FERROVIARIOS	medidas do asfalto: 2,50 x 1,00 e 2,00 x 1,00. em volta do PV, em frente a quadra.	MEDIDAS: 5,20 x 2,20	05:30:00	11,44	0,03	
CANF/GSO28927	08/04/2024	SED-03GSO-RP01	PONTE DA SAUDE	RUA BANGU, 2	asfalto 1.50 x 1.20	MEDIDAS: 1,50 x 1,20	00:50:00	1,80	0,04	
CANF/GSO29140	09/04/2024	SED-03GSO-RP03	DUAS PEDRAS	AVENIDA ANTONIO M DE AZEVEDO	REPOR ASFALTO, MEDIDAS: 1,00 X 1,00	MEDIDAS: 1,00 x 1,00	00:22:00	1,00	0,05	
CANF/GSO28862	09/04/2024	SED-03GSO-RP04	BARROSO	RUA ANTÔNIO LUGON	repor asfalto de 4.00x0.80	MEDIDAS: 4,00 x 0,80	01:40:00	3,20	0,03	
CANF/GSO26553	05/04/2024	SED-03GSO-RP03	SÃO GERALDO	RUA ARACRUZ, 6	reposição de asfalto. 1.50x0.80x0.05	MEDIDAS: 1,50 x 0,80	00:10:00	1,20	0,12	
CANF/GSO23722	04/04/2024	SED-03GSO-RP03	BELA VISTA	RUA SANTA CATARINA, 9	asfalto 7,00 X 2,00	MEDIDAS:7,00 x 2,00	02:30:00	14,00	0,09	
CANF/GSO28810	06/04/2024	SED-03GSO-RP04	CONSELHEIRO PAULINO	RUA INACIO SOBRINHO	repor asfalto 1,00 x 0,40/ Clayton	MEDIDAS: 1,00 x 0,40	00:10:00	0,40	0,04	
CANF/GSO27264	02/04/2024	SED-03GSO-RP01	ALTO DE OLARIA	RUA XINGU, 18	REPOR ASFALTO: JOILSON 4M X 1,50/JOILSON	MEDIDAS: 5,00 x 2,60	03:35:00	13,00	0,06	

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M² por minu
CANF/GSO28505	08/04/2024	SED-03GSO-RP05	SANTA BERNADETE	RUA ZULMIRA BERÇOT DA COSTA, 5	REPOR ASFALTO QUE SOLTOU E ESTÁ CRAQUELADO, PRÓXIMO AO NÚMERO 5, MEDIDAS: 1,80 X 1,00 E 1,00 X 1,00. FOTO EM ANEXO.	MEDIDAS: 2,80 x 1,00	00:50:00	2,80	0,06
CANF/GSO29444	11/04/2024	SED-03GSO-RP04	RIOGRANDINA	RUA MANOEL RODRIGUES DE FREITAS, 70	repor asfalto de 1.00x1.00	MEDIDAS: 1,00 x 1,00	00:10:00	1,00	0,10
CANF/GSO28261	07/04/2024	SED-03GSO-RP04	RUI SANGIARD	ALAMEDA MARIA JOSÉ HENRIQUE COUTINHO	asfalto 1.00X1.00	MEDIDAS: 2,50 x 1,40	02:00:00	3,50	0,03
CANF/GSO28506	08/04/2024	SED-03GSO-RP05	SANTA BERNADETE	RUA ZULMIRA BERÇOT DA COSTA, 673	REPOR ASFALTO EM FRENTE AO NÚMERO 673. MEDIDAS: 1,50 X 1,00 E 1,30 X 0,70. FOTO EM ANEXO	MEDIDAS: 3,00 x 1,30	01:25:00	3,90	0,05
CANF/GSO28590	09/04/2024	SED-03GSO-RP01	CÔNEGO	RUA AURORA SILVEIRA	repo asfalto, 1,90x0,50	MEDIDAS: 1,90 x 1,10	01:10:00	2,09	0,03
CANF/GSO19706	12/04/2024	SED-03GSO-RP01	SANTA LUZIA	RUA WALDIR RAMALHETE LEMOS, 3	repor asfalto, 1.10x0.80 / 3.60x0.30	MEDIDAS: 3,70 x 0,50	01:10:00	1,85	0,03
CANF/GSO29734	15/04/2024	SED-03GSO-RP01	CÔNEGO	RUA MANOEL JOSE DA CUNHA, 85	asfalto 3x80	MEDIDAS: 2,70 x 2,60	02:10:00	7,02	0,05
CANF/GSO28347	04/04/2024	SED-03GSO-RP04	CANTO DO RIACHO	RUA JOSÉ DA ROSA PINHEIRO, 11	2.00 x 1.50	MEDIDAS: 1,80 x 1,50	01:00:00	7,56	0,13
CANF/GSO27896	06/04/2024	SED-03GSO-RP04	BAIRRO DO GIRASSOL	RUA JABOATAO, 24	repor asfalto de 2.00x0.50	MEDIDAS: 2,00 x 0,50	00:50:00	1,00	0,02
CANF/GSO29181	10/04/2024	SED-03GSO-RP01	DUAS PEDRAS	RUA FRANCISCO MARIA LEITE	repor asfalto, medidas: 4,00 x 3,00	MEDIDAS: 4,00 x 3,00	02:40:00	12,00	0,08
CANF/GSO27818	05/04/2024	SED-03GSO-RP01	LUMIAR	PRAÇA EUGÊNIO GUSTAVO BRUST	trazer máquina de asfalto para fazer isso corte,em frente a igreja ,1.50x2.50	MEDIDAS: 2,50 x 1,00	01:15:00	2,50	0,03
CANF/GSO19704	01/04/2024	SED-03GSO-RP04	SÃO GERALDO	RUA DOUTOR FELÍCIANO BENEDITO DA COSTA	2.50x1.50	MEDIDAS: 2,50 x 1,50	00:40:00	3,75	0,09
CANF/GSO29292	11/04/2024	SED-03GSO-RP01	JARDIM OURO PRETO	RUA BENJAMIN CONSTANT	REPOR ASFALTO EM VOLTA DA TAMPA DO P.V. EXPOSTA, MEDIDAS: 1,50 X 1,20. NA ESQUINA DA RUA JOSÉ AFONSO QUEIROZ.	MEDIDAS: 1,80 x 1,30	01:50:00	2,34	0,02
CANF/GSO29321	14/04/2024	SED-03GSO-RP05	PRADO	RUA WALDEMAR BELEM PONCIANO, 16	REPOR ASFALTO: 1,50 X 1M/ CASSIANO/ 10/04/ Nº 16	MEDIDAS: 1,50 x 1,00	00:20:00	1,50	0,08
CANF/GSO28752	08/04/2024	SED-03GSO-RP03	RIOGRANDINA	RUA LUIZ DA CUNHA	REPOR ASFALTO, MEDIDAS: 2,00 X 1,00	MEDIDAS: 2,00 x 1,00	02:00:00	2,00	0,02
CANF/GSO28897	09/04/2024	SED-03GSO-RP05	CHÁCARA DO PARAÍSO	RUA IZELINO MADURO, 296	necessário repor o asfalto 9.00 X 0.80 número 296 ou lado da borracharia	MEDIDAS: 9,00 x 1,00	02:00:00	9,00	0,08
CANF/GSO26917	01/04/2024	SED-03GSO-RP05	VARGINHA	RUA MARIA BAPTISTA MOLIARI, 62	REPOSIÇÃO DE ASFALTO: 1,50 X 1,20/ KLEBER	MEDIDAS: 1,80 x 1,40	00:25:00	2,52	0,10
							94:57:00	139,11	2,21



















































































Nova Friburgo, 20 de junho de 2024.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório de Serviços de Recuperação de Vias**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilhas e relatórios fotográficos referentes aos períodos abaixo:

- De 16/04/2024 a 30/04/2024;
- De 01/05/2024 a 15/05/2024.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-470/2024-SUP
DSSM-td

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO									
MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/04/2024 a 30/04/2024						
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M² por minu
CANF/GSO26501	18/04/2024	SED-03GSO-RP03	NOVA ESPERANÇA	RUA RICARDO SANTOS	REPOR ASFALTO - MEDIDAS:2,00 X 1,50 - EQUIPE MAXWELL -	MEDIDAS: 2,00 x 1,20	02:00:00	2,40	0,02
CANF/GSO30095	26/04/2024	SED-02GSO-PL01	VILA GUARANI	RUA GENERAL ARGÔLO, 157	REPOR ASFALTO. MEDIDAS A CONFERIR	MEDIDAS: 0,60 x 0,60	00:37:00	0,36	0,01
CANF/GSO30710	26/04/2024	SED-02GSO-PL01	VILA GUARANI	RUA PEDRO RANUCCI, 38	MEDIDAS: 1,20 X 0,70 - FERNANDO	MEDIDAS: 1,00 x 1,00	01:00:00	1,00	0,02
CANF/GSO31230	26/04/2024	SED-02GSO-PL01	CORDOIRA	RUA PALMERIN TRANIN, 32	asfalto 2.00 080	MEDIDAS: 2,00 x 0,80	00:30:00	1,60	0,05
CANF/GSO30760	24/04/2024	SED-03GSO-RP02	DUAS PEDRAS	RUA MARINO PINTO, 101	repor asfalto, 2.60x0.50	MEDIDAS: 2,60 x 0,50	00:23:00	1,30	0,06
CANF/GSO30415	24/04/2024	SED-03GSO-RP03	TIO DONGO	RUA BRASILIANA DA ROSA TEIXEIRA, 18	repor asfalto, 2.20x1.10	MEDIDAS: 2,20 x 1,10	01:00:00	2,42	0,04
CANF/GSO31295	27/04/2024	SED-03GSO-RP02	CENTRO	RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 56	necessário repor asfalto de 1.20x1.20 enfrente ao número 56.	MEDIDAS: 1,20 x 1,20	00:10:00	1,44	0,14
CANF/GSO26477	29/04/2024	SED-03GSO-RP03	VARGINHA	RUA LEONINO DUTRA	KLEBER, MEDIDAS: 8,00 X 1,20 - ASFALTO	MEDIDAS: 8,00 x 2,00	04:00:00	16,00	0,07
CANF/GSO25702	17/04/2024	SED-03GSO-RP01	CANTO DO RIACHO	RUA ARARIPINA, 33	repor asfalto - medidas: 1,00 x 1,00 / 4,00 x 0,40 - Equipe Charles - numero 33	MEDIDAS: 4,00 x 0,40	00:40:00	1,60	0,04
CANF/GSO28845	23/04/2024	SED-02GSO-RP02	OLARIA	RUA SAO ROQUE	REPOR ASFALTO: 3M X 1,50/ PONTO FINAL/ PERTO DA SORVETERIA ESQUIMÓ/TAVARES	MEDIDAS: 7,00 x 0,60	03:20:00	4,20	0,02
CANF/GSO24418	26/04/2024	SED-03GSO-RP04	RUI SANGLARD	RUA SANGLARD, 100	Repor asfalto. Medidas a conferir.	MEDIDAS: 1,40 x 0,70	00:30:00	0,98	0,03
CANF/GSO20037	25/04/2024	SED-03GSO-RP03	RIGRANDINA	RUA CAP BENTO JOSÉ VELOSO, 9	asfalto 2.00 X 2.00 .	MEDIDAS: 2,00 x 1,80	01:30:00	3,60	0,04
CANF/GSO24217	30/04/2024	SED-03GSO-RP01	SÃO JORGE	RUA CADAÍAS, 115	recomposição de asfalto: 1,40 x 100/ lucas	MEDIDAS: 1,40 x 0,90	01:14:00	1,26	0,02
CANF/GSO25573	30/04/2024	SED-03GSO-RP03	SÃO GERALDO	RUA JOSE GONCALVES JARDIM, 214	REPOR ASFALTO - MEDIDAS: 2,50 X 2,50 FINAL DA RUA NUMERO 214 - EQUIPE LUCAS PECU. RETIRAR 2 CARRINHOS DE ENTULHO	MEDIDAS: 2,50 x 2,50	01:30:00	6,25	0,07
CANF/GSO25239	24/04/2024	SED-03GSO-RP02	ROSA BRANCA	RUA TEXAS, 7	necessário repor asfalto de 1.50x0.50 enfrente ao numero 7.	MEDIDAS: 1,50 x 0,50	00:20:00	0,75	0,04
CANF/GSO23348	22/04/2024	SED-03GSO-RP03	PONTE DA SAUDE	RUA FELIPE CAMARÃO, 501	refazer asfalto do lado da padaria	MEDIDAS: 3,60 x 1,50	02:10:00	5,40	0,04
CANF/GSO27709	16/04/2024	SED-03GSO-RP01	YPU	RUA ANTONIO LOPES SERTA	Medida do asfalto 1MT x 2MT ,espessura 0.10 cm	MEDIDAS: 4,00 x 1,60	02:10:00	6,40	0,05
CANF/GSO22150	16/04/2024	SED-03GSO-RP05	JARDIM OURO PRETO	AVENIDA NSA DO AMPARO, 1512	repor asfalto de 5.00x1.00x1.00	MEDIDAS: 5,70 x 0,90	03:43:00	5,13	0,02
CANF/GSO26467	26/04/2024	SED-03GSO-RP03	BOM JESUS	RUA THOMAZ, 9	asfalto 1.00 X 0.50 Última rua do lado esquerdo.	MEDIDAS: 2,00 x 0,60	00:45:00	1,20	0,03
CANF/GSO20633	25/04/2024	SED-03GSO-RP05	CAMPO DO COELHO	RUA ROGERIO STUTZ PEREIRA, 639	REPOR ASFALTO - MEDIDAS: 1,30 X 1,00 SANDRO	MEDIDAS: 1,50 x 1,00	00:45:00	1,50	0,03
CANF/GSO28593	18/04/2024	SED-03GSO-RP03	NOVA ESPERANÇA	RUA RICARDO SANTOS, 14	Necessário repor asfalto, medidas 2.00 X 1.20	MEDIDAS: 2,20 x 1,40	00:42:00	3,08	0,07
CANF/GSO24327	24/04/2024	SED-03GSO-RP04	OLARIA	RUA SÃO ROQUE, 368	repor asfalto de 1.00x1.00 PASSADO PARA EQUIPE DO CLAYTON	MEDIDAS: 1,00 x 1,00	00:40:00	1,00	0,03
CANF/GSO25990	16/04/2024	SED-03GSO-RP02	SÃO CRISTÓVÃO	RUA ALTAMIRO MARTINS OURIQUES, 89	REFAZER ASFALTO AFUNDADO, MEDIDAS APROXIMADAS: 2,00 X 1,50 E RECOLHER OS ENTULHOS DE BAIXO DA ESCADA.carro no local pela segunda vez com esta equipe	MEDIDAS: 3,00 x 2,50	02:40:00	7,50	0,05
CANF/GSO30071	16/04/2024	SED-03GSO-RP04	OLARIA	RUA PRES VARGAS, 89	MEDIDAS A CONFERIR	MEDIDAS:2,00 x 0,60	00:15:00	1,20	0,08
CANF/GSO27696	21/04/2024	SED-03GSO-RP01	CONSELHEIRO PAULINO	RUA OSWALDO BALTAZAR, 21	repor asfalto, 0.90x0.60	MEDIDAS: 0,90 x 0,60	00:40:00	0,54	0,01

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M² por minu
CANF/GSO30131	17/04/2024	SED-03GSO-RP05	OSCAR SCHULTZ	RUA AFFONSO MARIANO DE SOUZA, 184	asfalto 1.40 080	MEDIDAS: 1,50 x 1,20	00:30:00	1,80	0,06
CANF/GSO30800	23/04/2024	SED-03GSO-RP01	OLARIA	RUA SAO ROQUE	apoio ao Ronimar/ 23/04	MEDIDAS: 7,00 x 0,60	00:10:00	4,20	0,42
CANF/GSO21718	25/04/2024	SED-03GSO-RP03	RIOGRANDINA	RUA VEREADOR CLÁUDIO TEIXEIRA, 3	Asfalto 0.70x0.40	MEDIDAS: 1,10 x 1,00	00:45:00	1,10	0,02
CANF/GSO24306	25/04/2024	SED-03GSO-RP03	RIOGRANDINA	RUA FRANCISCO FERNANDES BARRADAS, 87	necessário repor rua de asfalto medida 2.00 X 1.00 final da rua	MEDIDAS: 3,60 x 1,80	01:25:00	6,48	0,08
CANF/GSO30255	18/04/2024	SED-03GSO-RP05	VILA GUARANI	RUA MANOEL LUIS FOLLY, 41	repor asfalto de 0.60x0.60	MEDIDAS: 1,10 x 0,70	00:35:00	0,77	0,02
CANF/GSO30942	24/04/2024	SED-03GSO-RP02	SÃO JORGE	RUA VALDIR GRATIVAL, 996	repor asfalto de 1.50x1.50	MEDIDAS: 2,00 x 1,50	00:30:00	3,00	0,10
CANF/GSO30883	24/04/2024	SED-03GSO-RP02	TIO DONGO	RUA BRASILIANA DA ROSA TEIXEIRA, 26	asfalto 1.00 080	MEDIDAS: 1,00 x 1,00	00:10:00	1,00	0,10
CANF/GSO28106	22/04/2024	SED-03GSO-RP03	SÍTIO SÃO LUIS	RUA ACYREMA VASSALLO DE AZEVEDO, 100	asfalto 2.50 x 1.50	MEDIDAS: 2,50 x 1,50	01:30:00	3,75	0,04
CANF/GSO29983	16/04/2024	SED-03GSO-RP05	JARDIM OURO PRETO	AVENIDA NSA DO AMPARO, 1512	REPOR MEIO FIO - 4,00 X 0,20 - LEANDRO	MEDIDAS: 4,00 x 0,20	00:15:00	0,80	0,05
CANF/GSO28811	20/04/2024	SED-03GSO-RP01	LAGOA SECA	RUA EUGENIA DE ALMEIDA MAIA	repor asfalto de 2.00x1.00	MEDIDAS: 2,10 x 1,40	01:25:00	2,94	0,03
CANF/GSO30239	19/04/2024	SED-03GSO-RP03	SOLARES	RUA DR RENATO ARNALDO SILVEIRA LOPES	REPOR ASFALTO - MEDIDAS: 2,00 X 1,00 - ANTES DO CURVÃO - TAVARES	MEDIDAS: 3,80 x 1,80	03:08:00	6,84	0,04
CANF/GSO31155	29/04/2024	SED-03GSO-RP05	OSCAR SCHULTZ	RUA OSCÁR SCHULTZ	USMAR, MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS A CONFERIR, APROXIMADAMENTE 7,00 X 2,00 E 3,00 X 1,50	MEDIDAS: 9,00 x 2,60	06:00:00	23,40	0,07
CANF/GSO28690	17/04/2024	SED-03GSO-RP02	PERISSÉ	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 139	repor asfalto, medidas: 4,20 x 0,80	MEDIDAS: 7,00 x 2,50	04:00:00	17,50	0,07
CANF/GSO30046	17/04/2024	SED-03GSO-RP04	JARDIM OURO PRETO	RUA JOAO BATISTA FERNANDES	REPOR ASFALTO NA ESQUINA COM A RUA BENJAMIN CONSTANT, LEVAR UM T9, MEDIDAS: 2,20 X 0,50	MEDIDAS: 2,20 x 0,50	00:40:00	1,10	0,03
CANF/GSO31244	26/04/2024	SED-03GSO-RP01	SOLARES	RUA DR RENATO ARNALDO SILVEIRA LOPES	asfalto 1.20x1.20	MEDIDAS: 1,70 x 0,90	01:00:00	1,53	0,03
CANF/GSO27295	26/04/2024	SED-03GSO-RP03	BOM JESUS	RUA THOMAZ, 8	medidas do asfalto para repor no local 1.20x0.50	MEDIDAS: 1,20 x 0,50	00:45:00	0,60	0,01
CANF/GSO20350	25/04/2024	SED-03GSO-RP02	BOA VENTURA	RUA ALBATROZ, 64	reposição de asfalto: 5m x 0,40; Elcimar	MEDIDAS: 6,00 x 0,50	01:10:00	3,00	0,04
CANF/GSO25509	25/04/2024	SED-03GSO-RP04	BELA VISTA	RUA SÃO PAULO, 236	5.00x1.50 afasto	MEDIDAS: 5,00 x 1,50	02:45:00	7,50	0,05
CANF/GSO31632	30/04/2024	SED-03GSO-RP05	BRAUNES	RUA DR BARCELOS, 154	repor asfalto de 0.60x0.60	MEDIDAS: 0,60 x 0,80	00:10:00	0,48	0,05
CANF/GSO25011	29/04/2024	SED-03GSO-RP01	RIOGRANDINA	RUA LUIZ DA CUNHA, 111	asfalto 1.00 X 0.80.	MEDIDAS: 1,30 x 0,90	01:00:00	1,17	0,02
CANF/GSO27379	26/04/2024	SED-03GSO-RP04	RUI SANGLARD	RUA CHARLES FABIANO CARRILHO	repor asfalto de 1.00x1.00	MEDIDAS: 1,00 x 1,00	00:38:00	1,00	0,03
CANF/GSO27175	18/04/2024	SED-03GSO-RP03	NOVA ESPERANÇA	RUA ARTHUR LIMA	REPOR ASFALTO/FELIX: Nº12/ 3MX 1M/2M X 1M	MEDIDAS: 2,20 x 1,20	01:40:00	2,64	0,03
CANF/GSO29011	24/04/2024	SED-03GSO-RP02	DUAS PEDRAS	RUA PERGENTINO JOSÉ SAIPPA, 9	medidas do asfalto para repor no local 2 30x0.70	MEDIDAS: 3,00 x 0,70	00:15:00	2,10	0,14
CANF/GSO30641	24/04/2024	SED-03GSO-RP03	SÃO JORGE	RUA VALDIR GRATIVAL, 365	pavimento asfalto frio medida 4.00x1.50 número 365	MEDIDAS: 6,00 x 2,10	02:50:00	12,60	0,07
CANF/GSO30509	22/04/2024	SED-03GSO-RP04	CONSELHEIRO PAULINO	RUA CORONEL JOÃO TEIXEIRA	asfalto 2x150	MEDIDAS: 2,00 x 1,50	01:00:00	3,00	0,05
CANF/GSO31432	29/04/2024	SED-03GSO-RP03	VARGINHA	RUA LÉONINO DUTRA	REPOR ASFALTO MEDIDAS A CONFERE - FOTO EM ANEXO	MEDIDAS: 8,00 x 1,30	02:17:00	10,40	0,08

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M² por minu
CANF/GSO29985	17/04/2024	SED-03GSO-RP04	RUI SANGIARD	RUA JOSÉ ACINDINO PINTO	REPOR ASFALTO NO INÍCIO DA SUBIDA, MEDIDAS: 0,80 X 0,80	MEDIDAS: 0,80 x 0,80	00:40:00	0,64	0,02
CANF/GSO30142	30/04/2024	SED-03GSO-RP04	RIVO TORTO	RUA MARCOLINA DA ROSA PINHEIRO, 136	MEDIDAS: 3,00 X 1,00 - MAXWEL	MEDIDAS: 5,20 x 2,00	03:30:00	10,40	0,05
CANF/GSO30876	24/04/2024	SED-03GSO-RP03	TIO DONGO	RUA BRASILIANA DA ROSA TEIXEIRA, 19	Nº 19 ASFALTO - MEDIDAS: 2,00 X0,60 - FABIO	MEDIDAS: 2,60 x 0,60	01:40:00	1,56	0,02
CANF/GSO30897	24/04/2024	SED-03GSO-RP04	ALTO DE OLARIA	RUA URUGUAIANA, 17	asfalto 1.00x0.50 final da rua uruguaiana	MEDIDAS: 1,00 x 0,50	00:25:00	0,50	0,02
CANF/GSO20126	25/04/2024	SED-03GSO-RP02	NOVA SUÍÇA	RUA WALDIR DE BRITOS, 186	NECESSÁRIO REPOR ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00	MEDIDAS: 1,80 x 1,80	01:15:00	3,24	0,04
CANF/GSO31071	25/04/2024	SED-03GSO-RP04	ALTO DE OLARIA	RUA GUAPORÉ, 25	3x0.60	MEDIDAS: 3,00 x 0,60	00:55:00	1,80	0,03
CANF/GSO21090	25/04/2024	SED-03GSO-RP05	CAMPO DO COELHO	RUA NORIVAL DOS SANTOS CALIXTO	asfalto 1.20x1.20	MEDIDAS: 2,10 x 1,80	02:05:00	3,78	0,03
CANF/GSO19717	30/04/2024	SED-03GSO-RP03	RIO GRANDE DE CIMA	ESTRADA RIO GRANDE DE CIMA	repor asfalto de 4.00x1.50 na estação de Rio Grande de cima	MEDIDAS: 7,10 x 1,50	01:42:00	10,65	0,10
CANF/GSO30297	18/04/2024	SED-03GSO-RP04	ALTO DE OLARIA	RUA CLARINDO CARESTIATO, 62	asfalto 1.60 1.00	MEDIDAS: 1,60 x 1,00	00:15:00	1,60	0,11
CANF/GSO29878	16/04/2024	SED-03GSO-RP02	GIRASSOL	RUA JANDYRA B PERLINGEIRO	repo asfalto, 1.20x1.20 colocar 19 no registro da manobra.	MEDIDAS: 1,50 x 1,00	00:33:00	1,50	0,05
CANF/GSO25513	30/04/2024	SED-03GSO-RP04	CONSELHEIRO PAULINO	RUA AUGUSTO GOMES, 10	pavimento asfalto frio medida 3.00x1.80 número 10	MEDIDAS: 3,30 x 2,00	02:20:00	6,60	0,05
							85:07:00	241,08	3,31


















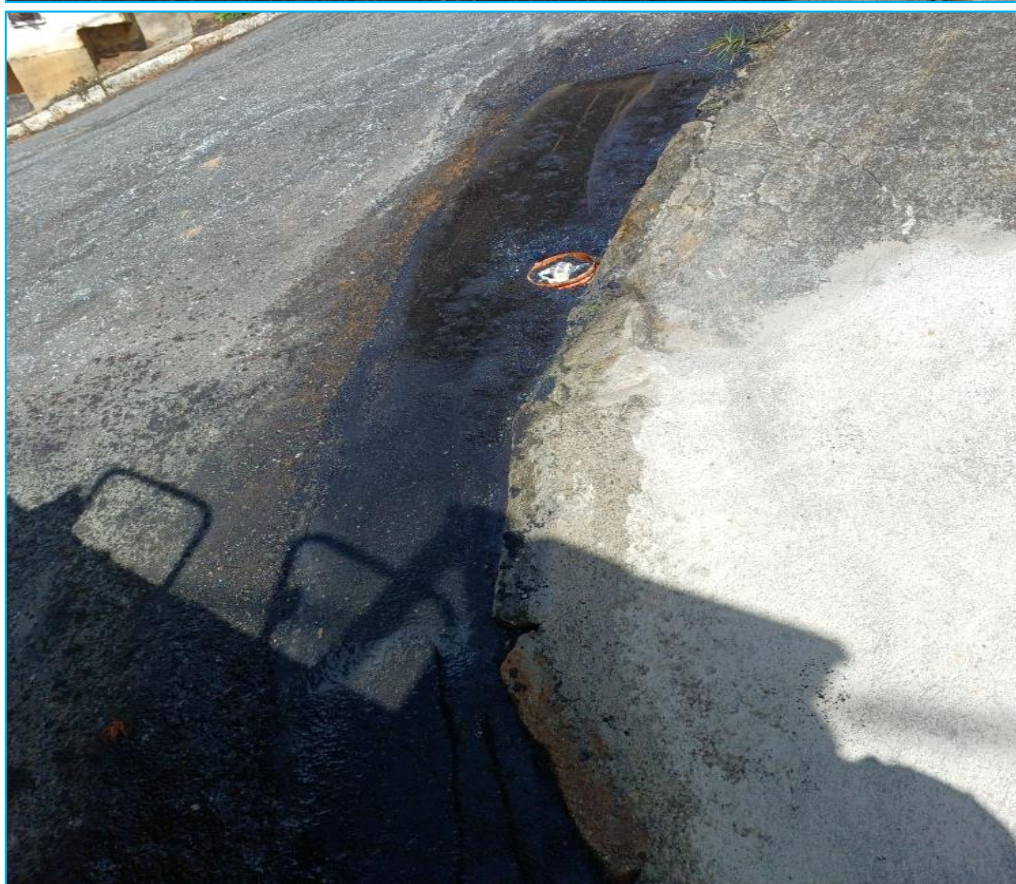














































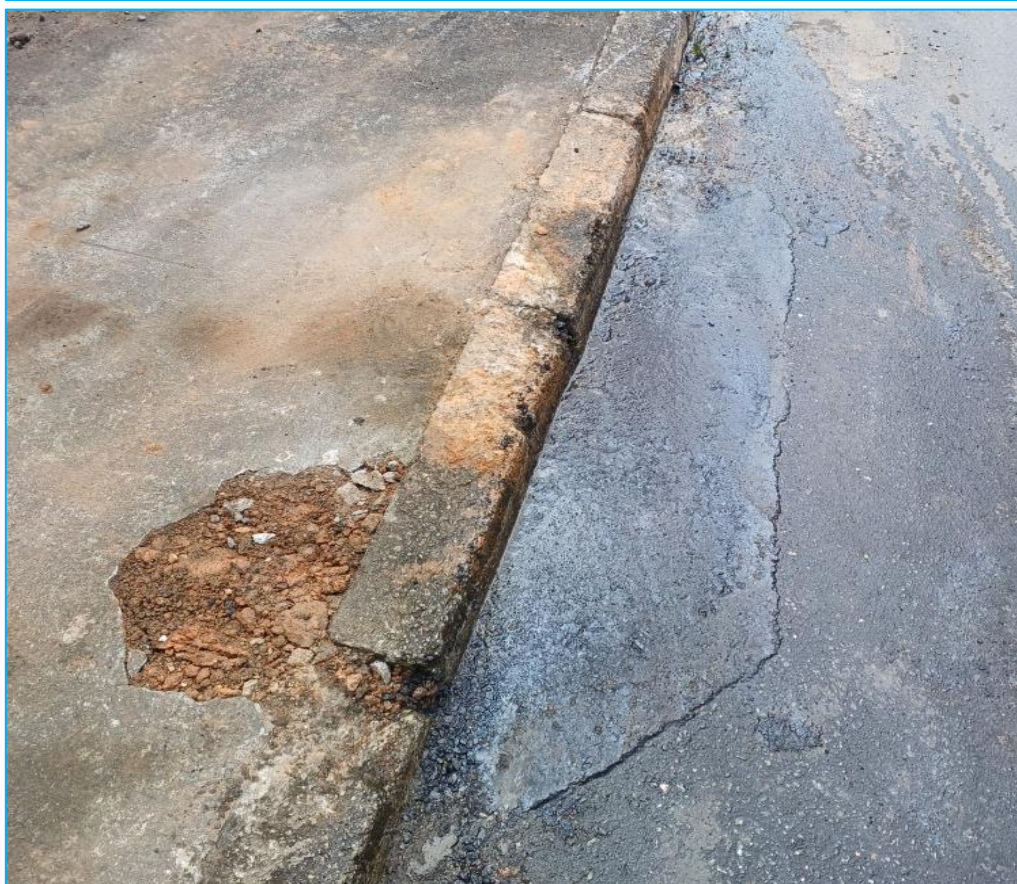






















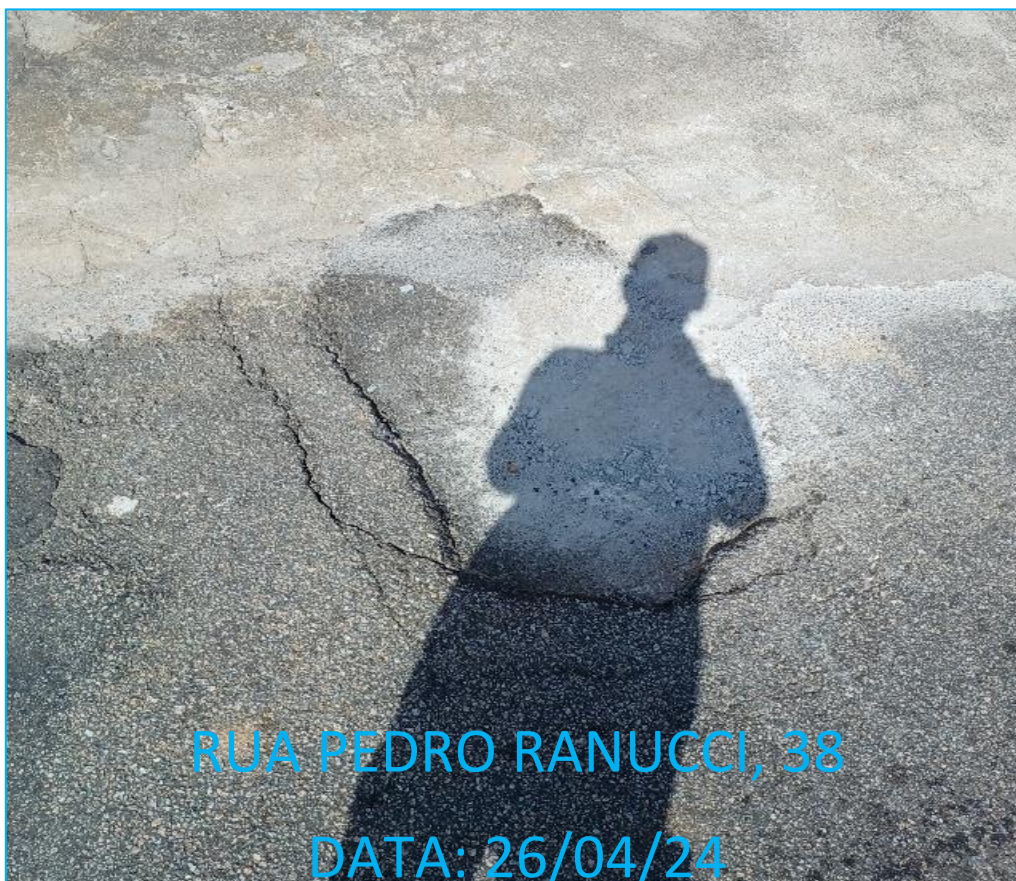



































MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO							
			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2024 a 15/05/2024							
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M² por minu.	
CANF/GSO28321	15/05/2024	SED-03GSO-RP05	TIO DONGO	RUA JOSÉ ERNESTO KNUST	repor asfalto de 6.00x0.50//Segundo Elismar o endereço correto é na Brasileira da Rosa Teixeira/ No rodo	MEDIDAS: 6,00 x 0,50	01:10:00	3,00	0,04	
CANF/GSO20234	06/05/2024	SED-03GSO-RP04	BOM JESUS	RUA DAS CONQUISTAS	REPOR DOIS PONTOS DE ASFALTOS, PRÓXIMO AO NÚMERO 58, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,50 X 1,20 E 1,20 X 1,00	MEDIDAS: 1,20 x 1,00	00:30:00	1,20	0,04	
CANF/GSO31698	02/05/2024	SED-03GSO-RP01	BARROSO	AVENIDA JERONYMO ALEXANDRE FROSSARD, 459	repor asfalto: 8m x 0,30/ 1m x 1m; 8m x 0,30/ 1m x 1m// Diogo	MEDIDAS: 5,00 x 0,30 x 1,50 x 1,00	01:00:00	3,00	0,05	
CANF/GSO28125	14/05/2024	SED-03GSO-RP04	CONSELHEIRO PAULINO	TRAVESSA CEL JOAO TEIXEIRA, 12	MEDIDAS: 4,00 X 1,50 - RETIRAR 8 CARRINHOS DE ENTULHO - Nº 12 - LEANDRO CASSIANO	MEDIDAS: 4,60 x 1,70	01:30:00	7,82	0,09	
CANF/GSO21375	09/05/2024	SED-03GSO-RP05	PRADO	RUA PAULO CECCON SALARINE, 32	REPOR ASFALTO - MEDIDAS: 2,00 X 2,00 / 1,00 X 0,60 / 1,20 X 1,20 - MANUTENÇÃO ESGOTO - EQUIPE DIOGO - NÚMERO 32	MEDIDAS: 2,20 x 2,50	02:00:00	5,50	0,05	
CANF/GSO33346	15/05/2024	SED-03GSO-RP01	RIVO TORTO	RUA HEITOR CAPOSSI, 92	repo asfalto, 1.30x1.10	MEDIDAS: 2,10 x 1,20 x 1,20 x 1,20	01:40:00	3,96	0,04	
CANF/GSO23500	09/05/2024	SED-03GSO-RP03	ALTO DE OLARIA	RUA FRANCISCO NICOLAU, 22	reposição de asfalto 5.00X0.60X0.4	MEDIDAS: 5,00 x 0,60	01:00:00	3,00	0,05	
CANF/GSO20862	08/05/2024	SED-03GSO-RP05	CONSELHEIRO PAULINO	RUA LAFAYETTE BRAVO FILHO	asfalto, programar para o primeiro horário ou final de semana devido o movimento de carro José enesto knust em frente hzine.	MEDIDAS: 0,90 x 0,60	00:15:00	0,54	0,04	
CANF/GSO32917	13/05/2024	SED-03GSO-RP05	CÔNEGO	RUA MARECHAL RONDON, 62	asfalto 0.500.50	MEDIDAS: 0,50 x 0,50	00:20:00	0,25	0,01	
CANF/GSO31513	02/05/2024	SED-03GSO-RP03	VARGINHA	RUA DR ALBERTO PORTO DA SILVEIRA, 188	MEDIDAS: 2,50 X 1,00 - 1,20 X 1,20 - FERNANDO	MEDIDAS: 3,00 x 1,20	01:20:00	3,60	0,05	
CANF/GSO33375	14/05/2024	SED-03GSO-RP02	BELMONT	RUA PEDRO MENDES DA VEIGA	asfalto 1.00x1.00	MEDIDAS: 1,20 x 1,20	00:20:00	1,44	0,07	
CANF/GSO32981	10/05/2024	SED-03GSO-RP01	CHÁCARA DO PARAÍSO	RUA IZELINO MADURO, 218	asfalto medida 1.30por 1.30	MEDIDAS: 1,50 x 1,50 x 0,40 x 0,40	01:20:00	2,41	0,03	
CANF/GP04533	15/05/2024	SED-03GSO-RP02	PONTE DA SAUDE	RUA FELIPE CAMARÃO	é necessário repor o asfalto. duas medidas: 1,0 x 1,0. E 6,0x 0,30	MEDIDAS: 7,00 x 0,50	00:40:00	3,50	0,09	
CANF/GSO21786	08/05/2024	SED-03GSO-RP05	JARDINLÂNDIA	RUA FRANCISCA PRIMO QUEIROZ, 99	repor asfalto 0.70x0.70	MEDIDAS: 0,90 x 0,70	00:30:00	0,63	0,02	
CANF/GSO31596	02/05/2024	SED-03GSO-RP03	VARGINHA	RUA LEONINO DUTRA	REPOR ASFALTO - MEDIDAS A CONFERIR	MEDIDAS: 8,00 x 1,10	01:30:00	8,80	0,10	
CANF/GSO30301	02/05/2024	SED-03GSO-RP04	PRADO	RUA BENJAMIN CONSTANT, 1117	repor asfalto, 4.70x2.80	MEDIDAS: 4,20 x 2,60	02:00:00	10,92	0,09	
CANF/GSO33145	12/05/2024	SED-03GSO-RP04	PAISSANDÚ	RUA TRAJANO DE ALMEIDA, 20	repor asfalto de 1.00x1.00	MEDIDAS: 1,00 x 1,00	00:15:00	1,00	0,07	
CANF/GSO32048	03/05/2024	SED-03GSO-RP05	LUMIAR	ESTRADA DOS PEÕES	reposição de asfalto 1.00 x100	MEDIDAS: 5,20 x 2,20	05:30:00	11,44	0,03	
CANF/GSO31804	04/05/2024	SED-03GSO-RP03	BELA VISTA	RUA ACRE, 33	Necessário repor asfalto que afundou, 2.00 X 1.50	MEDIDAS: 2,00 x 1,50	01:15:00	3,00	0,04	
CANF/GSO32651	09/05/2024	SED-03GSO-RP04	CAMPO DO COELHO	RUA ROGÉRIO STUTZ PEREIRA, 5	Asfalto. 1.50x1.50	MEDIDAS: 1,80 x 1,60	01:20:00	2,88	0,04	
CANF/GSO32584	09/05/2024	SED-03GSO-RP04	CAMPO DO COELHO	RUA ROGÉRIO STUTZ PEREIRA	Asfalto. 1.50x1.50	MEDIDAS: 1,50 x 1,50	00:30:00	2,25	0,08	
CANF/GSO25833	10/05/2024	SED-03GSO-RP03	RIOGRANDINA	RUA MANOEL RODRIGUES DE FREITAS, 72	REPOR ASFALTO: 2M X 1M/ LEANDRO CASSIANO	MEDIDAS: 2,00 x 1,00	01:07:00	2,00	0,03	
CANF/GSO33009	10/05/2024	SED-03GSO-RP05	BELA VISTA	RUA PARAIBA, 218	asfalto 1.00x0.80	MEDIDAS:1,10 x 1,10	00:23:00	1,21	0,05	
CANF/GSO33892	15/05/2024	SED-03GSO-RP01	RIVO TORTO	RUA DELCINA MONTEIRO, 20	repor asfalto, 1.30x1.20	MEDIDAS: 1,30 x 1,30	01:00:00	1,69	0,03	
CANF/GSO32287	07/05/2024	SED-03GSO-RP01	JARDIM OURO PRETO	AVENIDA NOSSA SENHORA DO AMPARO	asfalto 1.00x0.50	MEDIDAS: 0,80 x 0,40	00:30:00	0,32	0,01	

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M² por minu
CANF/GSO32362	08/05/2024	SED-03GSO-RP01	TIO DONGO	RUA JOAQUIM DA ROSA PINHEIRO, 441	REFAZER ASFALTO QUE SOLTOU, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,80 X 1,50. SERVIÇO EM FRENTE AO NÚMERO 441, FOTO EM ANEXO.	MEDIDAS: 10,80 x 2,20	05:50:00	23,76	0,07
CANF/GSO32518	08/05/2024	SED-03GSO-RP04	CAMPO DO COELHO	RUA ROGERIO STUTZ PEREIRA, 46	REPOR ASFALTO - MEDIDAS: 1,00 X 1,00 EQUIPE LUCAS PECLÍ NUMERO 46	MEDIDAS: 1,00 x 1,00	00:50:00	1,00	0,02
CANF/GSO30718	09/05/2024	SED-03GSO-RP03	BRAUNES	RUA PROFESSOR WORMS DE CARVALHO BASTOS, 158	asfalto frio 4.00 x 2.00 RECOLHER PARALELOS NO LOCAL	MEDIDAS: 4,00 x 2,50	02:30:00	10,00	0,07
CANF/GSO31719	09/05/2024	SED-03GSO-RP05	SOLARES	RUA DR RENATO ARNALDO SILVEIRA LOPES, 541	pavimento asfalto frio medida 3.70x2.30 número 541	MEDIDAS: 3,00 x 2,50	01:13:00	7,50	0,10
CANF/GSO32923	10/05/2024	SED-03GSO-RP05	CÔNEGO	RUA MANOEL JOSÉ DA CUNHA, 71	pavimento asfalto frio medida 1.70x0.40 número 71	MEDIDAS: 1,70 x 0,40	00:15:00	0,68	0,05
CANF/GSO32773	10/05/2024	SED-03GSO-RP02	ALTO DE OLARIA	TRAVESSA JARDIM PRIMAVERA	REPOR ASFALTO 4,50 x 1,20 - 1,70 x 1,20 - 2,70 X 1,20 - 2,30 X 1,60 - JOILSON	MEDIDAS: 13,00 x 1,60	03:00:00	20,80	0,12
CANF/GSO28584	15/05/2024	SED-03GSO-RP04	ROSA BRANCA	RUA VININO FERNANDES RIBEIRO, 7	asfalto 110 120	MEDIDAS: 1,80 x 1,50	00:45:00	2,70	0,06
CANF/GP05204	08/05/2024	SED-03GSO-RP02	VARGINHA	RUA LUCIO ANTUNES NOGUEIRA, 94	repor asfalto 2.00x0.40	MEDIDAS: 2,00 x 0,50	00:20:00	1,00	0,05
CANF/GSO31453	13/05/2024	SED-03GSO-RP03	NOVA ESPERANÇA	RUA RICARDO DOS SANTOS, 9	pavimento asfalto frio medida 1.80x1.00 número 09	MEDIDAS: 1,80 x 1,00	00:40:00	1,80	0,05
CANF/GSO31795	02/05/2024	SED-03GSO-RP04	ALTO DE OLARIA	RUA GUAPORÉ, 25	Necessário repor asfalto que afundou, medidas 2.00 X 0.60	MEDIDAS: 2,00 x 0,60	00:44:00	1,20	0,03
CANF/GSO20158	09/05/2024	SED-03GSO-RP04	CAMPO DO COELHO	RUA HERONINDO JOSE DA ROSA, 13	pavimento asfalto frio medida 4.00x1.50 número 01	MEDIDAS: 4,00 x 2,00	01:13:00	8,00	0,11
CANF/GSO30101	15/05/2024	SED-03GSO-RP05	CONSELHEIRO PAULINO	RUA THEOFILO OTONI, 70	Repor asfalto - mediadas aproximadas: 1,50 x1,50	MEDIDAS: 1,20 x 1,30	00:50:00	1,56	0,03
CANF/GSO23206	07/05/2024	SED-03GSO-RP03	CONSELHEIRO PAULINO	RUA AVELINO DA ROSA PINHEIRO, 12	repor ASFALTO 4,60 x 2,40/adriano - NECESSÁRIO RETRO	MEDIDAS: 4,60 x 2,40	02:28:00	11,04	0,07
CANF/GSO32415	07/05/2024	SED-03GSO-RP04	ALTO DE OLARIA	RUA AMAPA, 22	necessário repor asfalto de 1.50 X 1.00 em frente o número 22	MEDIDAS: 1,50 x 1,00	00:15:00	1,50	0,10
CANF/GSO31815	06/05/2024	SED-03GSO-RP01	PONTE DA SAUADE	RUA JOSE PEDRO FERREIRA, 3	REPOR ASFALTO - Nº 3 - MEDIDAS: 1,00 X 1,00 - 2,60 X 1,20 - FERNANDO	MEDIDAS: 1,60 x 1,20 e 1,40 x 1,50 e 1,20 x 1,10	02:20:00	5,34	0,04
CANF/GSO28084	13/05/2024	SED-03GSO-RP03	PARQUE D. JOÃO VI	ALAMEDA DO LAGO, 316	Necessário repor asfalto que afundou, medidas 6.00 X 0.40	MEDIDAS: 6,00 x 0,40	01:00:00	2,40	0,04
CANF/GSO33330	14/05/2024	SED-03GSO-RP01	SITIO SÃO LUIS	RUA VER ARISTÃO JACCOUD, 695	repor asfalto de 1.00x1.00	MEDIDAS: 1,80 x 1,30	01:00:00	2,34	0,04
CANF/GSO33317	14/05/2024	SED-03GSO-RP05	CALIFÓRNIA	RUA ANTONIO SUAID, 157	Asfalto 1.50 X 1.20 . próximo ao 157.	MEDIDAS: 1,50 x 1,50	01:15:00	2,25	0,03
CANF/GSO27504	09/05/2024	SED-03GSO-RP01	BELA VISTA	RUA PARÁ, 11	necessário repor asfalto de 0.80 X 0.60 em frente a oficina de moto na viela ao lado do número 11 na rua para	MEDIDAS: 1,20 x 0,60	00:40:00	0,72	0,02
CANF/GSO28445	10/05/2024	SED-03GSO-RP01	ALTO DE OLARIA	RUA PURUS, 41	repo asfalto, 1.70x0.50	MEDIDAS: 1,80 x 0,50	01:14:00	0,90	0,01
CANF/GSO26711	10/05/2024	SED-03GSO-RP03	RIOGRANDINA	RUA MANOEL RODRIGUES DE FREITAS, 72	repor asfalto de 0.50x0.40	MEDIDAS: 1,00 x 0,50	00:10:00	0,50	0,05
CANF/GSO33523	15/05/2024	SED-03GSO-RP02	RUI SANGLARD	RUA ERNESTINA MEDEIROS BOM, 176	pavimento asfalto frio medida 2.00x1.00 número 176	MEDIDAS: 3,00 x 1,20	00:30:00	3,60	0,12
CANF/GSO32617	08/05/2024	SED-03GSO-RP02	TIO DONGO	RUA JOAQUIM DA ROSA PINHEIRO	REPOR ASFALTO, MEDIDAS APROXIMADAS: 9,00 X 1,50	MEDIDAS: 10,50 x 2,20	00:30:00	23,10	0,77
CANF/GSO21699	13/05/2024	SED-03GSO-RP01	ROSA BRANCA	RUA JEAN JOSEPH COSANDEV, 25	repor asfalto de 1.20x1.00 enfrente ao número 25.	MEDIDAS: 1,20 x 1,00	00:40:00	1,20	0,03
CANF/GSO31807	02/05/2024	SED-03GSO-RP01	BARROSO	ESTRADA AMPARO ALECRIM, 459	repor asfalto enfrente ao condominio. MEDIDAS APROXIMADOS: 8,00 X 0,30	MEDIDAS: 5,00 x 0,20 e 1,10 x 1,00	01:10:00	9,00	0,13
CANF/GSO32130	04/05/2024	SED-03GSO-RP03	OLARIA	RUA VICENTE SOBRINHO, 98	rua de asfalto frio com duas medidas deferente a primeira 2.00x2.00 a segunda 3.00x1.10	MEDIDAS: 2,00 x 2,00 e 3,00 x 1,10	00:25:00	7,30	0,29
							60:42:00	236,55	3,71



































































































