

Nova Friburgo, 30 de janeiro de 2023.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório de Serviços de Recuperação de Vias – 18/12/2022 a 31/12/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilhas e relatórios fotográficos referentes aos dias 18/12/2022 a 31/12/2022.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-055/2023-SUP
DSSM-td

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/12/2022 a 24/12/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3350836	19/12/2022	16 - 03PV03	LAGOA SECA	ADRIANA LIMA SANGLARD, 1, 28634070	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 3,50 X 0,60 - RETIRAR 1 CARRINHO DE ENTULHO	EXECUTADO MEDIDAS: 2,20X2,00 E 1,20X1,00 POR MARCO AURELIO, ALEXANDRO E RONEY EM 19/12/22	00:50:00	5,60	0,11
3345468	19/12/2022	13 - 03PV01	MURY	WALTER MACHADO THEDIN MURY, 28615315	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,80 X 0,80	EXECUTADO RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,50X1,10 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ EM 19/12/22	00:45:00	1,65	0,04
3348028	19/12/2022	15 - 03PV02	SITIO SÃO LUIS	MARIO ANTONIO THURLER, 28621137	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,20 X 1,00	REPOSIÇÃO DE ASFALTO EXECUTADA MEDIDAS: 1,20 X 1,00 POR EDVANDRO, WESLEY E JOÃO EM 19/12/22	00:29:00	1,20	0,04
3342331	19/12/2022	13 - 03PV01	NOVA ESPERANÇA	RUA ARTHUR LIMA, 6, 28630498	REPOR ASFALTO: 0,60 X 0,60	EXECUTADO RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 0,60X0,60 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ EM 19/12/22	00:30:00	0,36	0,01
3351278	19/12/2022	16 - 03PV03	RIOGRANDINA	RUA CAP BENTO JOSÉ VELOSO, 0, 28634340	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,40 X 1,00 MEIO FIO 1,00 X 0,60	EXECUTADO RECUPERAÇÃO EM ASFALTO MEDIDAS 1,40 X 1,00 MEIO FIO 1,00 X 0,60 POR MARCO AURELIO, ALEXANDRO E RONEY EM 19/12/22	00:11:00	2,00	0,18
3351338	19/12/2022	13 - 03PV01	CAMPO DO COELHO	ROGERIO STUTZ PEREIRA, 840, 28630596	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 0,60 X 0,60	EXECUTADO RECUPERAÇÃO NO ASFALTO MEDIDAS: 1,00X1,00 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ EM 19/12/22	00:25:00	1,00	0,04
3347338	19/12/2022	16 - 03PV03	FLORESTA	RUA SOLIMÕES, 72, 28634060	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,00 X 1,10 ... 1,00 X 0,20	EXECUTADO RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 3,00 X 2,00 POR MARCO AURELIO, ALEXANDRO E RONEY EM 19/12/22	00:45:00	6,00	0,13
3342298	20/12/2022	15 - 03PV02	JARDINLÂNDIA	FRANCISCA PRIMO QUEIROZ, 99, 28633240	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,20 X 0,70	EXECUTADA RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,40X1,10 POR EDVANDRO, WESLEY E JOÃO EM 20/12/22	00:36:00	1,54	0,04
3340983	20/12/2022	15 - 03PV02	RUI SANGLARD	JOSE POLETTI, 130, 28635567	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 0,90 X 0,80	EXECUTADA RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,20X1,00 POR EDVANDRO, WESLEY E JOÃO EM 20/12/22	00:35:00	1,20	0,03
3347399	20/12/2022	16 - 03PV03	ALTO DE OLARIA	SAO JOAO DE MERITI, 141, 28623750	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 4,00 X 1,60	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 6,00 X 2,00. EM 20/12/2022. POR MARCO AURELIO/RONEY/ALEXANDRO.	01:35:00	12,00	0,13
3351212	20/12/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 31, 28634060	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,60 X 0,90	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,60 X 1,60. EM 20/12/2022. POR ADÃO/GILSON/PABLO.	01:00:00	4,16	0,07
3343384	21/12/2022	16 - 03PV03	NOVA ESPERANÇA	RICARDO SANTOS, 28630394	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS; 2,00 X 1,00	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 1,00. EM 21/12/2022. POR MARCO AURELIO/RONEY/ALEXANDRO.	00:23:00	2,00	0,09
3350081	21/12/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 30, 28634060	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 1,00	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS: 2,00 X 1,20 EM 21/12/22 POR ADAO/GILSON/PABLO.	00:30:00	2,40	0,08

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3351440	21/12/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 39, 28634060	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,70 X 0,60 X 0,40	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS: 2,00 X 1,50 EM 21/12/22 POR ADAO/GILSON/PABLO.	00:35:00	3,00	0,09
3351209	21/12/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 67, 28634060	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 0,80 X 0,80 X 2,00	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS: 1,30 X 0,90 EM 21/12/22 POR ADAO/GILSON/PABLO.	00:40:00	1,17	0,03
3352659	21/12/2022	16 - 03PV03	CENTRO	PROF MENEZES WANDERLEY, 28610080	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,30 X 1,00	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 1,50. EM 21/12/2022. POR MARCO AURELIO/RONEY/ALEXANDRO.	00:20:00	2,25	0,11
3341509	21/12/2022	17 - 03PV04	FAZENDA DA LAGE	LEOPOLDINA PINEL GARCIA, 15, 28633550	ASFALTO ANTIGO QUE AFUNDOU, VERIFICADO PELO FERNANDO, MEDIDAS: 1,60 V 1,40 / 4,50 X 0,30 / 1,60 X 0,60 / 4,00 X 0,30	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS: 1,60 X 1,40 / 4,50 X 0,30 / 1,60 X 0,60 / 4,00 X 0,30 EM 21/12/22 POR ADAO/GILSON/PABLO.	00:35:00	5,75	0,16
3349919	22/12/2022	15 - 03PV02	NOVA SUÍÇA	JOSE BARROSO, 423, 28605727	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 2,00 X 0,50 / 2,00 X 0,40	FOI EXECUTADO O CORTE DE ASFALTO. MEDIDAS: 7,10 X 1,90. EM 22/12/2022. POR LEANDRO/JOÃO/WESLEY.	01:55:00	13,49	0,12
3352752	22/12/2022	6 - 02AG02	CORDOEIRA	PREF AMANCIO AZEVEDO CORDOEIRA, 3, 28613710	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 10M X 1,30	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS: 10,00 X 1,30 EM 22/12/22 POR MARCO ANTONIO/HUMBERTO.	00:20:00	13,00	0,65
3337245	22/12/2022	16 - 03PV03	NOVA ESPERANÇA	RUA RICARDO SANTOS, 272, 28630394	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,50 X 2,50	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,50 X 3,50 - 3,00 X 2,00. EM 22/12/2022. POR LEANDRO/JOÃO/WESLEY.	01:48:00	21,75	0,20
3351471	22/12/2022	16 - 03PV03	NOVA ESPERANÇA	RICARDO SANTOS, 261, 28630394	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,10 X 0,50	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,30 X 1,00. EM 22/12/2022. POR LEANDRO/JOÃO/WESLEY.	00:15:00	1,30	0,09
3351479	22/12/2022	16 - 03PV03	NOVA ESPERANÇA	RICARDO SANTOS, 3, 28630394	MEDIDAS 0,50 X 0,50 E 0,50 X 0,50	FOI EXECUTADO O CORTE DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 0,50 EM 22/12/2022. POR LEANDRO/JOÃO/WESLEY.	00:20:00	0,50	0,03
3341681	23/12/2022	17 - 03PV04	BRAUNES	FROSSARD, 28611330	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 4,40 X 1,50	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 4,40 X 1,50 EM: 23/12/2022 POR: GILSON E PABLO	02:00:00	6,60	0,06
3354197	23/12/2022	15 - 03PV02	ALTO DE OLARIA	FOLLY, 24, 28623780	MEDIDAS 0,80 X 0,40	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 0,80 X 0,40 EM: 23/12/2022 POR: EDVANDRO, WESLEY E JOÃO	00:20:00	0,32	0,02
3354199	23/12/2022	15 - 03PV02	ALTO DE OLARIA	FOLLY, 28, 28623780	MEDIDAS A CONFERIR	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 2,30 X 1,20 EM: 23/12/2022 POR: EDVANDRO, WESLEY E JOÃO	00:45:00	2,76	0,06
3354195	23/12/2022	15 - 03PV02	ALTO DE OLARIA	FOLLY, 34, 28623780	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 3,00 X 1,50	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 2,00 X 1,00 EM: 23/12/2022 POR: EDVANDRO, WESLEY E JOÃO	00:17:00	2,00	0,12
3353431	23/12/2022	16 - 03PV03	CONSELHEIRO PAULINO	LAFAYETE BRAVO, 28633490	REPOR ASFALTO: 3,30 X 3,30	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 4,10 X 4,00 EM: 23/12/2022 POR: MARCOS, RONEY E ALEXANDRO	01:45:00	16,40	0,16

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3354272	23/12/2022	15 - 03PV02	GRANJA DO CÉU	REGINA AZEVEDO, 28621112	MEDIDAS A CONFERIR	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS : 7,00 X 0,80 EM: 28/12/2022 POR: EDVANDRO, WESLEY E JOÃO	00:18:00	5,60	0,31
							20:47:00	137,00	3,19











































MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/12/2022 a 24/12/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3355345	26/12/2022	10 - 02ES04	VILA AMÉLIA	EUGENIO MONTECHIARI, 28625610	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS: 1,00 X 1,00 EM 26/12/22 POR MAXWELL/JOSUÉ	00:25:00		0,00
3340917	27/12/2022	17 - 03PV04	OLARIA	PRES VARGAS, 139, 28623410	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO AFUNDADO, MEDIDAS APROXIMADAS: 4M X 2M	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 4,00 X 2,00 E 1,70 X 1,20 EM: 29/12/2022 POR: ADAO, GILSON E PABLO	00:14:00		0,00
3356014	27/12/2022	13 - 03PV01	VALE DO SOL	NSA DO AMPARO VALE DO SOL, 28635010	MEDIDAS A CONFERIR.	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,20 X 0,80 E 0,40 X 0,80 E 0,60 X 0,80 E 0,70 X 0,80 E 0,50 X 0,80 E 1,30 X 0,80 EM: 27/12/2022 POR: LEANDRO, MARCELO E LUIZ	01:50:00		0,00
3356160	27/12/2022	13 - 03PV01	SOLARES	DR RENATO ARNALDO SILVEIRA LOPES, 17, 28630342	MEDIDAS A CONFERIR.	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 3,30 X 2,20 EM: 27/12/2022 POR: LEANDRO, MARCELO E LUIZ	01:20:00		0,00
3354798	28/12/2022	17 - 03PV04	SÃO CRISTÓVÃO	DIOGO FRANCISCO COMBAT, 6, 28633067	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,20 X 1,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,20 DATA: 28/12/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	00:35:00		0,00
3352905	28/12/2022	17 - 03PV04	SÃO CRISTÓVÃO	DIOGO FRANCISCO COMBAT, 103, 28633067	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,80 X 1,40 DATA: 28/12/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	00:55:00		0,00
3356347	28/12/2022	13 - 03PV01	CANTO DO RIACHO	NIVEO BADINI THOMAS, 70, 28633768	MEDIDAS A CONFERIR (GRANDE).	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,10 X 2,90 DATA: 28/12/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	01:40:00		0,00
3356266	28/12/2022	15 - 03PV02	CÔNEGO	BR DE LUCENA, 28621020	MEDIDAS A CONFERIR, LOCAL ONDE PASSOU A REDE NOVA COM FALHA NO ASFALTO, CORRER A RUA TODA.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 1,60 / 1,60 X 1,70 DATA: 28/12/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E JOÃO.	01:44:00		0,00
3357327	28/12/2022	16 - 03PV03	SÃO JORGE	MIGUEL CORREA DA SILVA, 38, 28633590	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 1,50 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,50 DATA: 28/12/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:30:00		0,00
3357479	28/12/2022	16 - 03PV03	SÃO JORGE	MIGUEL CORREA DA SILVA, 40, 28633590	MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,20 DATA: 28/12/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:21:00		0,00
3353539	28/12/2022	16 - 03PV03	TIO DONGO	JOAQUIM DA ROSA PINHEIRO, 585, 28633790	MANUTENÇÃO ESGOTO, MEDIDAS: 1,50 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 0,70 DATA: 28/12/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:26:00		0,00
3357387	28/12/2022	15 - 03PV02	NOVA SUÍÇA	MOISES DE MORAIS FILHO, 25, 28605736	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,00 DATA: 28/12/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E JOÃO.	00:40:00		0,00
3357260	28/12/2022	17 - 03PV04	PONTE DA SAUDE	JOSE PEDRO FERREIRA, 9, 28615210	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 1,50 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,00 DATA: 28/12/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	01:00:00		0,00

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3357306	29/12/2022	17 - 03PV04	JARDINLÂNDIA	RIO NOVO, 27, 28633290	MANUTENÇÃO ESGOTO, MEDIDAS: 6,00 X 1,20	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 6,00 X 1,20 EM: 29/12/2022 POR: ADÃO, GILSON E PABLO	02:35:00		0,00
3357388	29/12/2022	16 - 03PV03	ALTO DE OLARIA	CANDIDO PARDAL, 18, 28620200	MEDIDAS A CONFERIR (GRANDE).	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 3,20 X 1,20 E 5,00 X 2,60 E 3,00 X 1,50 EM: 27/12/2022 POR: MARCOS, ALEXANDRO E RONEY	03:20:00		0,00
3357207	29/12/2022	15 - 03PV02	NOVA SUÍÇA	SALVADOR DA ROSA CANTO, 28605730	MANUTENÇÃO ESGOTO, MEDIDAS: 3,50 X 1,50	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 3,50 X 1,50 EM: 29/12/2022 POR: EDVANDRO, WESLEY E JOÃO	03:00:00		0,00
3358357	30/12/2022	13 - 03PV01	ALTO DE OLARIA	PRES BACKER, 28620240	MEDIDAS A CONFERIR.	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 2,90 X 1,80 EM: 30/12/2022 POR: LEANDRO, MARCELO E LUIZ	01:00:00		0,00
3350035	30/12/2022	16 - 03PV03	FLORESTA	PROF EDMOND TEIXEIRA SIMAO, 180, 28633623	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 2,40 X 2,00	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 2,40 X 2,00 EM: 30/12/2022 POR: MARCO, RONEY E ALEXANDRO	00:55:00		0,00
3350032	30/12/2022	16 - 03PV03	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 4, 28634060	PERDAS, ÁGUA, MEDIDAS: 1,00 X 1,00	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,50 X 1,50 EM: 30/12/2022 POR: MARCO, RONEY E ALEXANDRO	00:33:00		0,00
3358877	30/12/2022	13 - 03PV01	CASCATINHA	ENG SERGIO MAGALHAES DOS S CABRAL, 28621465	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,60 X 1,00	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,40 X 1,10 EM: 30/12/2022 POR: LEANDRO, MARCELO E LUIZ	00:50:00		0,00
3359502	31/12/2022	15 - 03PV02	CENTRO	MONS MIRANDA, 28610230	MEDIDAS A CONFERIR	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO SOMENTE EM TORNO DA PLACA DE FERRO CONFORME ORIENTAÇÃO DE MARCOS REZENDE EM: 31/12/2022 POR: EDVANDRO, WESLEY E JOÃO	00:23:00		0,00
3358402	31/12/2022	15 - 03PV02	BRAUNES	MANOEL ANTUNES NOGUEIRA, 777, 28611180	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 4,00 X 1,50	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 4,00 X 1,50 EM: 01/01/2023 POR: EDVANDRO, WESLEY E JOÃO	01:53:00		0,00
							26:09:00	0,00	0,00



































Nova Friburgo, 06 de dezembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Secretaria Geral de Governo
Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho
Av. Alberto Braune, 225 - Centro
Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 20/11/2022 a 26/11/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 20/11/2022 a 26/11/2022.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-684/2022-SUP
DSSM-td

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/11/2022 a 26/11/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3333697	20/11/2022	13 - 03PV01	NOVA SUÍÇA	MOISES DE MORAIS FILHO, 17, 28605736	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 0,70 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,90 X 0,90 DATA: 20/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E GILSON.	00:30:00	0,81	0,03
3331064	21/11/2022	16 - 03PV03	ALTO DE OLARIA	PEDRO HUGO FOLLY, 78, 28620260	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 DATA: 21/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	00:25:00	1,00	0,04
3334409	21/11/2022	15 - 03PV02	ROSA BRANCA	RUA VININO FERNANDES RIBEIRO, 243, 28633633	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,10 X 1,10 E 1,40 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,10 X 1,10 / 1,40 X 1,00 DATA: 21/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	01:05:00	2,61	0,04
3326653	21/11/2022	15 - 03PV02	ALTO DE OLARIA	PRES MANOEL DUARTE, 21, 28623500	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 2,40 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,40 X 0,70 DATA: 21/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:36:00	1,68	0,05
3332892	22/11/2022	13 - 03PV01	SANTA INES	ANTONIO ROQUE DE ALMEIDA, 33, 28633315	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 DATA: 22/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	00:35:00	1,00	0,03
3335232	22/11/2022	13 - 03PV01	ROSA BRANCA	VININO FERNANDES RIBEIRO, 7, 28633633	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 DATA: 22/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	00:35:00	1,00	0,03
3333113	22/11/2022	16 - 03PV03	BELA VISTA	ESPIRITO SANTO, 18, 28623360	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 8,00 X 0,50 E 2,20 X 1,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 14,60 X 1,90 DATA: 22/11/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	02:44:00	27,74	0,17
3332323	23/11/2022	17 - 03PV04	TIO DONGO	JOAQUIM DA ROSA PINHEIRO, 386, 28633790	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,00 X 0,50 0,80 X 0,80 RETIRAR 3 CARRINHOS DE ENTULHO.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,50 / 0,80 X 0,80 E 3 CARRINHOS DE ENTULHO. DATA: 23/11/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	00:50:00	1,14	0,02
3332933	23/11/2022	15 - 03PV02	VARGEM GRANDE	RUA PROF EURIPEDES VIEIRA DE CASTILHO, 173, 28621303	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 1,70 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,70 X 0,60 DATA: 23/11/2022 POR JOSÉ HELENO, WESLEY E THIAGO.	00:46:00	1,02	0,02
3335284	23/11/2022	15 - 03PV02	SITIO SÃO LUIS	ACYREMA VASSALO DE AZEVEDO, 100, 28621139	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 0,90 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,90 X 0,90 DATA: 23/11/2022 POR JOSÉ HELENO, WESLEY E THIAGO.	01:00:00	0,81	0,01
3335958	23/11/2022	15 - 03PV02	CALIFÓRNIA	ALCINDO ALVES DOS REIS, 369, 28633730	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,30 X 1,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,30 X 1,30 DATA: 23/11/2022 POR JOSÉ HELENO, WESLEY E THIAGO.	00:32:00	1,69	0,05
3334590	23/11/2022	17 - 03PV04	BAIRRO DO GIRASSOL	JABOATAO, 2428, 28630320	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 3,00 X 3,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 3,00 DATA: 23/11/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	01:30:00	9,00	0,10
3326762	23/11/2022	16 - 03PV03	BRAUNES	VISC DE ITABORAI, 832, 28611230	ESGOTO, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE SOLTOU E AFUNDOU, MEDIDAS: 2,50 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,50 X 0,70 DATA: 23/11/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:32:00	1,75	0,05

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3332067	25/11/2022	15 - 03PV02	LAGOA SECA	ESTRADA MTO JOAQUIM NAEGLE LAGOA SECA, 147, 28633520	R REPOR PAVIMENTO EQUIPE RAFAEL / REGINALDO ... 0,40 X	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,60 X 0,50 DATA: 25/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E THIAGO.	00:33:00	0,30	0,01
3332069	25/11/2022	15 - 03PV02	LAGOA SECA	ESTRADA MTO JOAQUIM NAEGLE LAGOA SECA, 7, 28633520	FAVOR REPOR PAVIMENTO EQUIPE REGINALDO / MAXWELL ... 0,50 X 0,50 ...	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,50 X 0,50 DATA: 25/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E THIAGO.	00:27:00	0,25	0,01
3332073	25/11/2022	15 - 03PV02	LAGOA SECA	ESTRADA MTO JOAQUIM NAEGLE LAGOA SECA, 8, 28633520	FAVOR REPOR ASFALTO EQUIPE REGINALDO / MAXWELL ... 2,00 X 1,50 ...	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,50 DATA: 25/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E THIAGO.	00:28:00	3,00	0,11
							13:08:00	54,80	0,77
























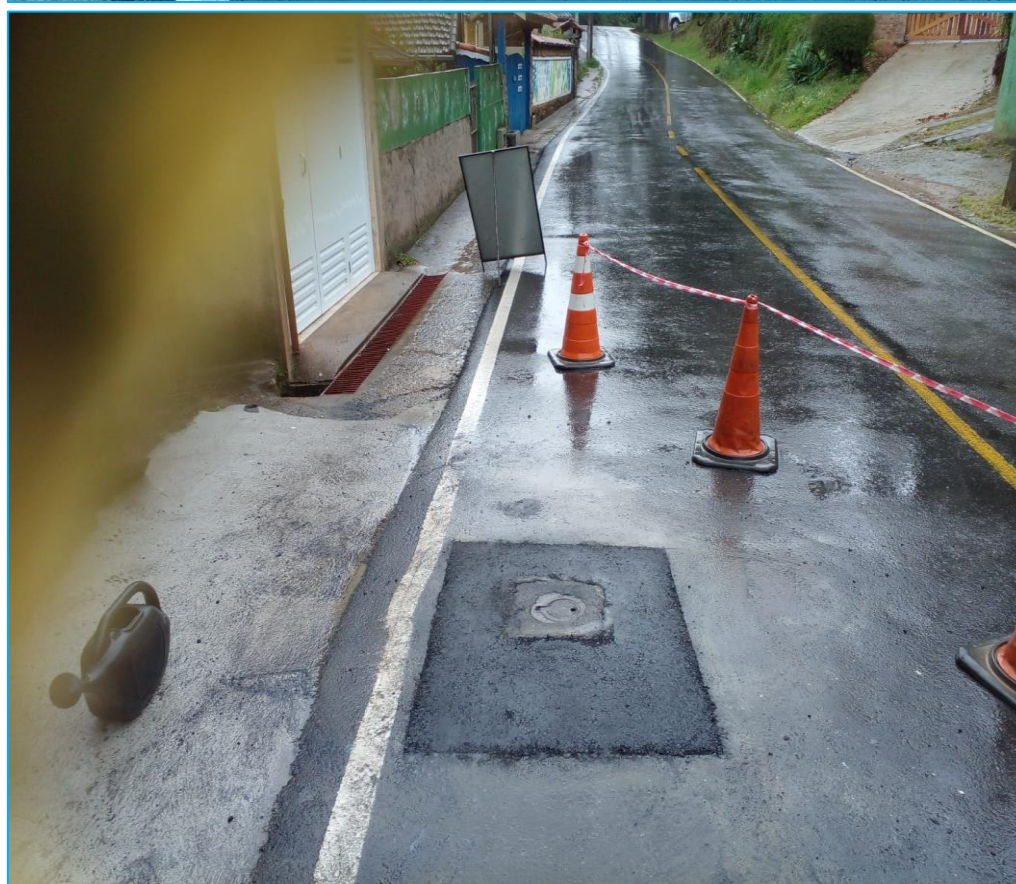



Nova Friburgo, 04 de março de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 21/02/2022 a 25/02/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 21/02 a 25/02/2022.

Respeitosamente,



Engº João Henrique Tebyriça de Sá
Diretor

C-126/2022-SUP
JHTS-td

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2022 a 25/02/2022		
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Medidas
3156167	24/02/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 8,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 8,50 X 3,50 EM 23/02/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	29,75
3168911	23/02/2022	26 - 02AG08	MEDIDAS A CONFERIR	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 1,50 E 2,00 X 2,00 EM 22/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - THIAGO	6,25
3165962	23/02/2022	26 - 02AG08	ÁGUA, MANUTENÇÃO, DOIS PONTOS PARA REPOR ASFALTOS QUE SOLTARAM, MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 0,60 E 1,00 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 X 0,60 E 1,00 X 0,80 EM 22/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - THIAGO	1,28
3170627	03/03/2022	26 - 02AG08	ÁGUA, MANUTENÇÃO, RECORTAR E REFAZER ASFALTO TRINCADO	SERVIÇO EXECUTADO. DATA: 25/02/2022 POR PABLO E ARECILDO.	
3170624	03/03/2022	26 - 02AG08	ÁGUA, MANUTENÇÃO, RECORTAR E REPOR ASFALTO NO LOCAL AONDE ESTÁ SENDO ABERTO PELO RONALDO.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 5,00 X 1,00 X 1,00 DATA: 25/02/2022 POR PABLO E ARECILDO.	5,00
3166753	23/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,20 X 0,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS: 1,20 X 0,70 EM 21/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - HOMERO	0,84
3168963	23/02/2022	17 - 03PV04	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,70 X 1,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,70 X 1,30 EM 22/02/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	2,21
3169927	24/02/2022	26 - 02AG08	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 6,00 X 0,80 E 4,20 X 0,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 6,00 X 0,80 E 4,20 X 0,60 EM 23/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - THIAGO	7,32
3168318	25/02/2022	26 - 02AG08	ESGOTO, MANUTENÇÃO, REPOR ASFALTO QUE SOLTOU,	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,50 X 1,00 X 0,20 REGISTRADO EM FOTO EM 24/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - HOMERO	0,50
3166767	23/02/2022	26 - 02AG08	FAVOR REPOR PAVIMENTO EQUIPE JOSÉ REGINALDO / RENILDO ... 1,50 X 1,50 ...	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 1,50 EM 21/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - HOMERO	2,25
3164792	23/02/2022	26 - 02AG08	MEDIDAS A CONFERIR	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 1,00 EM 21/02/2022 POR DANIEL - HOMERO - THIAGO	2,00
3171275	03/03/2022	26 - 02AG08	ESGOTO, MANUTENÇÃO, REPOR NOVA CAMADA DE ASFALTO AONDE AFUNDOU.	SERVIÇO EXECUTADO. DATA: 25/02/2022 POR DANIEL, THIAGO E HOMERO.	
3168348	24/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,90 X 1,10	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,90 X 1,10 EM 23/02/2022 DANIEL - THIAGO - THIAGO	2,09
3166148	24/02/2022	26 - 02AG08	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REPOR ASFALTO QUE SOLTOU EM DOIS PONTOS.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,50 X 1,10 X 0,70 EM 23/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - THIAGO	1,93
3164570	23/02/2022	17 - 03PV04	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 5,30 X 1,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 5,30 X 1,30 EM 22/02/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	6,89
3166256	25/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,70 X 1,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,70 X 1,20 EM 24/02/2022 POR DANIEL - HOMERO - THIAGO	2,04
3167556	23/02/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,20 X 1,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,20 EM 22/02/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	1,44

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Medidas
3168234	23/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,30 X 1,10	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,30 X 1,10 EM 22/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - THIAGO	1,43
3168252	23/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2,00 X 2,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 2,00 EM 21/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - HOMERO	4,00
3170095	24/02/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS A CONFERIR	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 1,00 + 0,80 X 0,80 E 0,80 X 0,80 EM 23/02/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	3,28
3168351	24/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,30 X 1,10	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,30 X 1,10 EM 23/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - THIAGO	1,43
3170326	25/02/2022	26 - 02AG08	REPOR ASFALTO NO LOCAL: 1,20 X 1,20/1,20 X 1,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,20 E 1,20 X 1,20 REGISTRADO EM FOTO EM 24/02/2022 POR DANIEL - HOMERO - THIAGO	2,88
3166949	23/02/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 EM 22/02/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	1
3161700	23/02/2022	26 - 02AG08	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 6,00 X 1,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 6,00 X 1,20 EM 22/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - THIAGO	7,2
3168359	25/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 1,20 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 EM 24/02/2022 POR DANIEL - HOMERO - THIAGO	1,2
3168319	25/02/2022	26 - 02AG08	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REPOR ASFALTO QUE SOLTOU,	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. REGISTRADO EM FOTO EM 24/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - HOMERO	
3164418	23/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,10 X 0,70 - MEDIDAS CORRETAS: 1,70 X 2,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,70 X 2,20 EM 21/02/2022 POR DANIEL - HOMERO - THIAGO	3,74
3165331	23/02/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 2,50 X 1,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 7,00 X 1,70 EM 22/02/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	11,9
3164303	23/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,50 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,50 X 0,50 EM 21/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - HOMERO	0,25
3168989	23/02/2022	26 - 02AG08	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 2,50 X 1,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,50 X 1,80 EM 22/02/2022 POR DANIEL - THIAGO - THIAGO	4,5
				TOTAL:	114,60











RUA URUGUAIANA
DATA: 21/02/2022

























RUA MATILDE QUEIROZ DA SILVA

DATA: 24/02/2022













Nova Friburgo, 01 de setembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório de Asfalto – 21/08/2022 a 27/08/2022.**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 21/08 a 27/08/2022.

Respeitosamente,



Engª Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-521/2022-SUP
DSSM-Inpc











































BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/08/2022 a 27/08/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3279971	25/08/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 1,40 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,80 X 1,40 EM 25/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:30:00		0,00
3278594	25/08/2022	16 - 03PV03	INVESTIMENTO ÁGUA, MEDIDAS: 4,50 X 0,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,50 X 0,40 EM 25/08/2022 POR MARCO - JOÃO - WESLEY	00:25:00		0,00
3277803	26/08/2022	13 - 03PV01	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 4,00 X 0,40 RETIRAR 4 CARRINHOS DE ENTULHO	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,10 X 0,50 EM 26/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - HUMBERTO	01:15:00		0,00
3277277	26/08/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,80 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 1,60 X 0,80 EM 26/08/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	00:46:00		0,00
3276634	26/08/2022	29 - 02PV01	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 0,90 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 0,90 X 0,80 EM 26/08/2022 POR ALEXANDRO - ARECIDLO - RONEY	00:35:00		0,00
3276178	22/08/2022	15 - 03PV02	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 EM 22/08/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	00:53:00		0,00
3276156	26/08/2022	13 - 03PV01	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 5,00 X 0,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,20 X 1,20 EM 26/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - HUMBERTO	01:30:00		0,00
3276056	26/08/2022	15 - 03PV02	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 EM 26/08/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	00:18:00		0,00
3276024	22/08/2022	13 - 03PV01	RETRABALHO, ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO AFUNDADO: 1,00 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 0,50 EM 22/08/2022 POR RONIMAR - JAQUES	00:55:00		0,00
3276014	22/08/2022	15 - 03PV02	RETRABALHO, ÁGUA, MANUTENÇÃO, NIVELAR ASFALTO AFUNDADO. - MEDIDAS: 1,50 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 1,00 EM 22/08/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	02:17:00		0,00

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3275979	24/08/2022	13 - 03PV01	NECESSARIO REPO PAVIMENTO ASFALTO 1,00 X 1,00 ... 2,50 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 E 2,50 X 0,50 EM 24/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - HUMBERTO	00:55:00	2,25	0,04
3274446	26/08/2022	29 - 02PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,40 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,60 X 1,60 EM 26/08/2022 POR ALEXANDRO - ARECILDO - RONEY	01:30:00	2,56	0,03
3274436	24/08/2022	17 - 03PV04	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 5,00 X 0,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 5,20 X 0,90 E 1,90 X 1,80 EM 24/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:35:00	8,10	0,09
3274420	22/08/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2,50 X 0,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,50 X 0,70 EM 22/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:15:00	1,75	0,02
3274413	23/08/2022	13 - 03PV01	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 3,20 X 1,20 E 1,70 X 0,70. RECOLHER 4 CARRINHOS.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,00 X 0,70 EM 23/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - HUMBERTO	01:50:00	2,10	0,02
3273943	24/08/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 1,20 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,40 X 1,15 EM 24/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - HUMBERTO	00:45:00	1,61	0,04
3273929	23/08/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 7,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE CALÇADA. MEDIDAS: 7,00 X 1,00 EM 23/08/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	02:50:00	7,00	0,04
3273923	25/08/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 3,00 X 3,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 0,40 EM 25/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - HUMBERTO	01:05:00	0,48	0,01
3273164	25/08/2022	15 - 03PV02	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 1,00 X 1,00 E 2,00 X 0,40	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS: 1,00 X 1,00 E 2,00 X 0,40 EM 25/08/22 POR EDIVANDRO/WESLEY/JOAO	01:43:00	1,80	0,02
3273160	23/08/2022	29 - 02PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 EM 23/08/2022 POR ALEXANDRO - ARECILDO - RONEY	01:13:00	1,00	0,01
3272439	23/08/2022	29 - 02PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,60 X 1,10	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,60 X 1,10 EM 23/08/2022 POR ALEXANDRO - ARECILDO - RONEY	01:22:00	1,76	0,02

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3271931	23/08/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,50 X 1,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 EM 23/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - HUMBERTO	01:05:00	1,00	0,02
3271331	22/08/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,90 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,90 X 0,80 EM 22/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:45:00	0,72	0,02
3269591	23/08/2022	29 - 02PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,50 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 X 0,80 EM 23/08/2022 POR ALEXANDRO - ARECILDO - RONEY	00:45:00	0,64	0,01
				TOTAL:	28:02:00	32,77	0,38

Nova Friburgo, 24 de novembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 23/10/2022 a 29/10/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 23/10/2022 a 29/10/2022.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-665/2022-SUP
DSSM-td

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/10/2022 a 29/10/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3316805	23/10/2022	17 - 03PV04	BELA VISTA	STA CATARINA, 5, 28623350	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,80 X 0,20	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS: 0,80 X 0,80 EM 23/10/22 POR JOSE HELENO/GILSON/JOAO	00:18:00	0,64	0,04
3317508	24/10/2022	16 - 03PV03	CÔNEGO	MANOEL JOSE DA CUNHA, 64, 28621100	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS À CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,60 X 1,30 / 1,70 X 1,30 DATA: 24/10/2022 POR MARCO AURELIO, RONEY E ALEXANDRO.	01:10:00	8,19	0,12
3317513	24/10/2022	16 - 03PV03	CÔNEGO	MANOEL JOSE DA CUNHA, 777, 28621100	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS À CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,00 DATA: 24/10/2022 POR MARCO AURELIO, RONEY E ALEXANDRO.	00:40:00	2,00	0,05
3315466	24/10/2022	15 - 03PV02	BOM JESUS	RUA THOMAZ, 66, 28605358	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,70 X 0,50 E 0,70 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,70 X 0,50 / 0,70 X 0,70 DATA: 24/10/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E JOÃO.	00:46:00	0,84	0,02
3317616	24/10/2022	16 - 03PV03	CÔNEGO	MANOEL JOSE DA CUNHA, 28621100	MEDIDAS 2,00 X 1,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,20 DATA: 24/10/2022 POR MARCO AURELIO, RONEY E ALEXANDRO.	00:35:00	2,40	0,07
3317557	24/10/2022	15 - 03PV02	BAIRRO DO GIRASSOL	JANDYRA B PERLINGEIROGIRASSOL, 28630320	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,00 X 1,40	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,40 DATA: 24/10/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E JOÃO.	00:52:00	2,80	0,05
3317619	24/10/2022	16 - 03PV03	GRANJA DO CÉU	REGINA AZEVEDO, 21, 28621112	MEDIDAS 1,50 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,50 DATA: 24/10/2022 POR MARCO AURELIO, RONEY E ALEXANDRO.	00:35:00	2,25	0,06
3315475	24/10/2022	13 - 03PV01	ALTO DE OLARIA	PRES BACKER, 28620240	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,40 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,40 X 0,70 E 4 CARRINHOS DE ENTULHO RECOLHIDOS. DATA: 24/10/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	00:50:00	0,98	0,02
3310765	24/10/2022	15 - 03PV02	LAGOA SECA	MTO JOAQUIM NAEGLER LAGOA SECA, 356, 28633520	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,30 X 0,40 - NECESSÁRIO PARE E SIGA	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,30 X 0,40 DATA: 24/10/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E JOÃO.	00:27:00	0,52	0,02
3318246	25/10/2022	13 - 03PV01	OLARIA	MANOEL LOURENÇO SOBRINHO, 75, 28623440	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,00 X 0,50 X 0,70.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,50 DATA: 25/10/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	00:20:00	0,50	0,03
3318231	26/10/2022	17 - 03PV04	BELA VISTA	STA CATARINA, 5, 28623350	NECESSÁRIO REFAZER ASFALTO MAL FEITO, MEDIDAS A CONFERIR, FOTO EM ANEXO.	SERVIÇO EXECUTADO. DATA: 26/10/2022 POR JOSÉ HELENO, THIAGO E GILSON.	00:43:00		
3316098	26/10/2022	15 - 03PV02	VILAGE	AFONSO SARDOU, 55, 28605200	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,20 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 DATA: 26/10/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E JOÃO.	00:27:00	1,20	0,04
3315408	26/10/2022	17 - 03PV04	GRANJA DO CÉU	REGINA AZEVEDO, 28621112	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,90 DATA: 26/10/2022 POR JOSÉ HELENO, THIAGO E GILSON.	01:05:00	0,90	0,01

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3315457	26/10/2022	15 - 03PV02	CENTRO	GRIPP, 18, 28613610	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 3,00 X 1,00 E MEIO FIO 0,60 X 0,40	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 1,00 DATA: 26/10/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E JOÃO.	00:51:00	3,00	0,06
3318211	26/10/2022	13 - 03PV01	VILAGE	ZAIR PIRES PIRAZZO, 80, 28605205	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 5,00 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,80 X 2,40 / 4,30 X 1,80 DATA: 26/10/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	03:55:00	16,86	0,07
3318930	26/10/2022	17 - 03PV04	NOVA ESPERANÇA	RICARDO SANTOS, 28630394	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2M X 2M	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 2,00 DATA: 26/10/2022 POR JOSÉ HELENO, THIAGO E GILSON.	01:16:00	4,00	0,05
3317575	26/10/2022	16 - 03PV03	PRADO	AVENIDA NSA DO AMPARO PRADO, 3596, 28635010	INVESTIMENTO ESGOTO MEDIDAS 4,30 X 1,70 E 7,70 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,30 X 1,70 / 7,70 X 0,70 DATA: 26/10/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	05:20:00	12,70	0,04
3315412	26/10/2022	16 - 03PV03	RIOGRANDINA	MANOEL ARAUJO COUTINHO, 2, 28634252	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,40 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,00 DATA: 26/10/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:25:00	2,00	0,08
3319140	26/10/2022	17 - 03PV04	NOVA ESPERANÇA	RICARDO SANTOS, 430, 28630394	REPOR ASFALTO 1,40 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,30 X 1,00 DATA: 26/10/2022 POR JOSÉ HELENO, THIAGO E GILSON.	00:28:00	1,30	0,05
3319138	26/10/2022	17 - 03PV04	NOVA ESPERANÇA	RICARDO SANTOS, 12, 28630394	REPOR ASFALTO 1,80 X 1,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,80 X 1,30 DATA: 26/10/2022 POR JOSÉ HELENO, THIAGO E GILSON.	00:22:00	2,34	0,11
3319135	26/10/2022	17 - 03PV04	NOVA ESPERANÇA	RICARDO SANTOS, 689, 28630394	REPOR ASFALTO 1,80 X 1,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,80 X 1,30 DATA: 26/10/2022 POR JOSÉ HELENO, THIAGO E GILSON.	00:13:00	2,34	0,18
3311428	27/10/2022	16 - 03PV03	CONSELHEIRO PAULINO	ALBERTINO QUADRO GAMA, 4, 28633400	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 1,00 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,80 DATA: 27/10/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	00:20:00	0,80	0,04
3314326	27/10/2022	15 - 03PV02	PARQUE DAS FLORES	JOSE PINHEIRO, 376, 28635434	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 3,50 X 1,00 - MEDIDAS CORRETAS: 6,00 X 2,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 6,20 X 3,50 / 3,20 X 2,60 DATA: 27/10/2022 POR JOSÉ HELENO, GILSON E THIAGO.	01:26:00	30,02	0,35
3315587	27/10/2022	17 - 03PV04	CHÁCARA DO PARAÍSO	IZELINO MADURO, 46, 28605300	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 3,60 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,60 X 1,50 DATA: 27/10/2022 POR JOSÉ HELENO, GILSON E THIAGO.	01:10:00	5,40	0,08
3319027	27/10/2022	15 - 03PV02	SITIO SÃO LUIS	MARIO ANTONIO THURLER, 128, 28621137	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,20 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 0,70 DATA: 27/10/2022 POR JOSÉ HELENO, GILSON E THIAGO.	00:44:00	0,84	0,02
3314906	28/10/2022	16 - 03PV03	BOM JESUS	THOMAZ, 32, 28605358	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS: 6M X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 6,50 X 1,60 DATA: 28/10/2022 POR MARCO AURÉLIO, ALEXANDRO E RONEY.	02:00:00	10,40	0,09
3320974	28/10/2022	16 - 03PV03	ROSA BRANCA	LAS VEGAS, 2, 28633630	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 0,90 X 0,90. ASFALTO COM APROXIMADAMENTE 10CM.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,90 X 0,90 DATA: 28/10/2022 POR MARCO AURÉLIO, ALEXANDRO E RONEY.	00:22:00	0,81	0,04

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3321869	29/10/2022	13 - 03PV01	BRAUNES	VISC DE ITABORAI, 28611230	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 0,70 DATA: 28/10/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	00:45:00	1,05	0,02
							28:25:00	117,08	1,80












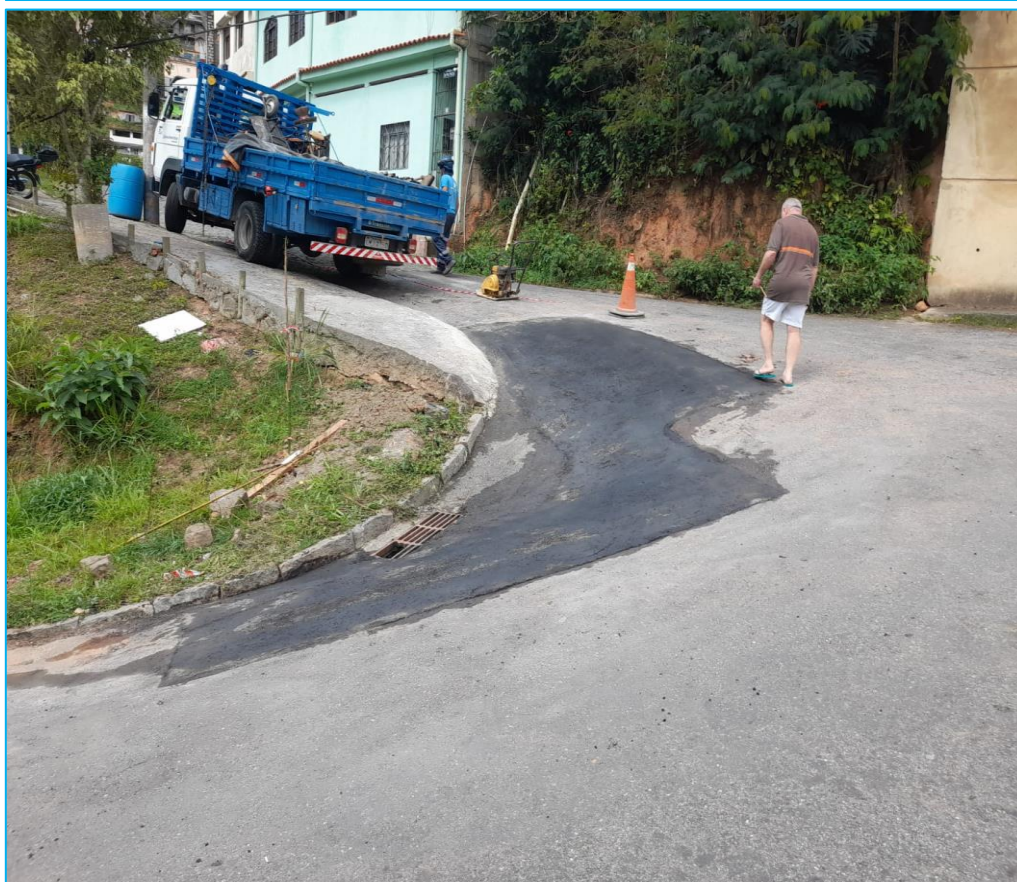

















Nova Friburgo, 05 de agosto de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 24/07/2022 a 30/07/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 24/07 a 30/07/2022.

Respeitosamente,



Engª Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-470/2022-SUP
DSSM-td

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/07/2022 a 30/07/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3260575	26/07/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,90 DATA: 26/07/2022 POR ADÃO, GILSON E RUAN.	00:30:00	0,90	0,03
3261986	27/07/2022	13 - 03PV01	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 3,00 X 0,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,00 X 0,80 EM 27/07/2022 POR ARECIDO - MAIQUE - MARCELO	01:53:00	2,10	0,02
3262696	27/07/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,80 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 REGISTRADO EM FOTO EM 27/07/2022 POR LEANDRO - MAIQUE - MARCELO	00:30:00	0,64	0,02
3260687	26/07/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,20 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 0,80 REGISTRADO EM FOTO EM 26/07/2022 POR MARCO - PABLO - ALEXANDRO	00:30:00	0,96	0,03
3262651	27/07/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,20 X 1,00	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 1,30. EM 27/07/2022. POR EDIVANDRO/JAQUES/JOÃO.	00:30:00	1,95	0,07
3254092	28/07/2022	17 - 03PV04	REFAZER ASFALTO: 2,50 X 2,50 - CARRO NO LOCAL/NECESSÁRIO SINALIZAR	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,00 X 2,50 EM 28/07/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:40:00	7,50	0,19
3261208	26/07/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 5,10 X 0,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 5,10 X 0,70 REGISTRADO EM FOTO EM 26/07/2022 POR MARCO - PABLO - ALEXANDRO	01:25:00	3,57	0,04
3260600	24/07/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 REGISTRADO EM FOTO EM 24/07/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - PABLO	01:10:00	1,00	0,01
3263384	29/07/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 2,60 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,20 X 1,40 EM 29/07/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	01:10:00	4,48	0,06
3263382	29/07/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO, MEDIDAS PARA REFAZER ASFALTO COM CORTE: 1,	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,40 X 0,90 EM 29/07/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	00:16:00	1,26	0,08
3259499	26/07/2022	16 - 03PV03	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 REGISTRADO EM FOTO EM 26/07/2022 POR MARCO - PABLO - ALEXANDRO	01:15:00	1,00	0,01
3262824	28/07/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,30 X 1,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,30 X 1,30 REGISTRADO EM FOTO EM 28/07/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	00:31:00	1,69	0,05
3263416	28/07/2022	17 - 03PV04	MEDIDAS À CONFERIR.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,00 X 1,00 X 1,70 X 1,00 REGISTRADO EM FOTO EM 28/07/2022	02:05:00	5,70	0,05
3259362	26/07/2022	13 - 03PV01	AGUA MEDIDAS 2,20 X 1,20 - MEDIDAS APROXIMADAS: 2,50 X 1,8	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,60 X 1,80 - 5,10 X 3,00 E RECOLHIDO 90 PARALELOS. EM 26/07/2022. POR LEANDRO/MARCELO/MAIQUE.	03:00:00	23,58	0,13

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3261360	26/07/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,70 X 1,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,00 X 2,00 DATA: 26/07/2022 POR ADÃO, GILSON E RUAN.	01:40:00	8,00	0,08
3262819	28/07/2022	13 - 03PV01	VESTIMENTO, MEDIDAS: 2,70 X 0,50. RECOLHER 2 CARRINHOS DE	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO E RETIRADO 2 CARRINHOS DE ENTULHO. MEDIDAS: 2,70 X 0,50 REGISTRADO EM FOTO EM 28/07/2022	01:55:00	1,35	0,01
3261160	25/07/2022	13 - 03PV01	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,20 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 REGISTRADO EM FOTO EM 25/07/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	00:35:00	1,20	0,03
3262649	29/07/2022	16 - 03PV03	NECESSÁRIO REPOR ASFALTO: 1,20 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,80 X 1,00 EM 29/07/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - PABLO	01:05:00	1,80	0,03
3262836	28/07/2022	13 - 03PV01	UIPE RAFAEL / PAULO ... 0,90 X 0,60 ... NECESSÁRIO A RETIRADA D	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,90 X 0,60 REGISTRADO EM FOTO EM 28/07/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	01:20:00	0,54	0,01
3260133	25/07/2022	15 - 03PV02	AGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 0,70 X 0,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,70 X 0,60 REGISTRADO EM FOTO EM 25/07/2022 POR EDVANDRO - JAQUES - JOÃO	01:31:00	0,42	0,00
3263483	28/07/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,70 X 0,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,70 X 0,60 EM 28/07/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:50:00	0,42	0,01
3259503	27/07/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 15,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 15,00 X 1,00 EM 27/07/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	02:54:00	15,00	0,09
3260659	24/07/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,30 X 1,10	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,30 X 1,20 DATA: 24/07/2022 POR MARCO, PABLO E ALEXADRO.	00:38:00	1,56	0,04
				TOTAL:	27:53:00	86,62	1,10





































RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES

DATA: 28/07/2022







Nova Friburgo, 25 de outubro de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 25/09/2022 a 01/10/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 25/09/2022 a 01/10/2022.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-612/2022-SUP
DSSM-td

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO					
			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2022 a 01/10/2022					
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3301058	27/09/2022	17 - 03PV04	PRES RAUL VEIGA, 100, 28623460	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,20 X 1,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,20 EM 27/09/2022 POR ADÃO - GILSON - SEBASTIÃO	00:30:00	1,44	0,05
3300952	27/09/2022	16 - 03PV03	LEOPOLDINA PINEL GARCIA, 27, 28633550	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 0,80 EM 27/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:50:00	0,80	0,02
3300243	29/09/2022	17 - 03PV04	VERIATO DE LIMA, 351, 28614320	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 2,80 X 1,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,20 X 2,40 EM 29/09/2022 POR ADÃO - GILSON - SEBASTIÃO	00:55:00	7,68	0,14
3300072	28/09/2022	16 - 03PV03	RICARDO SANTOS, 19, 28630394	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,00 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 0,90 EM 28/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	01:10:00	1,80	0,03
3299892	27/09/2022	17 - 03PV04	ACRE, 25, 28623340	MANUTENÇÃO ESGOTO, MEDIDAS: 2,20 X 1,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,20 X 1,60 EM 27/09/2022 POR ADÃO - GILSON - SEBASTIÃO	00:47:00	3,52	0,07
3297990	26/09/2022	16 - 03PV03	DR RENATO ARNALDO SILVEIRA LOPES, 72, 28630342	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE AFUNDOU, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00 X 1,20 E 0,60 X 0,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,20 E 0,60 X 0,60 EM 26/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:58:00	1,56	0,03
3297871	27/09/2022	15 - 03PV02	MARIO ANTONIO THURLER, 398, 28621137	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 3,10 X 0,20 E 1,40 X 0,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,10 X 0,20 E 1,40 X 0,60 EM 27/09/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	01:18:00	1,46	0,02
3297829	27/09/2022	15 - 03PV02	ERNESTINA MEDEIROS BON, 74, 28635575	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 1,60 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,10 X 0,90 EM 27/09/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	01:10:00	1,89	0,03
3297808	27/09/2022	16 - 03PV03	MANOEL RIBEIRO, 28633420	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,10 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,10 X 1,00 EM 27/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:25:00	1,10	0,04
3297127	27/09/2022	16 - 03PV03	CAP MAIA, 23, 28635530	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 1,20 X 0,90 X 0,90 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 1,00 E 1,00 X 1,00 + 0,60 X 0,60 EM 27/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	01:00:00	2,86	0,05
3297051	27/09/2022	17 - 03PV04	BERNARDO PACHECO, 27, 28623100	INVESTIMENTO ÁGUA, MEDIDAS: 2,00 X 0,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 0,30 EM 27/09/2022 POR ADÃO - GILSON - SEBASTIÃO	00:30:00	0,60	0,02
3297013	27/09/2022	17 - 03PV04	ACRE, 5, 28623340	INVESTIMENTO ÁGUA, MEDIDAS: 1,70 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,70 X 1,00 EM 27/09/2022 POR ADÃO - GILSON - SEBASTIÃO	00:28:00	1,70	0,06
3296953	26/09/2022	15 - 03PV02	SAO PEDRO, 30, 28630140	INVESTIMENTO ÁGUA, MEDIDAS: 2,00 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 2,00 X 0,90 EM 26/09/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	00:46:00	1,80	0,04

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3296838	27/09/2022	15 - 03PV02	ALTAMIRO MARTINS OURIQUES, 239, 28633070	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE SOLTOU, MEDIDAS: 2M X 1,3M	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 2,00 X 1,30 EM 27/09/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO		2,60	0,00
3296247	26/09/2022	15 - 03PV02	ANCHIETA, 171, 28605270	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 0,80 X 0,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 0,80 X 0,60 EM 26/09/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO		0,48	0,00
3296223	28/09/2022	17 - 03PV04	BENJAMIN CONSTANT PRADO, 1034, 28633000	MANUTENÇÃO ESGOTO, MEDIDAS: 2,40 X 1,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,40 X 1,30 EM 28/09/2022 POR ADÃO - GILSON - SEBASTIÃO		3,12	0,00
3295591	30/09/2022	16 - 03PV03	MANOEL ARAUJO COUTINHO, 12, 28634252	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,60 X 0,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,60 X 0,30 EM 30/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY		0,48	0,00
3294946	26/09/2022	16 - 03PV03	DR RENATO ARNALDO SILVEIRA LOPES, 27, 28630342	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 7M X 1M	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,20 X 2,40 E 5,00 X 1,00 EM 26/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY		12,68	0,00
3293857	26/09/2022	16 - 03PV03	ESTRADA LEOPOLDINA PINEL GARCIA, 0, 28633550	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 EM 26/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY		1,00	0,00
3293850	28/09/2022	17 - 03PV04	ANTONIO FARIAS FILHO, 15 ,28634435	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 2,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 2,00 X 1,00 EM 28/09/2022 POR ADÃO - GILSON - SEBASTIÃO		2,00	0,00
3292905	27/09/2022	16 - 03PV03	LEOPOLDINA PINEL GARCIA, 14, 28633550	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE SOLTOU, MEDIDAS: 1,10 X 0,90. RECOLHER 2 CARRINHOS DE ENTULHO.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,10 X 0,90 EM 27/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY		0,99	0,00
						10:47:00	51,56	0,59























Nova Friburgo, 03 de julho de 2023.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório de Serviços de Recuperação de Vias – 21/05/2023 a 03/06/2023**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilhas e relatórios fotográficos referentes ao período de 21/05/2023 a 03/06/2023.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-267/2023-SUP
DSSM-td

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/05/2023 a 27/05/2023				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3454113	26/05/2023	950 - SED-02GSO-AG08	SANTA CRUZ	CENTENARIO, 19047, 28636899	ASFALTO: 12M	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 12,00 X 0,20. EM 26/05/2023. POR DANIEL/LUCAS.	01:18:00	2,40	0,03
3454095	27/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	CENTRO	MAL DEODORO DA FONSECA, 72, 28625730	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 0,90 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,10 X 0,70. DATA: 27.05.2023. POR: SANDRO/PABLO/GILSON.	00:31:00	0,77	0,02
3454089	27/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	CENTRO	MAL DEODORO DA FONSECA, 52, 28625730	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 2,60 X 1,40	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,90 X 1,50. DATA: 27.05.2023. POR: SANDRO/PABLO/GILSON.	00:09:00	4,35	0,48
3453351	25/05/2023	950 - SED-02GSO-AG08	SANTA CRUZ	RUA CENTENARIO, 0, 28636899	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 5,00 X 0,20	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS: 5,00 X 0,20 EM 25/05/23 POR DANIEL/LUCAS	01:00:00	1,00	0,02
3453155	25/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	MORRO DOS MAIAS	RUA CAP MAIA, 50, 28635530	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,80. DATA: 25.05.2023. POR: JOSÉ HELENO/GILSON/PABLO.	00:20:00	0,80	0,04
3452394	24/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	RIOGRANDINA	RUA CAP BENTO JOSÉ VELOSO, 324, 28634340	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,30 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,30 X 1,00. DATA: 24.05.2023. POR: SANDRO/MARCELO/THIAGO.	00:36:00	1,30	0,04
3451579	23/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	LUMIAR	SETE DE SETEMBRO LUMIAR, 533, 28616115	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS À CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,20 E 1,00 X 1,00. DATA: 23.05.2023. POR: MARCO/RONEY/ALEXANDRO.	00:35:00	2,44	0,07
3450815	24/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	BAIRRO DA GRAÇA	MARIA DA GLORIA NENO, 107, 28620150	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,40 X 1,20. DATA: 24.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	00:50:00	1,68	0,03
3450685	22/05/2023	960 - SED-03GSO-RP02	GRANJA SPINELLI	SABINA ABREU AGUILERA, 387, 28625805	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 1,50 X 0,90 / 1,00 X 0,50 DATA: 22/05/2023 POR HENRIQUE, JOÃO E WESLEY.	00:38:00	1,85	0,05
3450682	22/05/2023	960 - SED-03GSO-RP02	GRANJA SPINELLI	SABINA ABREU AGUILERA, 327, 28625805	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 1,00 X 1,00 DATA: 22/05/2023 POR HENRIQUE, JOÃO E WESLEY.	00:30:00	1,00	0,03
3449458	23/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	CANTO DO RIACHO	ARIDIO DA ROSA PINHEIRO, 333, 28633799	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 3,30 X 0,40 RETIRAR 4 CARRINHOS DE ENTULHO	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,30 X 0,40. RETIRADOS 4 CARRINHOS DE ENTULHO. DATA: 23.05.2023. POR: SANDRO/JOSÉ HELENO/MARCELO.	01:03:00	1,32	0,02
3449357	23/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	LUMIAR	ESTRADA CARLOS OSCAR SPITZ, 0, 28616046	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 1,30 X 1,10	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,20. DATA: 23.05.2023. POR: MARCO/RONEY/ALEXANDRO.	00:20:00	1,80	0,09
3449229	24/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	VARGINHA	MANOEL A MOURA VARGINHA, 28616255	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,00. DATA: 24.05.2023. POR: MARCO/RONEY/ALEXANDRO.	00:35:00	2,00	0,06
3448804	25/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	JARDIM OURO PRETO	LAMARTINE BABO, 21, 28633220	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,70X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,70 X 0,60. DATA: 25.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	00:37:00	0,42	0,01
3445892	22/05/2023	960 - SED-03GSO-RP02	CHÁCARA DO PARAÍSO	IZELINO MADURO, 390, 28605300	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2,20 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 2,20 X 0,60 DATA: 22/05/2023 POR HENRIQUE, JOÃO E WESLEY.	00:20:00	1,32	0,07
3445432	22/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	BELA VISTA	BERNARDO PACHECO, 27, 28623100	REPOR ASFALTO: 2,50 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,00. DATA: 22.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	01:10:00	2,00	0,03

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3445165	23/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	CANTO DO RIACHO	ARARIPINA, 246, 28633380	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,20 X 2,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,20 X 2,20. DATA: 23.05.2023. POR: SANDRO/JOSÉ HELENO/MARCELO.	01:03:00	4,84	0,08
3444465	21/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	BELA VISTA	SAO PAULO, 201, 28623200	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,60 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,60 X 0,80. DATA: 21.05.2023. POR: MARCO/RONEY/ALEXANDRO.	00:25:00	1,28	0,05
3441411	22/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	DUAS PEDRAS	SAO PEDRO, 05, 28630140	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 1,00 X1 ,00 DATA: 22/05/2023 POR JOSÉ HELENO, SANDRO E MARCELO.	00:25:00	1,00	0,04
3433713	22/05/2023	960 - SED-03GSO-RP02	CHÁCARA DO PARAÍSO	IZELINO MADURO, 399, 28605300	REPOR ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,10.	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 1,20 X 1,10 DATA: 22/05/2023 POR HENRIQUE, JOÃO E WESLEY.	00:42:00	1,32	0,03
3449226	26/05/2023	127 - 01GSO01-AE	NOVA ESPERANÇA	RICARDO SANTOS, 2, 28630394	MANUTENÇÃO ESGOTO, MEDIDAS: 8,00 X 1,00	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS:7,00 X 1,50 EM 26/05/23 POR JOSE ALDIR	01:30:00	10,50	0,12
							14:37:00	45,39	1,41









































MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/05/2023 a 03/06/2023				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3458812	02/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	VALE DO SOL	NSA DO AMPARO VALE DO SOL, 1205, 28635010	ESGOTO, MANUTENÇÃO, REPOR ASFALTO EM DOIS BURACOS	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,50 X 1,50 E 4,00 X 1,50. DATA: 02.06.2023. POR: JOSÉ HELENO/THIAGO/GUILHERME.	02:08:00	9,75	0,08
3458809	02/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	VALE DO SOL	NSA DO AMPARO VALE DO SOL, 1090, 28635010	ESGOTO, MANUTENÇÃO, DOIS BURACOS	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 5,00 X 1,35. DATA: 02.06.2023. POR: JOSÉ HELENO/THIAGO/GUILHERME.	01:15:00	6,75	0,09
3458072	01/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	SANTA INES	JOAO RODRIGUES PINTO, 22, 28633310	ESGOTO, MANUTENÇÃO, ASFALTO SOLTUO, MEDIDAS: 3,00 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 1,50. DATA: 01.06.2023. POR: JOSÉ HELENO/THIAGO/GUILHERME.	01:20:00	4,50	0,06
3457067	30/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	RUI SANGULARD	JOSE POLETTI, 3, 28635567	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 4,00 X 0,50 E 1,00 X 0,30	SERVIÇO EXECUTADO ASFALTO MEDIDAS: 4,50 X 0,60 E 1,00 X 1,00 1,00 X 0,40 30/05/2023 MARCO/ALEXANDRE/BONEI	00:45:00	4,10	0,09
3454171	29/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	ALTO DE OLARIA	XINGU, 211, 28620310	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,00. DATA: 29.05.2023. POR: MARCO/RONEY/ALEXANDRO.	00:27:00	1,50	0,06
3452671	01/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	SANTA INES	JOAO RODRIGUES PINTO, 26, 28633310	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,10 X 1,10	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,10 X 1,10. DATA: 01.06.2023. POR: JOSÉ HELENO/THIAGO/GUILHERME.	01:00:00	1,21	0,02
3451534	29/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	SÃO GERALDO	DR FELICIANO BENEDICTO DA COSTA, 1352, 28630330	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,60 X 1,00 - RETIRAR 5 CARRINHOS DE ENTULHO	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 1,80 X 1,40 DATA: 29/05/2023 POR SANDRO, MARCELO E THIAGO.	00:46:00	2,52	0,05
3450018	01/06/2023	962 - SED-03GSO-RP04	BOM JESUS	LEAO, 2, 28605356	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 1,30 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,30 X 0,80. DATA: 01.06.2023. POR: JOSÉ HELENO/THIAGO/GUILHERME.	01:11:00	1,04	0,01
3449297	31/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	VILA GUARANI	GAL ARGOLO, 154, 28613250	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS À CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 1,80. DATA: 31.05.2023. POR: JOSÉ HELENO/PABLO/GILSON.	01:05:00	5,40	0,08
3445396	28/05/2023	960 - SED-03GSO-RP02	TIO DONGO	JANDYRA B PERLINGEIROTIODONGO, 2994, 28630320	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,70. DATA: 28.05.2023. POR: HENRIQUE/PABLO/GILSON.	00:28:00	0,70	0,03
3455818	29/05/2023	127 - 01GSO01-AE	SÃO JORGE	CADAJAS, 28633610	ÁGUA, PERDAS, MEDIDAS: 75,07	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO À QUENTE. MEDIDAS: 75,07 M³. EM 26/05/2023. POR JOSÉ ALDIR.	03:30:00	75,07	0,36
							13:55:00	112,54	0,57














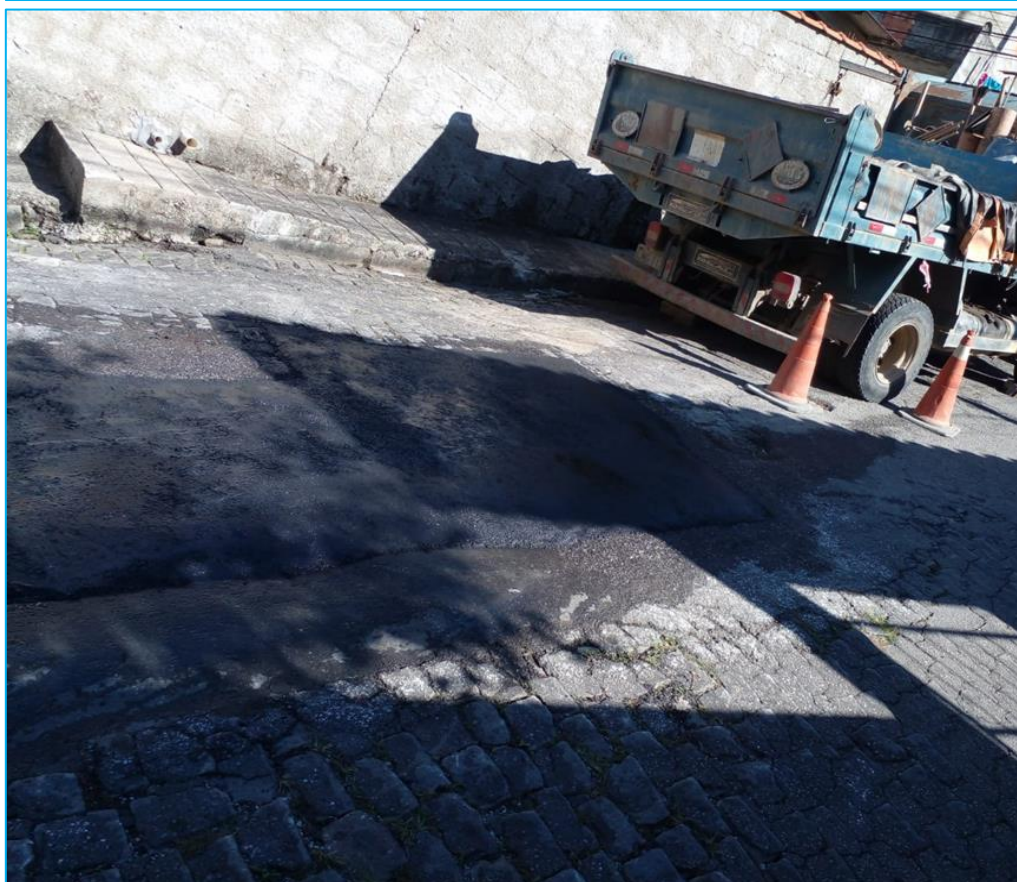











Nova Friburgo, 06 de julho de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 27/06/2022 a 01/07/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 27/06 a 01/07/2022.

Respeitosamente,



Engª Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-381/2022-SUP
DSSM-td

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 27/06/2022 a 01/07/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3246856	29/06/2022	17 - 03PV04	MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 7,00 X 0,70 DATA: 29/06/2022 POR ADÃO, PABLO E RUAN.	04:40:00	4,90	0,02
3245789	28/06/2022	15 - 03PV02	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 0,80 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,60 DATA: 28/06/2022 POR EDIVANDRO, RONIMAR E JOÃO.	00:26:00	0,48	0,02
3242537	30/06/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 5,00 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,70 X 0,70 / 2,80 X 0,50 DATA: 30/06/2022 POR LEANDRO, MARCELO E MAIQUE.	02:15:00	3,99	0,03
3241705	28/06/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,80 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,70 DATA: 28/06/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:22:00	0,56	0,03
3245815	28/06/2022	15 - 03PV02	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,60 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,60 X 0,90 DATA: 28/06/2022 POR EDIVANDRO, RONIMAR E JOÃO.	00:43:00	1,44	0,03
3245757	28/06/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2,80 X 1,10	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,80 X 1,10 DATA: 28/06/2022 POR ADÃO, PABLO E RUAN.	01:05:00	3,08	0,05
3245071	28/06/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,90 DATA: 28/06/2022 POR EDIVANDRO, RONIMAR E JOÃO.	01:35:00	0,90	0,01
3246854	01/07/2022	13 - 03PV01	INVESTIMENTO ÁGUA, MEDIDAS: 1,00 X 1,60 / 5,00 X 0,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,60 / 5,00 X 0,30 DATA: 01/07/2022 POR LEANDRO, MARCELO E MAIQUE.	01:15:00	3,10	0,04
3247709	30/06/2022	13 - 03PV01	MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,70 X 0,70 / 2,80 X 0,50 DATA: 30/06/2022 POR LEANDRO, MARCELO E MAIQUE.	00:55:00	4,09	0,07
3245833	29/06/2022	17 - 03PV04	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,00 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,70 DATA: 29/06/2022 POR ADÃO, PABLO E RUAN.	00:39:00	0,70	0,02
3241803	27/06/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,90 X 0,60 DATA: 29/06/2022 POR LEANDRO, MARCELO E MAIQUE.	00:55:00	0,54	0,01
3244935	27/06/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,40 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,40 X 0,70 DATA: 29/06/2022 POR MARCO, RONIMAR E JOÃO.	00:27:00	0,98	0,04
3246914	29/06/2022	16 - 03PV03	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 0,80 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,80 DATA: 29/06/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	00:16:00	0,64	0,04
3246809	29/06/2022	16 - 03PV03	REJUNTAR EM VOLTA DO PV: MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,40 X 0,40 / 1,40 X 0,40 / 1,40 X 0,70 / 1,40 X 0,40 DATA: 29/06/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	00:30:00	2,66	0,09

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3243321	01/07/2022	16 - 03PV03	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 10,00 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 10,00 X 0,50 DATA: 01/07/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	02:25:00	5,00	0,03
3243301	28/06/2022	16 - 03PV03	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,40X 1,00. REPOR ASFALTO EM VOLTA DA TAMPA DO P.V.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,40 X 1,00 DATA: 28/06/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:38:00	1,40	0,04
3243827	28/06/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,90 X 1,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,20 X 2,10 DATA: 28/06/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	01:58:00	6,72	0,06
3242563	27/06/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,00 DATA: 27/06/2022 POR ADÃO, RUAN E PABLO.	01:18:00	2,00	0,03
3243959	27/06/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,10 E 4 CARRINHOS DE ENTULHO RECOLHIDOS. DATA: 27/06/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	01:08:00	1,65	0,02
3242465	27/06/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 0,90 DATA: 29/06/2022 POR LEANDRO, MARCELO E MAIQUE.	01:25:00	1,08	0,01
3246866	29/06/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 0,80 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,60 DATA: 29/06/2022 POR EDIVANDRO, RONIMAR E JOÃO.	00:30:00	0,48	0,02
3245040	27/06/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 3,30 DATA: 29/06/2022 POR LEANDRO, MARCELO E MAIQUE.	02:45:00	9,90	0,06
3243231	30/06/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 3,00 X 2,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 2,00 DATA: 30/06/2022 POR EDIVANDRO, RONIMAR E JOÃO.	02:40:00	6,00	0,04
3245094	28/06/2022	16 - 03PV03	FAVOR REPOR PAVIMENTO EQUIPE DORACI/FELIPE 0,80 X 0,40	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,40 DATA: 28/06/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:16:00	0,32	0,02
3244970	27/06/2022	17 - 03PV04	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,10 X 1,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,10 X 1,70 DATA: 27/06/2022 POR ADÃO, RUAN E PABLO.	01:30:00	3,57	0,04
				TOTAL:	32:36:00	66,18	0,85









































Nova Friburgo, 19 de setembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 28/08/2022 a 03/09/2022 e 04/09/2022 a 10/09/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilhas e relatórios fotográficos referentes aos dias 28/08/2022 a 03/09/2022 e 04/09/2022 a 10/09/2022.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-554/2022-SUP
DSSM-td

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/08/2022 a 03/09/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3285082	31/08/2022	17 - 03PV04	REPOSIÇÃO DE ASFALTO: 3,50 X 3,80/ 2,50 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,50 X 3,80 E 2,50 X 0,50 EM 31/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:07:00	14,55	0,22
3284371	01/09/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 2,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,80 X 0,60 EM 01/09/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:42:00	1,08	0,03
3284223	01/09/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 4M X 1,10	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 5,00 X 2,00 EM 01/09/2022 POR LEANDRO - MARCELO - HUMBERTO	01:45:00	10,00	0,10
3284199	31/08/2022	13 - 03PV01	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE TRINCOU E SOLTOU	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 1,10 E 0,80 X 0,15 EM 31/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - HUMBERTO	00:35:00	1,77	0,05
3284166	31/08/2022	15 - 03PV02	INVESTIMENTO ÁGUAMEDIDAS A CONFERIRREPOR ASFALTO AO REDOR DO T9.	RETIRADO 2 CARRINHOS DE ENTULHO EM 31/08/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	00:15:00		0,00
3284141	31/08/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,70 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,70 X 0,50 EM 31/08/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:42:00	0,35	0,01
3283984	31/08/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,80 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 X 0,80 EM 31/08/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	00:33:00	0,64	0,02
3283503	02/09/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,80 X 1,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,20 X 2,20 EM 02/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:58:00	4,84	0,08
3283417	30/08/2022	17 - 03PV04	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 EM 30/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:22:00	1,00	0,05
3283214	31/08/2022	16 - 03PV03	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE SOLTOU, MEDIDAS: 0,80 X 0,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 X 0,70 EM 31/08/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:20:00	0,56	0,03
3283153	31/08/2022	13 - 03PV01	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE TRINCOU E SOLTOU, AONDE FOI FEITA UMA LIGAÇÃO NOVA, MEDIDAS À CONFERIR.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,85 X 1,90 E 2,90 X 0,50 EM 31/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - HUMBERTO	02:05:00	4,97	0,04

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3283151	31/08/2022	13 - 03PV01	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE TRINCOU E SOLTOU, AONDE FOI FEITA UMA LIGAÇÃO NOVA, MEDIDAS À CONFERIR.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,50 X 2,80 E 2,50 X 0,50 EM 31/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - HUMBERTO	02:05:00	11,05	0,09
3282379	01/09/2022	16 - 03PV03	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,90 X 1,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,90 X 1,20 EM 01/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	01:25:00	2,28	0,03
3282376	30/08/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 2,50 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,90 X 1,00 EM 30/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	00:51:00	2,90	0,06
3282356	31/08/2022	13 - 03PV01	ÁGUA, INVESTIMENTO, NECESSÁRIO LIMPAR O LOCAL E REPOR ASFALTO, MEDIDAS À CONFERIR.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,45 X 0,80 E 1,80 X 0,25 EM 31/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - HUMBERTO	00:50:00	1,61	0,03
3282337	01/09/2022	15 - 03PV02	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,20 X 2,10 EM 01/09/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	01:10:00	4,62	0,07
3282295	30/08/2022	17 - 03PV04	ESGOTO, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 2,20 X 1,30 E REPOR 1,2M DE MEIO FIO.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,20 X 1,30 EM 30/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:17:00	2,86	0,04
3282279	29/08/2022	29 - 02PV01	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,10 X 1,00	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,10 EM 29/08/2022. POR ARECILDO/ALEXANDRO/RONEY.	00:30:00	1,32	0,04
3282274	29/08/2022	29 - 02PV01	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,50 X 1,40	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,50 X 2,00. EM 29/08/2022. POR ARECILDO/ALEXANDRO/RONEY.	00:58:00	5,00	0,09
3282119	01/09/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 1,50 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 1,20 EM 01/09/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:00:00	1,80	0,03
3281311	29/08/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 3,50 X 0,60/ 1,50 X 1,00/ 0,50 X 0,50	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,80 X 1,10 - 1,90 X 1,60 - 0,70 X 0,50. EM 29/08/2022. POR LEANDRO/MARCELO/HUMBERTO.	02:15:00	7,57	0,06
3281288	28/08/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 3M X 1,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,00 X 1,60 EM 28/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:35:00	4,80	0,05
3281243	29/08/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 5,00 X 1,50/4,50 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 7,80 X 2,40 DATA: 29/08/2022 POR EDIVANDRO, JOÃO E WESLEY.	05:02:00	18,72	0,06

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3280037	31/08/2022	16 - 03PV03	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 0,90 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,90 X 0,90 EM 31/08/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	01:08:00	0,81	0,01
3280021	29/08/2022	29 - 02PV01	CONFORME VQS 32794540 REPOR ASFALTO QUE SOLTUUMEDIDAS: 1,00 X 1,00	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00. EM 29/08/2022. POR ARECILDO/ALEXANDRO/RONEY.	00:28:00	1,00	0,04
3280006	30/08/2022	17 - 03PV04	NECESSÁRIO REFAZER O QUEBRA MOLAS DE ACORDO COM A VQS 3279241, MEDIDAS: 2,00 X 0,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 0,60 EM 30/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:50:00	1,20	0,02
3279985	01/09/2022	15 - 03PV02	INVESTIMENTO ÁGUAMEDIDAS:2,00 X 0,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 0,40 EM 01/09/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	00:21:00	0,80	0,04
3279938	28/08/2022	17 - 03PV04	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 6,00 X 0,60 RETIRAR 4 CARRINHOS DE ENTULHO	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 6,00 X 0,60 EM 28/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:45:00	3,60	0,03
3278717	30/08/2022	17 - 03PV04	INVESTIMENTO ÁGUA, MEDIDAS: 1,40 X 0,60 / 3,00 X 0,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,40 X 0,60 E 3,00 X 0,30 EM 30/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:59:00	1,74	0,01
3278589	01/09/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS; 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 EM 01/09/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	01:02:00	1,00	0,02
3278572	30/08/2022	13 - 03PV01	INVESTIMENTO ÁGUA, MEDIDAS: 4,00 X 0,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,00 X 0,40 EM 30/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	00:16:00	1,60	0,10
3276027	29/08/2022	29 - 02PV01	RETRABALHO, ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO AFUNDADO, MEDIDAS: 1,20 X 1,00	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 - 1,50 X 0,60. EM 29/08/2022. POR ARECILDO/ALEXANDRO/RONEY.	01:10:00	2,10	0,03
3275102	30/08/2022	29 - 02PV01	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 7,00 X 0,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 7,00 X 0,80 E 2,30 X 1,90 EM 30/08/2022 POR ALEXANDRO - ARECILDO - RONEY	01:41:00	9,97	0,10
				TOTAL:	39:02:00	128,11	1,65





















































BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/09/2022 a 10/09/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3289797	10/09/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 1,00 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 0,50 EM 10/09/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	01:26:00	0,50	0,01
3289785	09/09/2022	17 - 03PV04	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,40 X 1,30 EM 09/09/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:10:00	1,82	0,18
3289694	09/09/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO ESGOTO, MEDIDAS: 3,60 X 2,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,00 X 4,50 EM 09/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	01:45:00	18,00	0,17
3288943	09/09/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE AFUNDOU, MEDIDAS: 3,50 X 1,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,50 X 1,20 EM 09/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	01:10:00	4,20	0,06
3288878	09/09/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 1,50 X 1,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 1,30 EM 09/09/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:00:00	1,95	0,03
3288465	08/09/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS 1,20 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 EM 08/09/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:45:00	1,20	0,03
3287894	07/09/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 0,80 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 X 0,80 EM 07/09/2022 POR LEANDRO - MARCELO - HUMBERTO	00:50:00	0,64	0,01
3287848	06/09/2022	30 - 02AG10	MEDIDAS A CONFERIR	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 5,00 X 0,30 EM 06/09/2022 POR LEANDRO - RUAN	00:20:00	1,50	0,08
3287771	08/09/2022	17 - 03PV04	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 0,90 X 0,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,90 X 0,60 EM 08/09/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON OBS: PRIMEIRA FOTO É DO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE	01:38:00	0,90	0,01
3287721	08/09/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 3,50 X 1,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,60 X 2,00 EM 08/09/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:40:00	9,20	0,09
3286887	05/09/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 1,80 X 1,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,80 X 1,60 EM 05/09/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:05:00	2,88	0,04

<i>Nº O.S.</i>	<i>Data Exec.</i>	<i>Equipe Exec.</i>	<i>Solicitação</i>	<i>Observação da Baixa</i>	<i>Tempo EX</i>	<i>Medidas</i>	<i>M³ por minuto</i>
3286884	05/09/2022	16 - 03PV03	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 EM 05/09/2022 POR MARCO - ALEXANDRO - RONEY	00:26:00	1,00	0,04
3285377	05/09/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDA: 1,20 X 0,90 1,10 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 0,90 E 1,10 X 0,50 EM 05/09/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	02:55:00	1,63	0,01
3285356	05/09/2022	29 - 02PV01	ESGOTO, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 8,50 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 8,50 X 0,50 EM 05/09/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	03:58:00	4,25	0,02
				TOTAL:	19:08:00	49,67	0,78

















