

Nova Friburgo, 29 de maio de 2023.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório de Serviços de Recuperação de Vias – 30/04/2023 a 20/05/2023**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilhas e relatórios fotográficos referentes aos dias 30/04/2023 a 20/05/2023.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-217/2023-SUP
DSSM-Inpc

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2023 a 06/05/2023									
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3422792	30/04/2023	960 - SED-03GSO-RP02	VILAGE	MANOEL RODRIGUES, 71, 28605210	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,80 X 0,80 - CARRO NO LOCAL	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,80. DATA: 30.04.2023. POR: HENRIQUE/RONEY/MARCELO.	00:30:00	0,64	0,02
3423158	30/04/2023	960 - SED-03GSO-RP02	CORDOEIRA	THEOFILO MARRA, 5, 28613680	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,30 X 0,50/ - CARRO NO LOCAL	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,30 X 0,50. RETIRADOS 4 CARRINHOS DE ENTULHO. DATA: 30.04.2023. POR: HENRIQUE/RONEY/MARCELO.	00:55:00	0,65	0,01
3437555	30/04/2023	962 - SED-03GSO-RP04	DUAS PEDRAS	ROBADEY, 28605290	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,80 X 0,40	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,60. DATA: 30.04.2023. POR: ADÃO/PABLO/LUIZ.	00:30:00	0,60	0,02
3438456	02/05/2023	960 - SED-03GSO-RP02	BELA VISTA	PARA, 28623090	REPOR ASFALTO: 2M X 1M	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,50 X 1,00. DATA: 02.05.2023. POR: HENRIQUE/JOÃO/WESLEY.	00:35:00	2,50	0,07
3426929	02/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	VARGINHA	MANHAES, 25, 28616240	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,20 X 1,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 2,20 E 2,90 X 0,90. DATA: 02.05.2023. POR: MARCO/RONEY/GABRIEL.	01:05:00	9,21	0,14
3438627	02/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	ROSA BRANCA	LAS VEGAS, 5, 28633630	ASFALTO	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00. DATA: 02.05.2023. POR: JOSÉ HELENO/MARCELO/GILSON.	00:30:00	1,00	0,03
3438626	02/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	ROSA BRANCA	LAS VEGAS, 3, 28633630	ASFALTO	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,90 X 2,00. DATA: 02.05.2023. POR: JOSÉ HELENO/MARCELO/GILSON.	00:25:00	1,80	0,07
3438625	02/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	ROSA BRANCA	LAS VEGAS, 1, 28633630	ASFALTO	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 1,00. DATA: 02.05.2023. POR: JOSÉ HELENO/MARCELO/GILSON.	00:58:00	0,80	0,01
3425753	03/05/2023	960 - SED-03GSO-RP02	OLARIA	MANOEL LOURENÇO SOBRINHO, 39, 28623440	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE SOLTOU, MEDIDAS: 1,10 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,10 X 0,90. DATA: 03.05.2023. POR: HENRIQUE/JOÃO/WESLEY.	01:00:00	0,99	0,02
3432879	03/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	SANTA LUZIA	RUA DR CASTRO REBELO, 26, 28616366	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 5,00 X 0,20 E 2,50 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 5,00 X 0,60 E 3,00 X 0,90. DATA: 03.05.2023. POR: MARCO/RONEY/ALEXANDRO.	00:40:00	5,70	0,14
3425792	03/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	SANTA LUZIA	DR CASTRO REBELO, 112, 28616366	CONFORME O.S. 3359028, NECESSÁRIO PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO (50CM LARGURA) NA RUA. FOTOS EM ANEXO. (3369895)	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 6,00 X 0,90. DATA: 03.05.2023. POR: MARCO/RONEY/ALEXANDRO.	00:45:00	5,40	0,12
3439380	03/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	CALIFÓRNIA	ALCINDO ALVES DOS REIS, 170, 28633730	MANUTENÇÃO MEDIDAS: 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,90. DATA: 03.05.2023. POR: JOSÉ HELENO/MARCELO/LUIZ.	00:35:00	0,90	0,03
3439294	03/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	BAIRRO DO GIRASSOL	JANDYRA B PERLINGEIROGIRASSOL, 2428, 28630320	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,50 X 0,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 1,30. DATA: 03.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	00:50:00	3,90	0,08
3439334	03/05/2023	960 - SED-03GSO-RP02	JACINA	OLINDA SHANGRILA, 111, 28605420	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 1,70 X 1,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,90 X 1,70. DATA: 03.05.2023. POR: HENRIQUE/JOÃO/WESLEY.	00:28:00	3,23	0,12

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3426109	04/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	RIOGRANDINA	HERMINIA DOS SANTOS SILVA, 201, 28634330	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2M X 0,80	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 2,00 - 1,00 X 0,80. EM 04/05/2023. POR ADÃO/GILSON/PABLO.	02:00:00	4,80	0,04
3426954	04/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	BELA VISTA	JOSE ANDRADE BATISTA JR, 94, 28623330	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,00 X 1,00 ... 2,00 X 0,20	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS:1,00 X 1,00 E 2,00 X 0,20 EM 04/05/23 POR JOSE HELENO/MARCELO/GUILHERME.	01:08:00	1,40	0,02
3431697	04/05/2023	960 - SED-03GSO-RP02	CORDOEIRA	THEOFILO MARRA, 47, 28613680	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,50 X 1,20	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 1,30. EM 04/05/2023. POR HENRIQUE/JOÃO/WESLEY.	00:37:00	1,95	0,05
3439642	04/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	CALIFÓRNIA	ALCINDO ALVES DOS REIS, 466, 28633730	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 1,80 X 1,20	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS:1,80 X 1,20 EM 04/05/23 POR JOSE HELENO/MARCELO/GUILHERME.	00:44:00	2,16	0,05
3426962	05/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	BOM JESUS	RUA DAS CONQUISTAS LOT BOM JESUS, 58, 28605358	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,20 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 0,70. DATA: 05.05.2023. POR: MARCO/RONEY/ALEXANDRO.	00:20:00	0,84	0,04
3426921	05/05/2023	960 - SED-03GSO-RP02	BARROSO	RUA GLAPHIRA STUTZ GRIPP, 112, 28605575	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,30 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,30 X 0,90. DATA: 05.05.2023. POR: HENRIQUE/JOÃO/WESLEY.	00:43:00	1,17	0,03
3426928	05/05/2023	960 - SED-03GSO-RP02	BARROSO	RAUL RIVAIL GRIPP, 832, 28605575	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,50 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 E 4,60 X 0,20. DATA: 05.05.2023. POR: HENRIQUE/JOÃO/WESLEY.	00:47:00	2,12	0,05
3426969	05/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	ALTO DE OLARIA	AMAPA, 58, 28620250	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 0,80 X 0,80 / 1,00 X 1,00 / 0,70 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,80 E 1,00 X 1,00 E 0,70 X 0,70. DATA: 05.05.2023. POR: ADÃO/PABLO/LUIZ.	01:10:00	2,13	0,03
3440457	05/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	CONSELHEIRO PAULINO	RUA DOMINGOS FERREIRA GOMES, 117, 28633412	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,20. DATA: 05.05.2023. POR: MARCO/RONEY/ALEXANDRO.	00:37:00	1,44	0,04
3426940	06/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	JARDINLÂNDIA	BENJAMIN CONSTANTJARDINLÂNDIA, 1183, 28633275	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,50 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,50. DATA: 06.05.2023. POR: JOSÉ HELENO/MARCELO/GILSON.	01:50:00	2,25	0,02
							19:42:00	57,58	1,25











































MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 07/05/2023 a 13/05/2023									
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3426925	08/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	RIOGRANDINA	MANOEL ARAUJO COUTINHO, 22, 28634252	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,50 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,00. DATA: 08.05.2023. POR: MARCO/RONEY/ALEXANDRO.	00:17:00	1,50	0,09
3425791	08/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	NOVA SUIÇA	ADELIA WERMELINGER DUARTE, 80, 28605702	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,70 X 0,60 - 2,50 X 0,20 - 1,00 X 0,70 - 2,50 X 0,20 - 1,80 X 0,60 - 2,50 X 0,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,70 X 0,60 E 2,50 X 0,20 E 1,00 X 0,70 E 2,50 X 0,20 E 1,80 X 0,60 E 2,50 X 0,30. DATA: 08.05.2023. POR: ADÃO/LUIZ/PABLO.	01:50:00	4,55	0,04
3439737	08/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	CONSELHEIRO PAULINO	ROSA RIBEIRO, 53, 28633450	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,20 E 1,00 X 1,00. DATA: 08.05.2023. POR: MARCO/RONEY/ALEXANDRO.	00:35:00	2,44	0,07
3435303	08/05/2023	960 - SED-03GSO-RP02	SÍTIO SÃO LUIS	ESTRADA MARIO ANTONIO THURLER, 78, 28621137	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,90 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,80 X 1,70. DATA: 08.05.2023. POR: HENRIQUE/JOÃO/WESLEY.	00:55:00	3,06	0,06
3434658	08/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	ALTO DE OLARIA	XINGU, 39, 28620310	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,40 X 1,10	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,40 X 1,20 E 1,00 X 1,30. DATA: 08.05.2023. POR: ADÃO/LUIZ/PABLO.	01:10:00	3,50	0,05
3438560	08/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	BELA VISTA	ACRE, 13, 28623340	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 0,10/1,00 X 0,80 RETIRADA DE 2 CARRINHOS DE ENTULHO	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,10 X 1,10. DATA: 08.05.2023. POR: ADÃO/LUIZ/PABLO.	00:30:00	2,31	0,08
3422791	09/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	CORDOEIRA	HUMBERTO GUARIGLIA, 24, 28613810	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 3,00 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 1,80. DATA: 09.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	01:00:00	5,40	0,09
3434706	09/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	CORDOEIRA	RUA THEOFILO MARRA, 69, 28613680	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 0,90 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,30 X 1,20. DATA: 09.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	00:40:00	1,56	0,04
3439693	09/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	RIOGRANDINA	CAP BENTO JOSÉ VELOSO, 100, 28634340	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,20 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 0,60. DATA: 09.05.2023. POR: MARCO/RONEY/ALEXANDRO.	00:15:00	0,72	0,05
3435433	10/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	NOVA SUIÇA	THEOPILO ZARIFE, 152, 28605708	MEDIDAS 4,00 X 1,40	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 5,20 X 4,00. DATA: 10.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	02:40:00	20,80	0,13
3443520	10/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	SÃO GERALDO	QUELUZ, 110, 28630385	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 2,50 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 0,80 E 1,70 X 1,40. DATA: 10.05.2023. POR: JOSÉ HELENO/MARCELO/LUIZ.	00:50:00	4,49	0,09
3444259	11/05/2023	127 - 01GSO01-AE	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 4, 28634060	MEDIDAS: 0,60 X 0,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,70 X 0,70 - 0,40 X 0,40. EM 11/05/2023. POR JOSÉ ALDIR.	00:30:00	0,65	0,02
3444257	11/05/2023	127 - 01GSO01-AE	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 10, 28634060	MEDIDAS: 0,50 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 X 0,70 - 1,40 X 1,00. EM 11/05/2023. POR JOSÉ ALDIR.	00:20:00	1,96	0,10
3444263	11/05/2023	127 - 01GSO01-AE	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 103, 28634060	MEDIDAS: 2,80 X 0,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,50 X 0,40 - 1,10 X 0,90. EM 11/05/2023. POR JOSÉ ALDIR.	00:25:00	2,39	0,10

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3444265	11/05/2023	127 - 01GSO01-AE	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 13, 28634060	MEDIDAS: 1,00 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,50 X 2,00 - 2,00 X 0,80. EM 11/05/2023. POR JOSÉ ALDIR.	00:15:00	10,60	0,71
3444267	11/05/2023	127 - 01GSO01-AE	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 11, 28634060	MEDIDAS A CONFERIR.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 9,10 X 1,70 - 7,10 X 0,60 EM 11/05/2023. POR JOSÉ ALDIR.	00:30:00	19,73	0,66
3444268	11/05/2023	127 - 01GSO01-AE	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 9, 28634060	MEDIDAS: 1,50 X 1,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,80 X 1,50. EM 11/05/2023. POR JOSÉ ALDIR.	00:20:00	2,70	0,14
3444269	11/05/2023	127 - 01GSO01-AE	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 7, 28634060	MEDIDAS: 1,50 X 1,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,40 X 1,30 - 1,60 X 0,70. EM 11/05/2023. POR JOSÉ ALDIR.	00:30:00	2,94	0,10
3444270	11/05/2023	127 - 01GSO01-AE	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 463, 28634060	MEDIDAS: 1,50 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 0,80. EM 11/05/2023. POR JOSÉ ALDIR.	00:40:00	1,20	0,03
3444272	11/05/2023	127 - 01GSO01-AE	CONSELHEIRO PAULINO	MANOEL ELIAS PERROUD, 28634000	MEDIDAS: 1,50 X 1,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,40 X 1,30. EM 11/05/2023. POR JOSÉ ALDIR.	00:20:00	1,82	0,09
3443803	11/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	ALTO DE OLARIA	AMAPA, 1, 28620250	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 7,00 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 7,00 X 1,00. DATA: 11.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	02:15:00	7,00	0,05
3426926	11/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	SANTO ANDRÉ	PAUL LERHER, 28635300	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 3,00 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 1,00. DATA: 11.05.2023. POR: JOSÉ HELENO/MARCELO/LUIZ.	00:50:00	3,00	0,06
3444260	11/05/2023	127 - 01GSO01-AE	FLORESTA	JOAO PEREIRA MARINS, 94, 28634063	MEDIDAS A CONFERIR.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,40 X 1,00 EM 11/05/2023. POR JOSÉ ALDIR.	00:25:00	1,40	0,06
3439670	11/05/2023	127 - 01GSO01-AE	PRADO	ROBERTO DA SILVEIRA PRADO, 28635000	MEDIDAS A CONFERIR	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 11,60 X 2,20 - 1,20 X 0,90 EM 11/05/2023. POR JOSÉ ALDIR.	00:25:00	26,60	1,06
3443716	11/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	BELA VISTA	SAO PAULO, 160, 28623200	ÁGUA, MANUTENÇÃO, DOIS ASFALTOS PARA SEREM REFEITOS, MEDIDAS À CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 7,50 X 2,10. DATA: 11.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	01:50:00	15,75	0,14
3444881	12/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	PONTE DA SAUDADE	ANA BARBOSA MOREIRA, 28616000	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,60 X 0,90. DATA: 12.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	00:30:00	1,44	0,05
3430188	12/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	PONTE DA SAUDADE	ANA BARBOSA MOREIRA, 200, 28616000	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 14,00 X 0,10	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 15,00 X 0,10. DATA: 12.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	01:10:00	1,50	0,02
3426920	12/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	PONTE DA SAUDADE	ANA BARBOSA MOREIRA, 202, 28616000	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 0,50 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 14,00 X 0,10. DATA: 12.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	00:50:00	1,40	0,03
							22:47:00	152,41	4,18



















































MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/05/2023 a 20/05/2023									
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3449532	19/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	BELA VISTA	BAHIA, 28623260	ÁGUA, PERDAS, MEDIDAS À CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,80. DATA: 19.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	00:30:00	0,64	0,02
3448737	18/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	SÃO JORGE	JOAO SIQUEIRA, 3, 28633600	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,70 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00. DATA: 18.05.2023. POR: ADÃO/LUCAS/PABLO.	00:25:00	1,00	0,04
3448735	18/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	ROSA BRANCA	TEXAS, 78, 28633635	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2,70 X 1,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,70 X 1,90. DATA: 18.05.2023. POR: ADÃO/LUCAS/PABLO.	01:00:00	5,13	0,09
3447905	18/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	VILA GUARANI	MANOEL LUIS FOLLY, 39, 28614050	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 4,00 X 1,30	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,00 X 2,30. DATA: 18.05.2023. POR: ADÃO/LUCAS/PABLO.	01:25:00	9,20	0,11
3447785	17/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	SÃO CRISTÓVÃO	ALTAMIRO MARTINS OURIQUES, 151, 28633070	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,70 X 1,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,10 X 1,60. DATA: 17.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	00:55:00	3,36	0,06
3447760	19/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	BELA VISTA	ESPIRITO SANTO, 21, 28623360	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 1,30 X 1,30 E 1,50 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,90 X 0,80. DATA: 19.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	01:15:00	3,92	0,05
3446281	15/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	BELA VISTA	STA CATARINA, 28623350	ASFALTO A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 1,00 X 1,00 DATA: 15/05/2023 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	00:25:00	1,00	0,04
3446083	15/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	CALIFÓRNIA	ATALICIO SCHAUTZ, 30, 28633740	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 0,50 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,20. DATA: 15.05.2023. POR: MARCO/RONEY/ALEXANDRO.	00:07:00	0,16	0,02
3446061	15/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	OLARIA	VICENTE SOBRINHO, 101, 28623400	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 0,60 X 0,50 / 0,80 X 0,30 / 1,00 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 0,60 X 0,50 / 0,80 X 0,30 / 1,00 X 0,70 DATA: 15/05/2023 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	00:55:00	1,24	0,02
3445421	19/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	BELA VISTA	CONS JULIUS ARP BELA VISTA, 377, 28623000	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,10 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,10. DATA: 19.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	00:34:00	1,32	0,04
3444468	18/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	CALIFÓRNIA	RUA ANTONIO SUAID, 34, 28633750	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,80 X 1,20. DATA: 18.05.2023. POR: MARCO/RONEY/ALEXANDRO.	00:26:00	2,16	0,08
3443582	17/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	CONSELHEIRO PAULINO	AUGUSTO GOMES, 44, 28633410	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,00 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,20 X 2,00. DATA: 17.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	01:15:00	4,40	0,06
3438715	15/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	ALTO DE OLARIA	JOAO JANUARIO DA SILVA, 35, 28620300	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 2,00 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO, MEDIDAS: 2,40 X 1,10 DATA: 15/05/2023 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	00:45:00	2,64	0,06
3431714	15/05/2023	961 - SED-03GSO-RP03	NOVA SUIÇA	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, 3, 28605723	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,80 X 1,10	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,80 X 1,10. DATA: 15.05.2023. POR: MARCO/RONEY/ALEXANDRO.	00:15:00	1,98	0,13

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3426942	19/05/2023	962 - SED-03GSO-RP04	BELA VISTA	ESPIRITO SANTO, 27, 28623360	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: REPOR ASFALTO: 3M X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,60 X 1,60. DATA: 19.05.2023. POR: ADÃO/GILSON/PABLO.	01:05:00	5,76	0,09
3426933	15/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	SÃO GERALDO	JOSE GONCALVES JARDIM, 114, 28630447	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,40 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,00 X 1,50. DATA: 15.05.2023. POR: JOSÉ HELENO/MARCELO/GUILHERME.	01:07:00	6,00	0,09
3426919	15/05/2023	959 - SED-03GSO-RP01	SÃO GERALDO	JOSE GONCALVES JARDIM, 174, 28630447	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,80 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,20 X 0,90. DATA: 15.05.2023. POR: JOSÉ HELENO/MARCELO/GUILHERME.	00:35:00	1,98	0,06
							12:59:00	51,89	1,06

































Nova Friburgo, 24 de novembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 30/10/2022 a 05/11/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 30/10/2022 a 05/11/2022.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-666/2022-SUP
DSSM-td


MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/10/2022 a 05/11/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3319035	31/10/2022	15 - 03PV02	TIO DONGO	MARIA MENDONÇA PINHEIRO, 28633327	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 3,00 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,20 X 1,00 DATA: 31/10/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E JOÃO.	00:33:00	2,20	0,07
3320914	31/10/2022	16 - 03PV03	ALTO DE OLARIA	FRANCOIS BUTTY, 21, 28623730	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE SOLTOU, MEDIDAS: 0,60 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,60 X 0,60 DATA: 31/10/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:32:00	0,36	0,01
3319844	31/10/2022	15 - 03PV02	RIOGRANDINA	HERMINIA DOS SANTOS SILVA, 28634330	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,50 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,80 X 1,50 DATA: 31/10/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E JOÃO.	01:04:00	4,20	0,07
3322434	31/10/2022	17 - 03PV04	SANTA BERNADETE	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO, 438, 28630410	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,20 X 1,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,20 DATA: 31/10/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:35:00	1,44	0,04
3310509	01/11/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	LUIS FERNANDO, 28634090	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 0,90 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,90 X 0,60 DATA: 01/11/2022 POR JOSÉ HELENO, GILSON E SEBASTIÃO.	00:32:00	0,54	0,02
3314903	01/11/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	RUA LUIS FERNANDO, 20, 28634090	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,00 X 1,00 ... 1,30 X 0,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 / 1,30 X 0,20 DATA: 01/11/2022 POR JOSÉ HELENO, GILSON E SEBASTIÃO.	01:00:00	1,26	0,02
3322537	01/11/2022	13 - 03PV01	ALTO DE OLARIA	JOAO JANUARIO DA SILVA, 46, 28620300	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,80 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,70 DATA: 01/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	00:50:00	0,21	0,00
3310127	01/11/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	TEODORO FELIPE DAUT, 28634060	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,20 X 1,20 ... 1,00 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,70 X 1,30 / 1,00 X 0,80 DATA: 01/11/2022 POR JOSÉ HELENO, GILSON E SEBASTIÃO.	01:30:00	3,01	0,03
3322430	01/11/2022	13 - 03PV01	ALTO DE OLARIA	XINGU, 127, 28620310	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 2,50 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,50 X 1,50 DATA: 01/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	01:10:00	3,75	0,05
3323308	01/11/2022	16 - 03PV03	SÃO JORGE	VALDIR GRATIVAL, 28633595	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,50 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,50 X 2,00 DATA: 01/11/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:25:00	5,00	0,20
3323189	01/11/2022	17 - 03PV04	BRAUNES	VISC DE ITABORAI, 28611230	MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. DATA: 01/11/2022 POR JOSÉ HELENO, GILSON E SEBASTIÃO.	00:35:00		0,00
3311442	01/11/2022	16 - 03PV03	SÃO JORGE	VALDIR GRATIVAL, 2, 28633595	REPOR SOLO: 2,00 X 1,40 - REFAZER TAMBÉM OS ASFALTOS SOLTOS, AFUNDADOS E CRAQUELADOS, APROXIMADAMENTE: 50 SACOS.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 5,80 X 4,20 DATA: 01/11/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	04:49:00	24,36	0,08
3323753	02/11/2022	16 - 03PV03	CONSELHEIRO PAULINO	RUA MANOEL ELIAS PERROUD, 102, 28634000	MEDIDAS 4,00 X 0,20 E 1,50 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 150 / 4,00 X 0,30 / 1,50 X 1,00 DATA: 02/11/2022 POR MARCO, WESLEY E JOÃO.	01:35:00	5,70	0,06

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3323851	03/11/2022	15 - 03PV02	PERISSÊ	SAO JOSE PERISSÊ, 60, 28613360	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,70 DATA: 03/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:23:00	0,70	0,03
3321987	03/11/2022	16 - 03PV03	VILAGE	AFONSO SARDOU, 55, 28605200	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,30 X 1,10	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,30 X 1,10 DATA: 03/11/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:26:00	1,43	0,06
3319883	03/11/2022	13 - 03PV01	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 29, 28634060	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,50 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,60 X 0,80 DATA: 03/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	00:40:00	1,28	0,03
3323405	03/11/2022	16 - 03PV03	DUAS PEDRAS	RUA PERGENTINO JOSE SAIPPA, 6, 28630210	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,50 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,00 DATA: 03/11/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:44:00	1,50	0,03
3310475	03/11/2022	13 - 03PV01	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 32, 28634060	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 DATA: 03/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	00:45:00	1,00	0,02
3310089	03/11/2022	13 - 03PV01	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 30, 28634060	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,30 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,30 X 0,50 / 2,50 X 1,80 / 2,80 X 0,80 DATA: 03/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	01:30:00	7,89	0,09
3323857	03/11/2022	16 - 03PV03	SITIO SÃO LUIS	MARIO ANTONIO THURLER, 128, 28621137	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,10 X 1,00 / 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,10 X 1,00 / 1,00 X 1,00 DATA: 03/11/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:15:00	2,10	0,14
3323838	03/11/2022	15 - 03PV02	CANTO DO RIACHO	ARIDIO DA ROSA PINHEIRO, 53, 28633799	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 0,70 X 0,70	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,70 X 0,70 DATA: 03/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:22:00	0,49	0,02
3323803	04/11/2022	17 - 03PV04	SANTA LUZIA	ALBERTO PORTO DA SILVEIRA, 238, 28616368	TÉCNICO FERNANDO REALIZOU VISITA PERIÓDICA E ATESTOU QUE O ASFALTO AFUNDOU, NECESSÁRIO RECUPERAR O ASFALTO, MEDIDAS A CONFERIR.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,80 X 1,60 DATA: 04/11/2022 POR ADÃO, GILSON E MAXWELL.	00:30:00	2,88	0,10
3320986	04/11/2022	16 - 03PV03	OLARIA	PRES RAUL VEIGA, 28623460	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE AFUNDOU, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20 X 1,00 - NECESSÁRIO SINALIZAR O LOCAL	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 DATA: 04/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	01:00:00	1,20	0,02
3310533	04/11/2022	13 - 03PV01	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 54, 28634060	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 4,00 X 0,20 ... 0,80 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,00 X 0,20 / 0,80 X 1,00 DATA: 04/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	01:20:00	1,60	0,02
3323805	04/11/2022	17 - 03PV04	SANTA LUZIA	ALBERTO PORTO DA SILVEIRA, 448, 28616368	TÉCNICO FERNANDO REALIZOU VISITA PERIÓDICA E ATESTOU QUE O ASFALTO AFUNDOU, NECESSÁRIO RECUPERAR O ASFALTO, MEDIDAS A CONFERIR.	SERVIÇO EXECUTADO. DATA: 04/11/2022 POR ADÃO, GILSON E MAXWELL.	00:33:00		0,00
3310723	04/11/2022	13 - 03PV01	FLORESTA	SOLIMÕES, 72, 28634060	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 1,00 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 / 1,10 X 1,00 DATA: 04/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	00:45:00	2,10	0,05
3323940	04/11/2022	16 - 03PV03	OLARIA	PREF GUSTAVO LIRA, 64, 28623390	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO CRAQUELADO, MEDIDAS: 1,80 X 1,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,20 X 2,00 DATA: 04/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	00:40:00	4,40	0,11

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3323804	04/11/2022	17 - 03PV04	SANTA LUZIA	ALBERTO PORTO DA SILVEIRA, 596, 28616368	TÉCNICO FERNANDO REALIZOU VISITA PERIÓDICA E ATESTOU QUE O ASFALTO AFUNDOU, NECESSÁRIO RECUPERAR O ASFALTO, MEDIDAS A CONFERIR.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,80 X 1,00 DATA: 04/11/2022 POR ADÃO, GILSON E MAXWELL.	00:27:00	1,80	0,07
							25:30:00	82,40	1,44





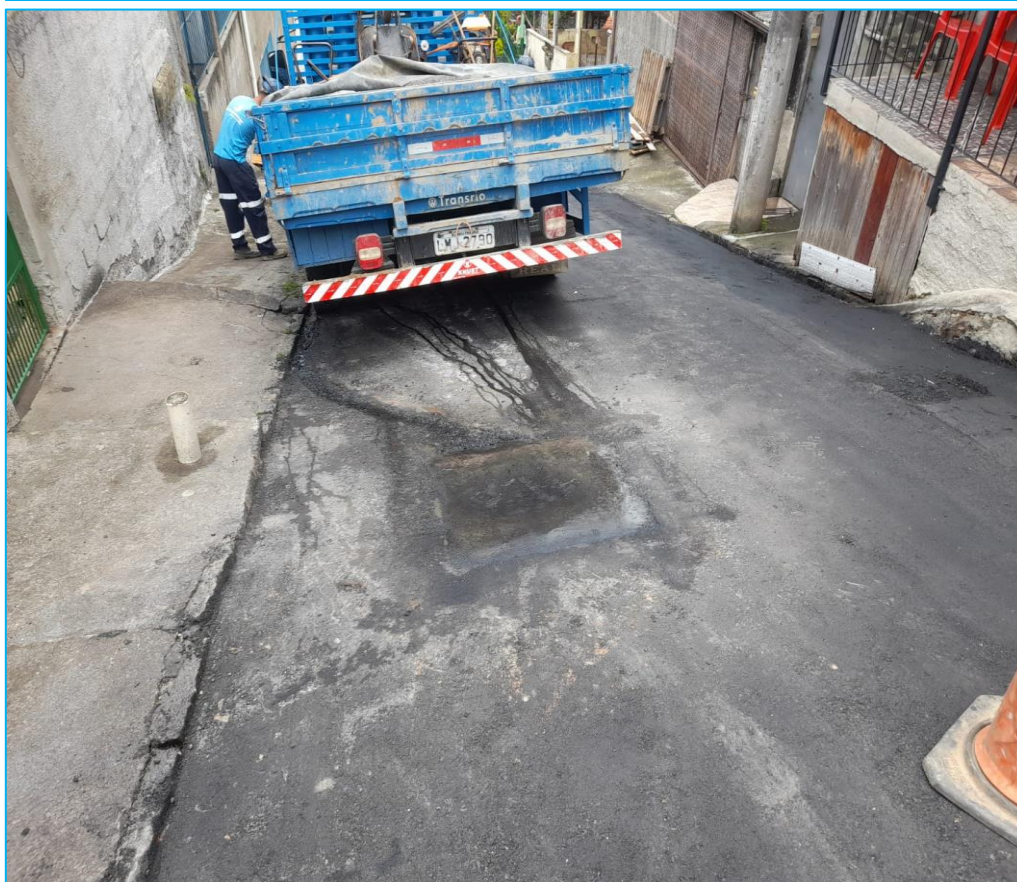





























Nova Friburgo, 23 de agosto de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório de Asfalto – 31/07/2022 a 03/08/2022 e 07/08/2022 a 13/08/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 31/07 a 03/08/2022 e 07/08 a 13/08/22.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-501/2022-SUP
DSSM-Inpc

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 07/08/2022 a 13/08/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3269191	07/08/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,20 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 EM 07/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	00:45:00	1,20	0,03
3267766	08/08/2022	29 - 02PV01	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 1,00 X 0,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 0,60 EM 08/08/2022 POR ALEXANDRO - ARECILDO - RONEY	00:45:00	0,60	0,01
3268354	08/08/2022	29 - 02PV01	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 3,00 X 0,60 E 4,00 X 0,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,00 X 0,40 E 3,00 X 0,60 EM 08/08/2022 POR ALEXANDRO - ARECILDO - RONEY	01:32:00	3,40	0,04
3267558	08/08/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,30 X 1,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,30 X 1,20 EM 08/08/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	01:10:00	1,56	0,02
3267425	08/08/2022	15 - 03PV02	FAVOR REPOR PAVIMENTO EQUIPE DORACI / FELIPE ... 0,80 X 0,60 ...	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,90 X 0,90 EM 08/08/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	01:24:00	0,81	0,01
3269617	08/08/2022	17 - 03PV04	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,30 X 1,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,70 X 1,50 E 1,20 X 1,10 EM 08/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:10:00	3,87	0,06
3267411	08/08/2022	29 - 02PV01	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,70 X 1,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,70 X 1,30 EM 08/08/2022 POR ALEXANDRO - ARECILDO - RONEY	01:18:00	2,21	0,03
3267724	08/08/2022	17 - 03PV04	ESGOTO, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO AFUNDADO, MEDIDAS: 4,00 X 0,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,00 X 0,40 EM 08/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:25:00	1,60	0,02
3267174	08/08/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,50 X 1,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 1,20 EM 08/08/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	01:06:00	1,80	0,03
3267421	08/08/2022	29 - 02PV01	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 1,80 X 0,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,80 X 0,60 EM 08/08/2022 POR ALEXANDRO - ARECILDO - RONEY	01:16:00	1,08	0,01
3269825	08/08/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,90 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 EM 08/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:55:00	1,00	0,02
3269820	09/08/2022	13 - 03PV01	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 6M X 0,2M	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 6,00 X 0,20 DATA: 09/08/2022 POR LEANDRO, MARCELO E MAIQUE.	00:54:00	1,20	0,02

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3270177	09/08/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,20 X 1,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,30 X 1,30 DATA: 09/08/2022 POR LEANDRO, MARCELO E MAIQUE.	01:05:00	2,99	0,05
3269836	10/08/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2,50 X 1,30 /3M X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 6,70 X 1,80 EM 10/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	01:05:00	12,06	0,19
3267233	10/08/2022	29 - 02PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2,50 X 1,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,00 X 1,60 EM 10/08/2022 POR RONEY - ALEXANDRO - ARECILDO	01:37:00	4,80	0,05
3269853	10/08/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 5,30 X 2,30/8M X 1,00/2M X 0,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,50 X 2,20 EM 10/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	00:25:00	7,70	0,31
3271085	10/08/2022	17 - 03PV04	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,20 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 EM 10/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:33:00	1,20	0,04
3267721	10/08/2022	29 - 02PV01	ESGOTO, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO AFUNDADO, MEDIDAS: 1,20 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 EM 10/08/2022 POR RONEY - ALEXANDRO - ARECILDO	01:41:00	1,20	0,01
3270522	10/08/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 9,00 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 9,00 X 0,50 EM 10/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	00:55:00	4,50	0,08
3270558	11/08/2022	13 - 03PV01	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 0,70 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,70 X 0,50 EM 11/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	02:05:00	0,35	0,00
3271352	11/08/2022	13 - 03PV01	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 1,00 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 0,80 EM 11/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	01:00:00	0,80	0,01
3271081	11/08/2022	17 - 03PV04	REALIZAR REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTO 11,80 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,60 X 1,70 E 2,00 X 1,50 E 6,00 X 1,00 EM 11/08/2022 POR JOSÉ HELENO - RUAN - GILSON	04:55:00	15,12	0,05
3270564	11/08/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,80 X 0,70 RETIRAR 2 BALDES DE ENTULHO	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 X 0,70 EM 11/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	00:20:00	0,56	0,03
3264619	11/08/2022	29 - 02PV01	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 7,20 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,70 X 1,00 E 5,00 X 2,10 E 2,90 X 0,80 EM 11/08/2022 POR ALEXANDRO - ARECILDO - RONEY	02:50:00	15,52	0,09
3270563	11/08/2022	13 - 03PV01	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS: 0,60 X 0,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 5,50 X 1,20 E 4,50 X 1,90 EM 11/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	01:30:00	15,15	0,17

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3270547	11/08/2022	13 - 03PV01	ÁGUA INVESTIMENTO, MEDIDAS: 1,00 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 0,50 EM 11/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	00:25:00	0,50	0,02
3263351	13/08/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 7,00 X 1,80 - RETORNAR COM A RETROESCAVADEIRA	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 7,00 X 3,90 E 3,40 X 1,50 EM 13/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	06:10:00	32,40	0,09
3273176	13/08/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 0,80 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 X 0,80 EM 13/08/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	00:20:00	0,64	0,03
				TOTAL:	40:36:00	135,82	1,51

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 31/07/2022 a 06/08/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3265321	31/07/2022	17 - 03PV04	REPOR ASFALTO :0,50 X 0,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 0,80 EM 31/07/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:50:00	1,20	0,01
3264574	01/08/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 1,20 X 0,90 X 0,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,40 X 0,85 EM 01/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	02:15:00	1,19	0,01
3261947	01/08/2022	13 - 03PV01	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS:1,70 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,80 X 0,60 EM 01/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	00:25:00	1,08	0,04
3264568	02/08/2022	29 - 02PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS1,70 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,70 X 1,00 EM 01/08/2022 POR ALEXANDRO - ARECIDLO - THIAGO	01:41:00	1,70	0,02
3265884	02/08/2022	29 - 02PV01	MEDIDAS 3,10 X 0,80 E 0,90 X 0,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,10 X 0,80 E 0,90 X 0,70 EM 01/08/2022 POR ALEXANDRO - ARECIDLO - THIAGO	02:11:00	3,11	0,02
3264418	02/08/2022	17 - 03PV04	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,00 X 1,00 ... 4,00 X 0,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO E RETIRADO 3 CARRINHOS DE ENTULHO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 E 4,00 X 0,30 EM 02/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	01:21:00	2,20	0,03
3266745	02/08/2022	29 - 02PV01	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 2,00 X 0,60	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00 X 0,60 EM 01/08/2022 POR ALEXANDRO - ARECIDLO - THIAGO	01:00:00	1,20	0,02
3266661	03/08/2022	17 - 03PV04	REALIZAR REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTO 0,80 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,00 X 1,20 EM 03/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:35:00	3,60	0,10
3266663	03/08/2022	17 - 03PV04	REALIZAR REPOSIÇÃO DE ASFALTO 2,00 X 0,40 ... 0,80 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,70 X 0,90 E 1,30 X 1,20 EM 03/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:40:00	3,99	0,10
3263505	03/08/2022	15 - 03PV02	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,20 X 0,80 E 4,00 X 1,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,20 X 0,80 E 4,00 X 1,50 EM 03/08/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - IÃO	02:50:00	7,76	0,05
3267301	03/08/2022	17 - 03PV04	PERDAS CANF: 1,00 X 1,00/1,00 X 0,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,40 X 1,10 EM 03/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:25:00	2,64	0,11
3267300	03/08/2022	17 - 03PV04	AGUA PERDAS: 1,00 X 1,00/ 1X 0,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,10 X 1,00 EM 03/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:20:00	2,10	0,11

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3267318	03/08/2022	13 - 03PV01	REPOR ASFALTO: MEDIDAS A CONFERIR	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,30 X 1,90 EM 03/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	01:15:00	8,17	0,11
3266748	04/08/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 4,80 X 3,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 5,00 X 4,00 EM 04/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	02:40:00	20,00	0,13
3267553	05/08/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,50 X 2,50 EM 05/08/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	02:38:00	8,75	0,06
3268308	05/08/2022	17 - 03PV04	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE AFUNDOU, SAINDO DO TERRA NOVA, INDO PARA FAZENDA DA LAJE, DENTRO DA CURVA.	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,20 X 1,40 EM 05/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:35:00	5,88	0,17
3267566	05/08/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 0,60 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,60 X 0,50 EM 05/08/2022 POR EDVANDRO - WESLEY - JOÃO	00:52:00	0,30	0,01
3268310	06/08/2022	13 - 03PV01	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,70 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,20 X 1,30 EM 05/08/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	00:10:00	2,86	0,29
3267748	06/08/2022	13 - 03PV01	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS:1,60 X 1,30	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,80 EM 06/08/2022 POR LEANDRO - MARCELO - MAIQUE	01:10:00	2,16	0,03
				TOTAL:	24:53:00	79,89	1,39

























































































Nova Friburgo, 11 de abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório Semanal de Serviços – 21/03/2022 a 25/03/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar, semanalmente, documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilha e relatório fotográfico referentes aos dias 21/03 a 25/03/2022.

Respeitosamente,



Engª Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-203/2022-SUP
DSSM-td

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2022 a 25/03/2022		
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Medidas
3185467	22/03/2022	17 - 03PV04	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,00 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS 1,00 X 0,80 + 1,10 X 0,90 E 0,50 X 0,50 EM 22/03/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	2,04
3185418	21/03/2022	17 - 03PV04	MEDIAS: 3,50 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,50 X 0,80 EM 21/03/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	2,80
3175628	22/03/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 5,10 X 1,10	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 5,10 X 1,10 EM 22/03/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	5,61
3186152	22/03/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,30 X 0,70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,30 X 0,70 EM 22/03/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	1,61
3170036	22/03/2022	18 - 02ES05	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,20 X 1,10 E 4,00 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,10 E 4,00 X 0,90 EM 22/03/2022 POR KLEBER - GILBERTO - VICTOR	4,92
3184247	23/03/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,50 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 1,00 EM 23/03/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	1,50
3186195	23/03/2022	18 - 02ES05	SÃO 06 MEDIDAS DE 4,00 X 1,00	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE CALÇADA MEDIDAS; 5,00 X 1,00 E 2,10 X 1,30 E 4, 1,60 E 3,80 X 1,70 E 6,00 X 1,10 E 2,50 X 1,10 E 7,40 X 1,50	37,10
3179412	24/03/2022	15 - 03PV02	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 13,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 13,00 X 1,00 EM 24/03/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	13,00
3177969	22/03/2022	18 - 02ES05	CORTAR E REPOR ASFALTO QUE SOLTOU, ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,50 X 2,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,50 X 2,50 EM 22/03/2022 POR KLEBER - GILBERTO - VICTOR	6,25
3183404	23/03/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS; 1,40 X 1,470	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,40 X 1,47 EM 23/03/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	2,06
3174434	21/03/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 0,80 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE PARALELO. MEDIDAS: 2,00 X 1,50 EM 21/03/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	3,00
3166880	21/03/2022	18 - 02ES05	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 5,00 X 1,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 5,00 X 4,00 EM 21/03/2022 POR MARCO ANTÔNIO - THIAGO	20,00
3185443	23/03/2022	17 - 03PV04	REPOR ASFALTO: 1,60 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,60 X 1,00 EM 23/03/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	1,60
3183307	21/03/2022	18 - 02ES05	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 2,20 X 2,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,00 X 2,00 EM 21/03/2022 POR MARCO ANTÔNIO - THIAGO	6,00
3187205	24/03/2022	17 - 03PV04	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 1,00 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 0,50 EM 24/03/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	0,50
3185505	24/03/2022	18 - 02ES05	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 2,60 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,60 X 0,90 EM 24/03/2022 POR KLEBER - GILBERTO - VICTOR	2,34

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Solicitação	Observação da Baixa	Medidas
3181257	22/03/2022	18 - 02ES05	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,20 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 EM 22/03/2022 POR KLEBER - GILBERTO - VICTOR	1,20
3184857	24/03/2022	18 - 02ES05	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,10 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,10 X 0,90 EM 24/03/2022 POR KLEBER - GILBERTO - VICTOR	0,99
3181649	22/03/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 0,90 EM 22/03/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	0,90
3186205	24/03/2022	11 - 01AG01	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS: 0,70 X 0,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,70 X 0,50 EM 24/03/2022 POR JAQUES - SÉRGIO	0,35
3171354	22/03/2022	18 - 02ES05	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS: 6 PONTOS DE ASFALTO: CADA 1,30 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 X 4,00 EM 22/03/2022 POR KLEBER - GILBERTO - VICTOR	3,20
3185369	22/03/2022	18 - 02ES05	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,20 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 0,90 EM 22/03/2022 POR KLEBER - GILBERTO - VICTOR	1,08
3186824	24/03/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,80 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,80 X 0,80 EM 24/03/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	1,44
3179196	23/03/2022	17 - 03PV04	REALIZAR REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTO 80 X 70	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 X 0,70 EM 23/03/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	0,56
3184831	22/03/2022	18 - 02ES05	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 0,80 X 0,20	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 X 0,20 EM 22/03/2022 POR KLEBER - GILBERTO - VICTOR	0,16
3186172	22/03/2022	18 - 02ES05	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,20 X 1,00 E 1,20 X 0,80 E 1,00 X 1,00	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,20 X 1,00 E 1,20 X 0,80 E 1,00 X 1,00 EM 22/03/2022 POR KLEBER - GILBERTO - VICTOR	3,16
3174458	21/03/2022	17 - 03PV04	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 5,00 X 1,50	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 5,00 X 1,50 EM 21/03/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	7,50
3187698	24/03/2022	18 - 02ES05	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,10 X 1,40	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,10 X 1,40 EM 24/03/2022 POR KLEBER - GILBERTO - VICTOR	2,94
3182464	22/03/2022	18 - 02ES05	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 3,00 X 0,40 E 1,00 X 0,90	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,00 X 0,40 E 1,00 X 0,90 EM 22/03/2022 POR KLEBER - GILBERTO - VICTOR	2,10
3186034	23/03/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 3,80 X 0,80	EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,80 X 0,80 EM 23/03/2022 POR ADÃO - RUAN - GILSON	3,04
3187873	25/03/2022	18 - 02ES05	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS: 2M X 0,40		0,80
3185248	25/03/2022	18 - 02ES05	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00		1,00
3188359	25/03/2022	18 - 02ES05	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,80 X 1,40/0,90 X 0,70		3,15
3185451	25/03/2022	18 - 02ES05	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00		1,00

<i>Nº O.S.</i>	<i>Data Exec.</i>	<i>Equipe Exec.</i>	<i>Solicitação</i>	<i>Observação da Baixa</i>	<i>Medidas</i>
3187877	25/03/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 0,70/ 0,60 X 0,60		1,06
3184392	25/03/2022	18 - 02ES05	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS: 3,00 X 0,30 E 2,90 X 0,70		2,93
3181223	25/03/2022	18 - 02ES05	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,20 X 1,20		1,44
3184217	25/03/2022	17 - 03PV04	INVESTIMENTO ESGOTO MEDIDAS: 1,50 X 1,50 E 5,00 X 1,20		8,25
3185486	25/03/2022	17 - 03PV04	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 1,00 X 1,00		1,00
				TOTAL:	159,58

















RUA LEOPOLDINA PINEL GARCIA

DATA: 22/03/2022





RUA CAP MAIA
DATA: 22/03/2022




















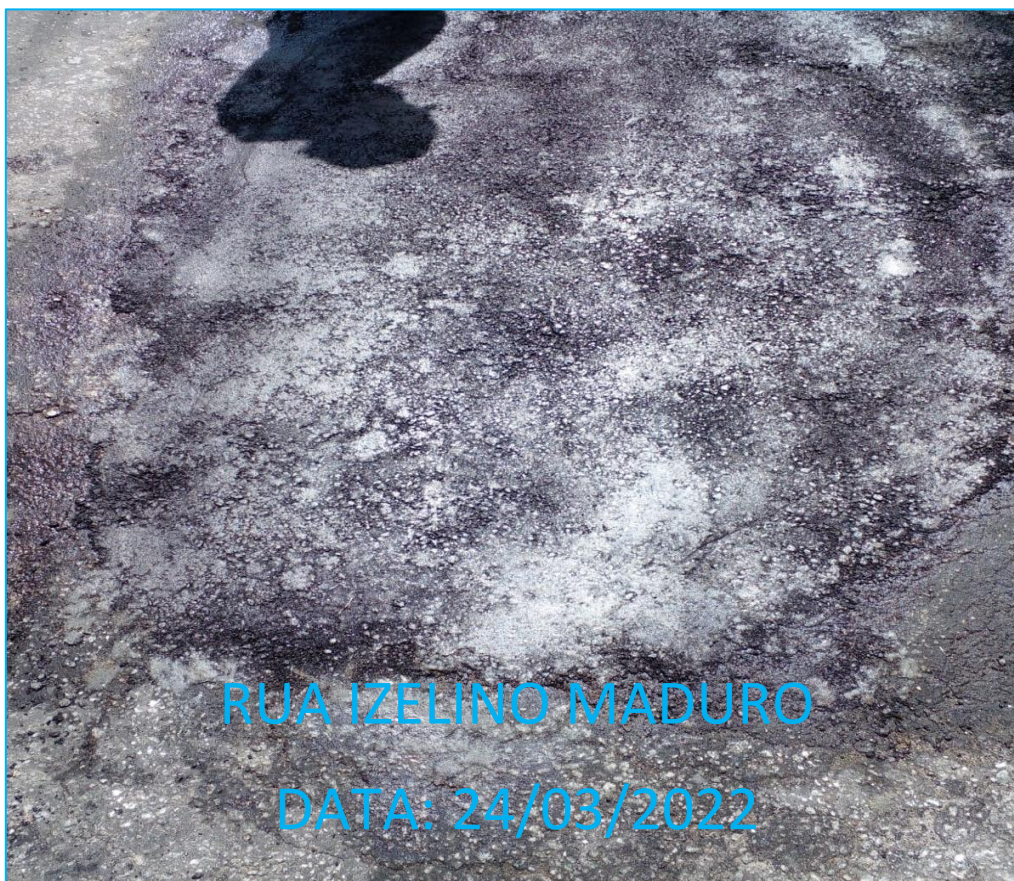









Nova Friburgo, 30 de janeiro de 2023.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Geral de Governo

Ilmo. Subsecretário de Serviços Concedidos Sr. Rodrigo de Lima Carvalho

Av. Alberto Braune, 225 - Centro

Nova Friburgo/RJ

Assunto: **Relatório de Serviços de Recuperação de Vias – 27/11/2022 a 17/12/2022**

Prezado Subsecretário,

Em atendimento à solicitação elaborada no ofício SGG/GAB nº 029/2022, para apresentar documento com todos os serviços realizados de recuperação das vias, encaminhamos planilhas e relatórios fotográficos referentes aos dias 27/11/2022 a 17/12/2022.

Respeitosamente,



Eng^a Danielle Silva de Souza Moreira
Diretora

C-054/2023-SUP
DSSM-td

MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 27/11/2022 a 03/12/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3341689	02/12/2022	17 - 03PV04	SANTA INES	JOAO RODRIGUES PINTO, 16, 28633310	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,50 X 1,00 E 1,50 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,50 X 1,00 / 1,50 X 1,00 DATA: 02/12/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	02:32:00	3,00	0,02
3341658	03/12/2022	15 - 03PV02	DUAS PEDRAS	BENJAMIN CONSTANT D PEDRAS, 28630085	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,70 X 1,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,70 X 1,60 DATA: 03/12/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:30:00	2,72	0,09
3340987	30/11/2022	26 - 02AG08	VALE DO SOL	NSA DO AMPARO VALE DO SOL, 700, 28635010	REFAZER ASFALTO EM VOLTA DO PV	SERVIÇO EXECUTADO. DATA: 30/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	01:03:00		0,00
3340982	01/12/2022	17 - 03PV04	CAMPO DO COELHO	HERONDINO JOSE DA ROSA, 55, 28630525	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,80 X 1,10 E 1,30 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,80 X 1,70 / 1,70 X 1,00 DATA: 01/12/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	01:40:00	4,76	0,05
3340941	30/11/2022	15 - 03PV02	BELA VISTA	JOSE ANDRADE BATISTA JR, 73, 28623330	ÁGUA, PERDAS, MEDIDAS À CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,80 X 0,60 DATA: 30/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:18:00	0,48	0,03
3340397	01/12/2022	16 - 03PV03	FAZENDA DA LAGE	ESTRADA LEOPOLDINA PINEL GARCIA, 27, 28633550	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 0,80 E 1,30 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,80 / 1,30 X 1,00 DATA: 01/12/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	01:15:00	2,10	0,03
3340145	29/11/2022	16 - 03PV03	CONSELHEIRO PAULINO	AUGUSTO GOMES, 44, 28633410	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 1,00 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,80 DATA: 29/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	00:25:00	0,80	0,03
3340086	29/11/2022	17 - 03PV04	FLORESTA	RUA EVANGELISTA M SILVA FLORESTA, 188, 28633620	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,70 X 1,80 / 1,50 X 1,40 DATA: 29/11/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	02:54:00	5,16	0,03
3339114	29/11/2022	13 - 03PV01	SOLARES	RENATO A S LOPES, 21, 28630342	REPOR PARALELOS: 2M X 1,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,00 X 1,60 DATA: 29/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	01:35:00	3,20	0,03
3337336	28/11/2022	18 - 02E505	BELA VISTA	ESPIRITO SANTO, 18, 28623360	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS A CONFERIR	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 19,00 X 2,00 DATA: 28/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	01:17:00	38,00	0,49
3336045	30/11/2022	17 - 03PV04	BAIRRO DO GIRASSOL	JANDYRA B PERLINGEIROGIRASSOL, 28630320	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 4M X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,00 X 2,80 DATA: 30/11/2022 POR ADÃO, THIAGO E PABLO.	01:44:00	11,20	0,11
3335386	30/11/2022	15 - 03PV02	BELA VISTA	RUA JOSE ANDRADE BATISTA JR, 35, 28623330	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 DATA: 30/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:30:00	1,00	0,03
3335383	30/11/2022	15 - 03PV02	BELA VISTA	RUA JOSE ANDRADE BATISTA JR, 65, 28623330	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,00 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 DATA: 30/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:25:00	1,00	0,04

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3335378	30/11/2022	15 - 03PV02	BELA VISTA	JOSE ANDRADE BATISTA JR, 31, 28623330	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 0,60 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,60 X 0,60 DATA: 30/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:40:00	0,36	0,01
3335374	30/11/2022	15 - 03PV02	BELA VISTA	JOSE ANDRADE BATISTA JR, 78, 28623330	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,40 X 0,60	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,40 X 0,60 DATA: 30/11/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:41:00	0,84	0,02
3335304	29/11/2022	16 - 03PV03	RIOGRANDINA	HERMINIA DOS SANTOS SILVA, 28634330	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 0,60 X 0,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 0,60 X 0,50 DATA: 29/11/2022 POR MARCO, RONEY E ALEXANDRO.	00:25:00	0,30	0,01
3335281	01/12/2022	16 - 03PV03	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 13, 28634060	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,2 X 1,2 X 0,4	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,20 X 0,40 DATA: 01/12/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:30:00	0,58	0,02
3333075	01/12/2022	16 - 03PV03	FAZENDA DA LAGE	ESTRADA LEOPOLDINA PINEL GARCIA, 15, 28633550	INVESTIMENTO AGUA MEDIDAS 4,00 X 0,40 E 1,00 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,00 X 0,40 / 1,00 X 0,80 DATA: 01/12/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:24:00	2,40	0,10
3332886	01/12/2022	16 - 03PV03	FAZENDA DA LAGE	LEOPOLDINA PINEL GARCIA, 15, 28633550	TÉCNICO FERNANDO REALIZOU VISITA PERIÓDICA E ATESTOU QUE O ASFALTO AFUNDOU, NECESSÁRIO RECUPERAR O ASFALTO, MEDIDAS: 1,40 X 1,20 / 3,70 X 0,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,40 X 1,20 / 3,70 X 0,20 E 3 CARRINHOS DE ENTULHO RECOLHIDOS. DATA: 01/12/2022 POR MARCO, ALEXANDRO E RONEY.	00:40:00	2,42	0,06
3331180	29/11/2022	13 - 03PV01	RUI SANGIARD	JOSE POLETTI, 60, 28635567	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2,60 X 0,80	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 2,60 X 0,80 DATA: 29/11/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	00:40:00	2,08	0,05
3331052	28/11/2022	18 - 02ES05	LAGOA SECA	FRANCISCO LUIZ FERNANDES, 674, 28634070	REPOR E REFAZER O ASFALTO DA ENTRADA DA VIELA, ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS APROXIMADAS: 4,5M X 4M. NECESSÁRIO RETO E POLI.	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,50 X 4,00 DATA: 28/11/2022 POR LEANDRO, PABLO E GILSON.	02:40:00	18,00	0,11
							22:48:00	100,40	1,37





























MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/12/2022 a 10/12/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3345476	09/12/2022	17 - 03PV04	BELA VISTA	AVENIDA CONS JULIUS ARP BELA VISTA, 145, 28623000	LUIZ FERNANDO RELATA QUE LUIZ FERNANDO DA SILVA AZEVEDO CEL. 999423145A EMPRESA AGUAS DE NOVA FRIBURGO EFETUOU UM SERVIÇO HÁ POUCOS DIAS E O SERVIÇO DE RECAPEAMENTO DO ASFALTO FOI MAL FEITO, OU COM MATERIAL DE PÉSSIMA QUALIDADE. UMA VEZ QUE	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. EM 09/12/2022. POR ADÃO/GILSON/PABLO.	00:13:00		0,00
3345437	09/12/2022	13 - 03PV01	OLARIA	PREF GUSTAVO LIRA, 174, 28623390	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 2,20 X 1,50	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,20 X 1,50. EM 09/12/2022. POR LEANDRO/MARCELO/LUIZ.	01:14:00	3,30	0,04
3345424	09/12/2022	15 - 03PV02	TIO DONGO	JANDYRA B PERLINGEIROTIODONGO, 3064, 28630320	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS A CONFERIR (EM VOLTA DO PV)	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,80 X 1,50. EM 09/12/2022. POR EDIVANDRO/WESLEY/SERGIO.	00:50:00	2,70	0,05
3344974	08/12/2022	15 - 03PV02	JARDINLÂNDIA	FRANCISCA PRIMO QUEIROZ, 53, 28633240	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 2,80 X 1,30	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS:4,20 X 2,20 EM 08/12/22 POR ADAO/WESLEY/SERGIO.	01:44:00	9,24	0,09
3344967	08/12/2022	15 - 03PV02	CHÁCARA DO PARAÍSO	IZELINO MADURO, 28605300	ESGOTO, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE AFUNDOU COM O VAZAMENTO, MEDIDAS APROXIMADAS: 10M X 1,2M	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS:7,80 X 2,30 EM 08/12/22 POR ADAO/GILSON/PABLO	02:01:00	17,94	0,15
3344187	07/12/2022	17 - 03PV04	CHÁCARA DO PARAÍSO	IZELINO MADURO, 41, 28605300	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 5M X 1,20	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 5,00 X 1,20 DATA: 07/12/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	01:50:00	6,00	0,05
3343214	06/12/2022	17 - 03PV04	MURY	HAMBURGO, 28615230	ÁGUA, INVESTIMENTO, MEDIDAS APROXIMADAS: 4,00 X 4,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 4,00 X 4,00 DATA: 06/12/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	02:22:00	16,00	0,11
3342514	07/12/2022	30 - 02AG10	JARDINLÂNDIA	RIO DOCE, 170, 28633300	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 3,50 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,50 X 1,00 DATA: 07/12/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E JOÃO.	01:22:00	3,50	0,04
3341013	04/12/2022	15 - 03PV02	CENTRO	SETE DE SETEMBRO CENTRO, 28605020	NECESSÁRIO PAVIMENTAR O ENTORNO DO T9 DA DESCARGA EM FRENTE AO BARBATANA, POIS FOI REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL ONDE LEVANTARAM O T9 E O ASFALTO NO ENTORNO SAIU.	SERVIÇO EXECUTADO. DATA: 04/12/2022 POR EDIVANDRO, WESLEY E RUAN.	00:20:00		0,00
3340999	04/12/2022	13 - 03PV01	CALIFÓRNIA	ANTONIO SUAI, 42, 28633750	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,00 X 0,90	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,00 X 0,90 DATA: 04/12/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	00:35:00	0,90	0,03
3340963	08/12/2022	17 - 03PV04	CHÁCARA DO PARAÍSO	RUA RUTH ABREU DE FREITAS, 103, 28605430	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 0,50 X 0,50	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS:1,00 X 0,50 EM 08/12/22 POR ADAO/GILSON/PABLO	00:15:00	0,50	0,03
3340188	06/12/2022	127 - 01GSO01-AE	CORDOEIRA	MANOEL CHRISTIANO BUSSINGER, 84, 28613730	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 3,00 X 2,00 RAMPA DE GARAGEM	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 2,00 DATA: 01/12/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	02:40:00	6,00	0,04
3340110	04/12/2022	17 - 03PV04	BELA VISTA	ACRE, 45, 28623340	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,20 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,20 X 1,20 DATA: 04/12/2022 POR ADÃO, JOILSON E THIAGO.	01:00:00	1,44	0,02

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3340108	04/12/2022	17 - 03PV04	BELA VISTA	STA CATARINA, 7, 28623350	MANUTENÇÃO ESGOTO, MEDIDAS: 7,00 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,20 X 2,00 / 2,10 X 1,30 DATA: 04/12/2022 POR ADÃO, JOILSON E THIAGO.	01:35:00	9,13	0,10
3339166	07/12/2022	17 - 03PV04	VILAGE	ZAIR PIRES PIRAZZO, 302, 28605205	MANUTENÇÃO ÁGUA MEDIDAS: 1,70 X 1,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 1,60 X 1,50 DATA: 07/12/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	01:14:00	2,40	0,03
3338133	04/12/2022	13 - 03PV01	CALIFÓRNIA	ATALICIO SCHAUTZ, 104, 28633740	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 4,00 X 1,50 - MEDIDAS ALTERADAS: 6,20 X 2,50	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 9,70 X 2,50 DATA: 04/12/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	02:00:00	24,25	0,20
3336010	04/12/2022	17 - 03PV04	BELA VISTA	BAHIA, 60, 28623260	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 5M X 0,20/ 1,50 X 1,00	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 5,00 X 0,40 / 1,50 X 1,50 DATA: 04/12/2022 POR ADÃO, JOILSON E THIAGO.	00:55:00	4,25	0,08
3333791	06/12/2022	13 - 03PV01	DUAS PEDRAS	SAO PEDRO, 288, 28630140	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 10M X 1M	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 10,00 X 1,20 DATA: 06/12/2022 POR LEANDRO, MARCELO E LUIZ.	00:20:00	12,00	0,60
3331154	05/12/2022	17 - 03PV04	GRANJA MIMOSA	ANTONIO RUIZ GALVEZ, 28635706	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 3,00 X 0,80 - REPOR 10 MEIO FIOS	SERVIÇO EXECUTADO. MEDIDAS: 3,00 X 0,80 DATA: 05/12/2022 POR ADÃO, GILSON E PABLO.	01:25:00	2,40	0,03
							23:55:00	121,95	1,70



























MANUTENÇÃO & SERVIÇOS					BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ASFALTO				
					PERÍODO DE MEDIÇÃO: 11/12/2022 a 17/12/2022				
Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3336678	12/12/2022	15 - 03PV02	ALTO DE OLARIA	PURUS, 10, 28620205	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,50 X 1,40	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,00X 1,40. EM 12/12/20022. POR EDIVANDRO/WESLEY/JOÃO.	00:32:00	2,80	0,09
3349289	12/12/2022	17 - 03PV04	MORRO DOS MAIAS	CAP MAIA, 28635530	MEDIDAS; 3,00 X 2,50	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 3,00 X 2,50. EM 12/12/2022. POR ADÃO/GILSON/PABLO.	01:25:00	7,50	0,09
3347413	12/12/2022	15 - 03PV02	CAMPO DO COELHO	FRANCISCO NEVES DE A FILHO, 28630627	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 0,80 X 0,60	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS:1,00 X 1,00. EM 12/12/20022. POR EDIVANDRO/WESLEY/JOÃO.	00:25:00	1,00	0,04
3336138	13/12/2022	13 - 03PV01	CALIFÓRNIA	JULIO ALVES DE AMORIM, 22, 28633780	MANUTENÇÃO ESGOTO, MEDIDAS: 1,50 X 1,30	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS:1,50 X 1,40 EM 13/12/22 POR LEANDRO/MARCELO/LUIZ	00:45:00	2,10	0,05
3342562	13/12/2022	30 - 02AG10	FLORESTA	AURELIANO BARBOZA FARIA, 409, 28634060	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 2,20 X 1,20	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 10,00 X 0,70. EM 13/12/2022. POR LEANDRO/RUAN/KLEBER.	00:16:00	7,00	0,44
3336121	13/12/2022	16 - 03PV03	BARROSO	GLAPHIRA STUTZ GRIPP, 2, 28605575	MANUTENÇÃO ESGOTO, MEDIDAS: 3,20 X 0,90	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,50 X 1,30. EM 13/12/2022. POR MARCO AURELIO/RONEY/ALEXANDRO.	00:55:00	5,85	0,11
3338191	13/12/2022	13 - 03PV01	CALIFÓRNIA	ALCINDO ALVES DOS REIS, 3, 28633730	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,20 X 1,00	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS:1,30 X 1,00 EM 13/12/22 POR LEANDRO/MARCELO/LUIZ	00:55:00	1,30	0,02
3348037	13/12/2022	17 - 03PV04	NOVA ESPERANÇA	RICARDO SANTOS, 18, 28630394	MEDIDAS A CONFERIR	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS:2,20 X 1,30 RETIRADO 03 CARRINHOS DE ENTULHO EM 13/12/22 POR ADAO/GILSON/PABLO	01:00:00	2,86	0,05
3347340	13/12/2022	30 - 02AG10	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 62, 28634060	REPOR PAVIMENTO ASFALTO 1,00 X 1,00 ... 3,20 X 0,40	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00 - 3,20 X 0,40. EM 13/12/2022. POR LEANDRO/RUAN/KLEBER.	00:52:00	2,28	0,04
3342321	13/12/2022	15 - 03PV02	ALTO DE OLARIA	FRANCOIS BUTTY, 25, 28623730	REPOR ASFALTO: 1,00 X 0,50	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 6,00 X 1,50 EM 13/12/2022. POR EDIVANDRO/WESLEY/TIAGO.	00:18:00	9,00	0,50
3347942	13/12/2022	16 - 03PV03	VALE DO SOL	NSA DO AMPARO VALE DO SOL, 28635010	REPOR ASFALTO: 1,00 X 1,00	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,00 X 1,00. EM 13/12/2022. POR MARCO AURELIO/RONEY/ALEXANDRO.	01:00:00	1,00	0,02
3347962	13/12/2022	15 - 03PV02	ALTO DE OLARIA	SOUZA MIRANDA, 28620340	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,50 X 1,30	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO COM CHUVA MEDIDAS: 2,50 X 2,00. EM 13/12/2022. POR EDIVANDRO/WESLEY/TIAGO.	00:56:00	5,00	0,09
3337342	14/12/2022	15 - 03PV02	NOVA SUÍÇA	VICENTE SORRENTINO, 19, 28605710	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS 1,50 X 1,00	EXECUTADO CORTE E REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS: 1,50 X 1,00 EM 14/12/22 POR EDIVANDRO/WESLEY/JOAO.	01:00:00	1,50	0,03

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3336116	14/12/2022	16 - 03PV03	PARQUE SÃO CLEMENTE	VISC DE TAUNAY, 262, 28625210	ÁGUA, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO QUE AFUNDOU, MEDIDAS: 2,60 X 0,90	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS; 3,00 X 1,00. EM 14/12/2022. POR MARCO AURÉLIO/ALEXANDRO/RONEY.	00:50:00	3,00	0,06
3339304	14/12/2022	15 - 03PV02	VARGINHA	MARIA BAPTISTA MOLIARI, 9, 28616280	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 3,20 X 0,50	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS:3,20 X 0,50 EM 14/12/22 POR EDIVANDRO/WESLEY/JOAO.	00:58:00	1,60	0,03
3347329	14/12/2022	13 - 03PV01	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 30, 28634060	REALIZAR REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTO 2,00 X 0,40	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,20 X 0,50. EM 14/12/2022. POR LEANDRO/MARCELO/LUIZ.	01:00:00	1,10	0,02
3346250	14/12/2022	15 - 03PV02	CHÁCARA DO PARAÍSO	IZELINO MADURO, 28605300	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,20 X 1,20	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS:1,00 X 1,00 EM 14/12/22 POR EDIVANDRO/WESLEY/JOAO.	00:42:00	1,00	0,02
3340102	14/12/2022	17 - 03PV04	SÃO GERALDO	JOAQUIM AUGUSTO DOS REIS, 7, 28630434	INVESTIMENTO ÁGUA MEDIDAS: 4,30 X 1,60	FOI EXECUTADO O CORTE DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,30 X 1,60. EM 14/12/2022. POR ADÃO/GILSON/PABLO.	01:50:00	6,88	0,06
3347286	14/12/2022	16 - 03PV03	BAIRRO SUIÇO	ADOLFO LAUTZ, 100, 28610330	MEDIDAS A CONFERIR.	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 2,50 X 1,00 - 3,20 X 1,00. EM 14/12/2022. POR MARCO AURÉLIO/ALEXANDRO/RONEY.	01:10:00	5,70	0,08
3344995	14/12/2022	15 - 03PV02	PERISSÉ	MAL FLORIANO PEIXOTO, 28613290	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 1,50 X 1,20	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS:1,50 X 1,20 EM 14/12/22 POR EDIVANDRO/WESLEY/JOAO	01:00:00	1,80	0,03
3348932	14/12/2022	29 - 02PV01	SÃO JORGE	VALDIR GRATIVAL, 63, 28633595	MEDIDAS A CONFERIR.	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS:2,50 X 4,50 EM 14/12/22 POR THIAGO/ARECILDO.	00:57:00	11,25	0,20
3342308	15/12/2022	16 - 03PV03	SÃO JORGE	MIGUEL CORREA DA SILVA, 127, 28633590	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS: 1,50 X 0,70/4,60 X 2M	EXECUTADO RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 1,50 X 0,70/4,60 X 2M POR MARCO AURELIO,RONEY E ALEXANDRO EM 15/12/22	01:00:00	10,25	0,17
3337334	15/12/2022	30 - 02AG10	JARDIM OURO PRETO	AVENIDA NSA DO AMPARO JD OURO PRETO, 34, 28635010	MANUTENÇÃO ESGOTO MEDIDAS 2,30 X 1,00	EXECUTADO RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS 2,30 X 1,00 POR LEANDRO, RUAN E KLEBER EM 15/12/22	01:29:00	2,30	0,03
3349083	15/12/2022	29 - 02PV01	SÃO JORGE	MIGUEL CORREA DA SILVA, 127, 28633590	ENTREGAR MATERIAL PARA EQUIPE DE PAVIMENTO.	EXECUTADO RECUPERAÇÃO DO ASFALTO MEDIDAS:3,00X2,00 POR ARECILDO E VALDINEY EM 15/12/22	01:01:00	6,00	0,10
3348672	15/12/2022	16 - 03PV03	SÃO JORGE	MIGUEL CORREA DA SILVA, 22, 28633590	MEDIDAS: 5,00 X 1,70 / 1,50 X 1,50 / 2,00 X 0,80	EXECUTADO RECUPERAÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS: 5,00 X 1,70 / 1,50 X 1,50 / 2,00 X 0,80 POR MARCO AURELIO,RONEY E ALEXANDRO EM 15/12/22	01:30:00	12,35	0,14
3340100	15/12/2022	205 - 02PV02	BRAUNES	VISC DE ITABORAI, 1299, 28611230	ESGOTO, MANUTENÇÃO, REFAZER ASFALTO AFUNDADO, MEDIDAS: 8M X 0,5M. NECESSÁRIO PARE E SIGA.	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO MEDIDAS:2,60X1,50 E 6,60X0,50 POR EDVANDRO, WESLEY E JOÃO EM 15/12/22	00:28:00	7,20	0,26
3340939	15/12/2022	15 - 03PV02	ROSA BRANCA	NILZO BRAVO, 28633617	ESGOTO, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 6,00 X 0,90.	REPOSIÇÃO DE ALFALTO EXECUTADA MEDIDAS: 6,00 X 0,90. POR EDVANDRO, WESLEY E JOÃO EM 15/12/22	01:26:00	5,40	0,06

Nº O.S.	Data Exec.	Equipe Exec.	Bairro	Endereço	Solicitação	Observação da Baixa	Tempo EX	Medidas	M³ por minuto
3348025	15/12/2022	127 - 01GSO01-AE	SÃO JORGE	VALDIR GRATIVAL, 63, 28633595	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 4,20 X 1,40	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 4,50 X 2,50. EM 14/12/2022. POR LEANDRO/RUAN.	01:14:00	11,25	0,15
3348680	16/12/2022	30 - 02AG10	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 59, 28634060	REALIZAR REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTO 0,80 X 0,80 ... 1,00 X 0,20	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 0,80 X 0,80 1,00 X 0,20. EM 16/12/2022. POR LEANDRO/RUAN/JOILSON.	00:29:00	0,84	0,03
3348101	16/12/2022	15 - 03PV02	CÓRREGO DANTAS	TEREZA BAUER, 37, 28630306	MANUTENÇÃO ÁGUA, MEDIDAS: 1,20 X 1,20	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL. MEDIDAS:1,20 X 1,20. EM 16/12/22 POR EDIVANDRO/WESLEY/JOAO.	00:20:00	1,44	0,07
3347921	16/12/2022	13 - 03PV01	BELA VISTA	ESPIRITO SANTO, 18, 28623360	MEDIDAS: 1,00 X 0,50, NECESSÁRIO RECUPERAR ASFALTO QUE SOLTOU COM AS CHUVAS.	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO, RECOLHIDO A SINALIZAÇÃO, FEITO A LIMPEZA DO LOCAL E RETIRADA DE 3 CARRINHOS DE ENTULHO. MEDIDAS: 1,00 X 0,50. EM 16/12/2022. POR LEANDRO/MARCELO/THIAGO.	00:10:00	0,50	0,05
3342300	16/12/2022	16 - 03PV03	CONSELHEIRO PAULINO	MANOEL ELIAS PERROUD, 11, 28634000	MANUTENÇÃO AGUA MEDIDAS: 1,00 X 0,50	EXECUTADA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO MEDIDAS:1,00X0,80 POR MARCO AURELIO, ROONEY,ALEXANDRO EM 16/12/22	00:10:00	0,80	0,08
3344779	16/12/2022	13 - 03PV01	CÔNEGO	MANOEL JOSE DA CUNHA, 800, 28621100	ÁGUA, MANUTENÇÃO, MEDIDAS: 1,50 X 1,10. RETIRAR 2 CARRINHOS.	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,60 X 1,10. EM 16/12/2022. POR LEANDRO/MARCELO/THIAGO.	00:40:00	1,76	0,04
3350153	16/12/2022	30 - 02AG10	PARADA FOLLY	CEL HEBER ALVES DA COSTA P FOLLY, 28605610	MEDIDAS A CONFERIR	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE CALHA. MEDIDAS: 5,00 X 1,00. EM 16/12/2022. POR LEANDRO/RUAN/JOILSON.	00:35:00	5,00	0,14
3348654	16/12/2022	13 - 03PV01	FLORESTA	RUA AURELIANO BARBOZA FARIA, 39, 28634060	REALIZAR REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTO 1,00 X 0,50	FOI EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE ASFALTO. MEDIDAS: 1,50 X 1,30. EM 16/12/2022. POR LEANDRO/MARCELO/THIAGO.	00:45:00	1,95	0,04
3350847	17/12/2022	17 - 03PV04	OSCAR SCHULTZ	BODOCO, 28616348	MEDIDAS A CONFERIR	EXECUTADO REPOSIÇÃO DE ASFALTO NO LOCAL MEDIDAS:3,10 X 1,50 EM 17/12/22 POR ADAO/GILSON/PABLO.	01:40:00	4,65	0,05
							31:43:00	153,21	3,47















































